

CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

 **Dynatest**[®]

MANESCO

 **INFRA**
& CAPITAL PROJECTS
BY ALVAREZ & MARSAL



RELATÓRIO CAEP

Grupo 1 - Coordenação Geral Executiva

Relatório Mensal N° 10

Referente ao período de execução de 01.04.26 até 30.04.26

07 de Maio de 2026

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	3
2 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA.....	4
2.1 Produto 1.1 – Relatório de Coordenação Geral	5
2.1.1 Descrição das atividades atribuídas	5
2.1.2 Produtos desenvolvidos no período	5
2.2 Produto 1.2 – Relatório de Relações Institucionais	24
2.2.1 Descrição das atividades atribuídas	24
2.2.2 Produtos desenvolvidos no período	24
2.3 Produto 1.3 – Relatório de Comunicação Integrada	27
2.3.1 Descrição das atividades atribuídas	27
2.4 Produto 1.4 – Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC)	28
2.4.1 Descrição das atividades atribuídas	28
2.4.2 Produtos desenvolvidos no período	34
ENCERRAMENTO.....	35
ANEXOS	36

1 APRESENTAÇÃO

A seleção da empresa Estruturadora pelo Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG - ocorreu por meio do Instrumento de Convocação nº 01/2025 para empresas ou consórcio estruturador, qualificados junto à SEINFRA, conforme o Chamamento Público para pré-qualificação nº 001/2024 da SEINFRA. Consagrado vencedor, o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos - CAEP – desenvolverá, ao longo do contrato, atividades especializadas em gestão de infraestrutura, divididas conformes os grupos:



**Coordenação Geral
Executiva**



**Gestão de Engenharia
e Socioambiental**



**Certificação de
Projetos e
Obras**



**Gestão de Processos
Administrativos e
Contábeis**



**Assessoramento e
Consultoria Jurídica**

O CAEP é formado pelas empresas Dynatest Engenharia LTDA, Bureau Veritas do Brasil Sociedade Classificadora e Certificadora LTDA., Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA e Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados.

O Consórcio Estruturador apresenta ao IFAG o **Relatório Mensal N° 10**, referente ao período de **01 de Abril/2026 até 30 de Abril/2026**, em conformidade ao Contrato N° 01/2025-IFAG.

O presente Relatório Mensal apresenta os elementos do objeto contratual descrito no Termo de Referência como “Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA”.

2 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

A Coordenação Geral Executiva atua como agente de interface entre todos os envolvidos, isto é, IFAG, SEINFRA, GOINFRA, empresas projetistas, empresas executoras e empresas supervisoras, garantindo que o objetivo seja executado de forma eficaz, transparente e coordenada. A função central desta coordenação é manter a coesão entre as diversas áreas envolvidas (gerenciamento de obras, projetos, governança, contábil, legal, dentre outras) e assegurar que todas as atividades sejam realizadas de acordo com os padrões técnicos, legais e de governança definidos pela SEINFRA, GOINFRA, FUNDEINFRA e IFAG.

Principais atividades:

- Gestão centralizada;
- Integração das atividades;
- Interlocução com partes interessadas (stakeholders);
- Comunicação integrada;
- Acompanhamento de cronogramas e alocação de recursos;
- Gestão integrada de riscos;
- Acompanhamento de processos e prestação de contas;
- Desenvolvimento e manutenção de sistemas e painéis do tipo sala de situação.

2.1 Produto 1.1 – Relatório de Coordenação Geral

2.1.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.1, referente ao Relatório de Coordenação Geral, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório detalhado que descreve a estrutura da Coordenação Central, responsável pela gestão centralizada de todas as (macro)atividades e seus produtos, no âmbito de suas atribuições e responsabilidades. Deverá contemplar no mínimo:

- Progresso e Prestação de Contas das Atividades: relatório que consolida o progresso de todas as atividades executadas, em execução e planejadas, indicando as fases atuais de atendimento (status), a fim de assegurar a prestação de contas à Associação, SEINFRA, órgãos de controle, e demais partes interessadas além de oferecer transparência aos demais stakeholders quanto às suas atividades. Esses relatórios incluirão indicadores de desempenho globais e parciais, cumprimento de prazos, resultados financeiros e alinhamento às normas técnicas e legais.*
- Plano de Gestão Integrada de Riscos: documento que consolida a gestão de riscos de todas as áreas do projeto, garantindo que a visão abrangente e atualizada dos riscos envolvidos (financeiros, operacionais, ambientais, jurídicos, ou outros inerentes ao objetivo do projeto). O plano estabelecerá as medidas de mitigação e contingência, indicando os responsáveis por cada ação, além de promover a coordenação entre os setores para garantir uma resposta integrada.”*

2.1.2 Produtos desenvolvidos no período

- Planilha de Controle de Produtos referente ao mês de abril.

Durante o mês de abril de 2026, o CAEP manteve elevado nível de produção técnica e institucional, com a emissão de amplo conjunto de documentos voltados ao acompanhamento das obras, à análise de projetos executivos, à gestão contratual e ao suporte à governança do Programa. O período foi marcado por intensa atuação das frentes técnicas, com destaque para atas de reuniões de alinhamento, notas técnicas de análise e aceitação de projetos, pareceres técnicos, notificações de não conformidade, relatórios semanais e mensais de acompanhamento de obras, além de documentos gerenciais, financeiros, jurídicos e de certificação.

O conjunto de entregas evidencia a atuação integrada das empresas consorciadas Dynatest, A&M Infra, Bureau Veritas e Manesco, que atuaram de forma complementar nas frentes de engenharia, gestão contratual, certificação, planejamento financeiro, riscos, compliance e assessoramento jurídico. Observou-se, novamente, predominância das atividades vinculadas às frentes de Gerenciamento Técnico e Análise de Projeto, responsáveis por um grande volume de produção.

No âmbito técnico-operacional, destacaram-se as entregas relacionadas à análise de projetos executivos, contemplando DAP, DUP, estudos topográficos, geológicos, geotécnicos, drenagem, sinalização, obras complementares, projeto geométrico e pavimentação. Também foram emitidos pareceres técnicos sobre conformidade ambiental, controle tecnológico, interferências, medição de bueiros, alteração de traçado, topografia e encaminhamentos à GOINFRA, reforçando o monitoramento contínuo da execução e a validação técnica dos empreendimentos.

No campo da gestão contratual e assessoramento jurídico, a Manesco manteve atuação relevante por meio da elaboração e revisão de minutas de advertência, respostas a ofícios, pareceres de apoio institucional, documentos de gestão contratual e relatórios jurídicos. Destacam-se os instrumentos relacionados a atrasos de cronograma, permanência de não conformidades, respostas a notificações e apoio à revisão de esclarecimentos destinados a órgãos externos, como MP-GO e GOINFRA.

As áreas de Gestão de Projetos, Controle Financeiro, Portfólio, Riscos e Compliance, sob responsabilidade da A&M Infra, contribuíram com relatórios mensais de portfólio, prestação de contas, acompanhamentos financeiros por empreendimento, controle de relatórios, registros de aprovação, matrizes de riscos e relatórios IRIS aplicados às obras e ao Programa. Essas entregas reforçaram os mecanismos de governança, transparência, controle financeiro e suporte à tomada de decisão estratégica.

No campo da certificação, o Bureau Veritas manteve as atividades de verificação independente, com a emissão de relatório de gestão da certificação e relatórios de obras referentes aos empreendimentos GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461, contribuindo para o fortalecimento dos mecanismos de controle externo, inspeção técnica e conformidade dos empreendimentos acompanhados.

Além das entregas concluídas, o mês de abril registrou produtos em elaboração, especialmente relatórios jurídicos mensais e relatório de gestão contratual, refletindo atividades em andamento que permanecerão sob acompanhamento e consolidação nos ciclos subsequentes.

Dessa forma, o controle de produtos referente ao mês de abril de 2026 apresenta um panorama abrangente, consistente e atualizado da atuação do CAEP no período, assegurando rastreabilidade documental, transparência na execução das atividades e aderência às responsabilidades previstas no escopo contratual. O conjunto de registros subsidia diretamente a elaboração do Relatório de Coordenação Geral Mensal, constituindo instrumento essencial para o monitoramento das frentes de trabalho, a avaliação de desempenho e a prestação de contas às instâncias de governança.

Apresenta-se, portanto, a seguir, a planilha consolidada das entregas de abril de 2026, contendo a identificação do produto, a empresa responsável, o tipo de documento, a descrição, o empreendimento correspondente, a data de entrega e o status atualizado, permanecendo como ferramenta fundamental para o acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas pelo consórcio.

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-073.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	27/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-075.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	27/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-076.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	27/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-074.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	31/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-077.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	01/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-078.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	01/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-037.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	02/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-038.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	02/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-039.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	02/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-040.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	02/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-126.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DAP	GO-180	05/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-127.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Eventograma	GO-178A	06/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-084.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	08/04/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 08	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a março de 2026	Geral	08/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-079.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	09/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-128.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	09/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-129.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Sinalização e Obras Complementares, Drenagem, Geotecnia e Geométrico	GO-178A	09/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-130.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-180	09/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-131.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Topográficos	GO-180	09/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-083.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	09/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-021.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	09/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-026.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	09/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-027.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	09/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-027.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	09/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-081.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	10/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-082.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	10/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-080.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	10/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-015.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Projeto	GO-180	10/04/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	10/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-132.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-461	13/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-133.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-178A	13/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-041.1	Parecer	Parecer Técnico Encaminhamento da DUP	GO-178A	13/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-043.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto Geométrico	GO-180	14/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-045.1	Parecer	Parecer Técnico - Interferência de Adutora Ofício 002/2026	GO-147	14/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-049.1	Parecer	Parecer Técnico - Medição de Bueiro Ofício 019/2026	GO-147	14/04/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Advertência - Subcláusula 12.2.1 - Atraso no Cronograma de Projetos	Gestão Contratual	Elaboração de minuta de notificação de advertência com fundamento na subcláusula 12.2.1, a fim de advertir a empresa sobre o atraso nas entregas do cronograma de projetos	GO-180	14/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-046.1	Parecer	Parecer Técnico - Alteração de Traçado Ofício 017/2026	GO-147	15/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-087.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	15/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-088.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	15/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-022.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	15/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-027.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	15/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-028.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	15/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-028.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	15/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-085.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	16/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-086.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	16/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-089.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	16/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-054.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (out a nov/25)	GO-180	16/04/2026	Entregue

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-055.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Dez/25)	GO-180	16/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-056.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Out/25)	GO-147	16/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-007.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-147	16/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-053.1	Parecer	Parecer Técnico - Topografia	GO-180	17/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-065.1	Parecer	Parecer Técnico - Topografia	GO-178A	17/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-066.1	Parecer	Parecer Técnico - Topografia	GO-147	17/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-067.1	Parecer	Parecer Técnico - Topografia	GO-461	17/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-057.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Nov/25)	GO-147	17/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-058.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Dez/25)	GO-147	17/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-059.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Out/25)	GO-461	17/04/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Revisão de Advertência - Subcláusula 12.2.1 - Permanência de Não Conformidades	Gestão Contratual	Revisão de minuta de notificação de advertência com fundamento na subcláusula 12.2.1, a fim de advertir a empresa sobre a permanência de não conformidades	GO-178A	17/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-068.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	21/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-069.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	21/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-070.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	21/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-008.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-461	21/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-134.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	22/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-135.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos, DAP e Estudos Topográficos	GO-147	22/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-136.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-180	22/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-137.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-461	22/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-063.1	Parecer	Parecer Técnico DUP	GO-147	22/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-071.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Pavimentação	GO-178A	22/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-016.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	22/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-017.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	22/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-064.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Dez/25)	GO-178A	22/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-090.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-091.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	23/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-092.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-098.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-009.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-014.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-016.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-026.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-060.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Nov/25)	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-061.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Dez/25)	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-062.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (out a nov/25)	GO-178A	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-023.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-028.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-029.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-029.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	23/04/2026	Entregue

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-093.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	24/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-094.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	24/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-095.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	24/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-096.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	24/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-097.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	24/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-129.2	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Sinalização e Obras Complementares, Drenagem, Geotecnia e Geométrico	GO-178A	27/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-072.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto Geométrico	GO-147	27/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-099.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	27/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-010.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	27/04/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	27/04/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Resposta aos Ofícios nº 23/2026 e 24/2026 - CCB	Gestão Contratual	Minuta de resposta aos Ofícios nº 23 e 24/2026 recebidos no âmbito do Contrato nº 08/2025 sobre autonomia da Contratada, elaboração do projeto executivo, regularização de pagamentos e resposta a não conformidades	GO-147	27/04/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Revisão de Parecer Técnico-Jurídico - Resposta ao Ofício nº 45/2026 - CCL	Gestão Contratual	Revisão de Parecer Técnico-Jurídico sobre subtração de material lenhoso das faixas de domínio para subsidiar resposta do IFAG ao Ofício nº 45/2026 recebido no âmbito do Contrato nº 07/2025	GO-178A	27/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-138.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	28/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-139.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Drenagem	GO-178A	28/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-071.2	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Pavimentação	GO-178A	28/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-011.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	GO-147	28/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-018.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	28/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-019.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-052.1	Parecer	Parecer Técnico - Documentação para medição	GO-147	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-073.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-074.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade SST	GO-180	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-024.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-029.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-030.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-030.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	29/04/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3	Geral	30/04/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	Geral	30/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-100.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	30/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-101.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	30/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-103.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	30/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-104.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	30/04/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°10 - 01.04.26 30.04.26	Geral	30/04/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	[CAEP-IFAG] Portfólio	Geral	30/04/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - Interno IFAG	Geral	30/04/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Controle de Reuniões A&M	Geral	30/04/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	E-mails de Aprovação	Geral	30/04/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Prestação de Contas Mensais - Obras	Geral	30/04/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-147	Geral	30/04/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-178A	Geral	30/04/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-180	Geral	30/04/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-461	Geral	30/04/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Controle de Relatórios	Geral	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO178A	Geral	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO147	Geral	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO180	Geral	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO461	Geral	30/04/2026	Entregue

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - Programa	Geral	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO178A	Geral	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO147	Geral	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO180	Geral	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO461	Geral	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - Programa	Geral	30/04/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo I - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - controle de recebimento e arquivamento de documentos e informações relevantes para a gestão contratual no período de recorte	Geral	30/04/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo II - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - perguntas aos responsáveis no período de recorte	Geral	30/04/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Relatório Grupo 1 - Relatório Mensal N°10	Relatório Mensal	Relatório Mensal da Entrega de Produtos de Abril	Geral	07/05/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Timeline de Acompanhamento Macro até abril 2026	Outros	Timeline de Coordenação de Pontos Macros	Geral	07/05/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Dashboard da Análise de Entrega de Produtos - abril	Outros	Dashboard Mensal de Análise de entregas CAEP	Geral	07/05/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Controle de Entrega de Produtos de abril	Outros	Planilha do Gerenciamento de entregas Mensal	Geral	07/05/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de abril	Outros	Planilha com o Quadro Financeiro Mensal	Geral	07/05/2026	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	P1.2 - Controle de Reuniões do mês de abril	Outros	Planilha do Controle de Reuniões	Geral	07/05/2026	Entregue
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	RL-P3.1-BI008-RGC-001	Relatório Técnico	RELATÓRIO DE GESTÃO DA CERTIFICAÇÃO	Geral	07/05/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.3 - 2026.04 - GO178A	Relatório Técnico	RELATÓRIO DE OBRAS - GO178A	GO-178A	07/05/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.3 - 2026.04 - GO180	Relatório Técnico	RELATÓRIO DE OBRAS - GO180	GO-180	07/05/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.3 - 2026.04 - GO147	Relatório Técnico	RELATÓRIO DE OBRAS - GO147	GO-147	07/05/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.3 - 2026.04 - GO461	Relatório Técnico	RELATÓRIO DE OBRAS - GO461	GO-461	07/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-007.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-461	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-008.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-147	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-008.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-180	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-008.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	08/05/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Apoio à revisão do Portal da Transparência	Parecer	Elaboração de parecer para apoio ao IFAG na revisão do Portal da Transparência	Geral	11/05/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Apoio à revisão dos esclarecimentos ao MPGO	Parecer	Elaboração de parecer para apoio ao IFAG na revisão da prestação de esclarecimentos solicitadas pelo MPGO ao longo da parceria	Geral	11/05/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 09	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a abril de 2026	Geral	N/A	Em elaboração
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	P5.3 - Relatório de Gestão Contratual	Relatório Técnico	Relatório de Gestão Contratual referente às obras em andamento no período de recorte	Geral	N/A	Em elaboração

- Dashboard Analítico das Entregas Executadas em abril.

O painel analítico de entregas apresenta uma visão consolidada do desempenho do CAEP no mês de abril de 2026, permitindo à Coordenação Geral Executiva acompanhar, de forma sintética e visual, os principais indicadores de produção e o comportamento das frentes de trabalho ao longo do período. A ferramenta reúne informações essenciais para a gestão contratual, como o volume total de produtos emitidos, o percentual de execução, a distribuição por status, a participação das empresas consorciadas e o comparativo entre as frentes técnicas, jurídicas, administrativas e de governança.

No período, foram registrados 159 produtos, dos quais 157 (99%) foram efetivamente entregues e apenas 2 (1%) permaneciam em elaboração, conforme demonstrado no dashboard consolidado. Os indicadores evidenciam elevado nível de execução das atividades e manutenção da regularidade operacional do consórcio, refletindo a consolidação das rotinas de acompanhamento técnico, gestão contratual e monitoramento das obras.

A distribuição por frentes de atuação indica novamente a predominância da área de Gestão de Engenharia, Meio Ambiente e Desapropriação, responsável por 112 documentos, seguida por Gestão de Projetos e Contabilidade, com 21 entregas, Assessoramento e Consultoria Jurídica, com 13, Coordenação Executiva, com 8, e Certificação de Projetos e Obras, com 5 documentos. Essa configuração reforça o caráter multidisciplinar da atuação do CAEP e demonstra a forte concentração das atividades nas frentes técnicas de engenharia, fiscalização e acompanhamento operacional dos empreendimentos.

No recorte por empresa, observa-se a liderança da Dynatest, com 118 produtos entregues, seguida pela A&M Infra, com 23, pela Manesco, com 13, e pelo Bureau Veritas, com 5 documentos. A distribuição evidencia a predominância das atividades técnicas e operacionais conduzidas pela equipe de engenharia, ao mesmo tempo em que confirma a integração entre as áreas de governança, assessoramento jurídico, gestão financeira e certificação independente.

A análise temporal demonstra que a produção esteve distribuída ao longo de todo o mês de abril, com picos expressivos de emissão especialmente nos dias 23 e 30, destacando-se este último como o dia de maior volume de entregas do período. Esses momentos de maior concentração refletem a consolidação de relatórios de acompanhamento de obras, notas técnicas, pareceres técnicos, documentos jurídicos, relatórios financeiros e instrumentos de gestão associados ao fechamento dos ciclos semanais e mensais de controle e prestação de contas.

O dashboard fortalece o papel da Coordenação Geral Executiva ao viabilizar uma visão integrada e transparente das entregas, apoiando a prestação de contas à SEINFRA, ao IFAG, à Associação e aos órgãos de controle. A centralização das informações permite monitorar prazos, avaliar o desempenho das frentes de trabalho, identificar tendências operacionais e antecipar pontos de atenção, contribuindo diretamente para a tomada de decisões estratégicas e para a mitigação de riscos.

Assim, apresenta-se o painel atualizado de análise das entregas do CAEP referente ao mês de abril de 2026, elaborado a partir da consolidação dos dados da planilha de controle e dos registros produzidos pelas empresas consorciadas. A visualização evidencia a manutenção de elevado desempenho produtivo no período, reafirmando a capacidade do consórcio de operar com eficiência, rastreabilidade e governança na execução de suas responsabilidades contratuais.

CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Dashboard: Análise de Entregas CAEP


157
Entregues

159
Total

Tipos de Produtos Entregáveis

- ☐ 1.1 COORDENAÇÃO GERAL
- ☐ 1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
- ☐ 1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL
- ☐ 1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES
- ☐ 2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- ☐ 2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO
- ☐ 2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO
- ☐ 3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO
- ☐ 3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
- ☐ 4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO
- ☐ 4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL
- ☐ 4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE
- ☐ 5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO
- ☐ 5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL


Produtos X Entrega

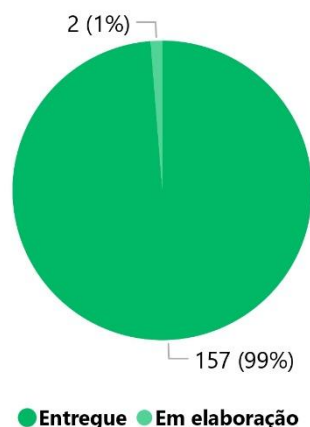


Quantidade de Documentos por Frente

	n°
Gestão de Engenharia, Meio Ambiente e Desapropriação	112
Gestão de Projetos e Contabilidade	21
Assessoramento e Consultoria Jurídica	13
Coordenação Executiva	8
Certificação de Projetos e Obras	5

Produtos por Empresa

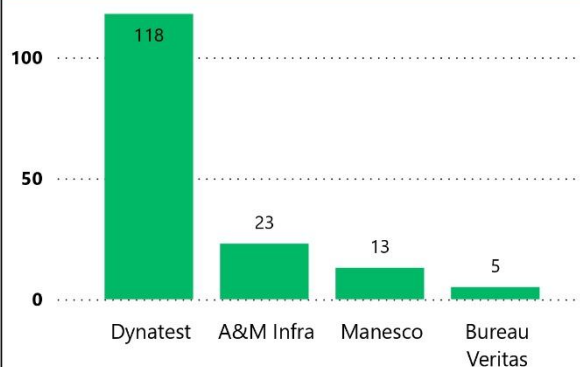

Controle de produtos mensal

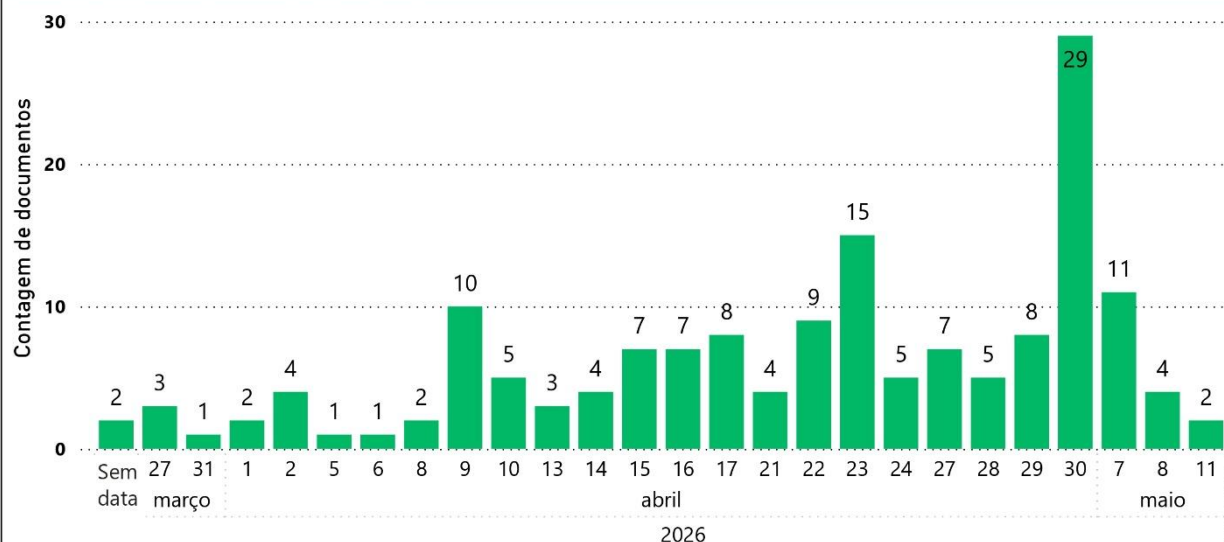

- Linha do Tempo do Progresso das Atividades Executadas em abril.


O mês de abril de 2026 caracterizou-se pela ocorrência de um marco institucional de natureza administrativa e financeira no âmbito do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA, relacionado à operacionalização das retenções cautelares determinadas pela GOINFRA no contexto da prestação de contas vinculada ao Termo de Colaboração nº 001/2025. Sob acompanhamento do Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos, CAEP, o período concentrou-se na consolidação documental, na rastreabilidade dos processos e na continuidade do monitoramento técnico das obras em execução.

O mês de abril não registrou novos eventos macro relacionados à publicação de empreendimentos, recebimento ou julgamento de propostas, emissão de licenças ambientais ou início de novas frentes executivas. Dessa forma, a linha do tempo permanece predominantemente estável sob a perspectiva da coordenação central do programa, refletindo um período voltado ao fortalecimento dos mecanismos de controle, governança e acompanhamento institucional.

Nesse contexto, o CAEP manteve sua atuação contínua na coordenação técnica e no acompanhamento das obras em andamento, assegurando integração entre as frentes administrativa, contratual, ambiental e operacional, bem como suporte às rotinas de monitoramento, prestação de contas e conformidade dos processos vinculados ao FUNDEINFRA.

Assim, a linha do tempo de abril evidencia um período de consolidação dos instrumentos de controle e fiscalização financeira do programa, reforçando a maturidade do modelo de governança implementado e a atuação integrada entre GOINFRA, IFAG e CAEP na condução e acompanhamento das obras estruturantes do Estado de Goiás.


Progresso das atividades executadas [Julho/2025]
Timeline

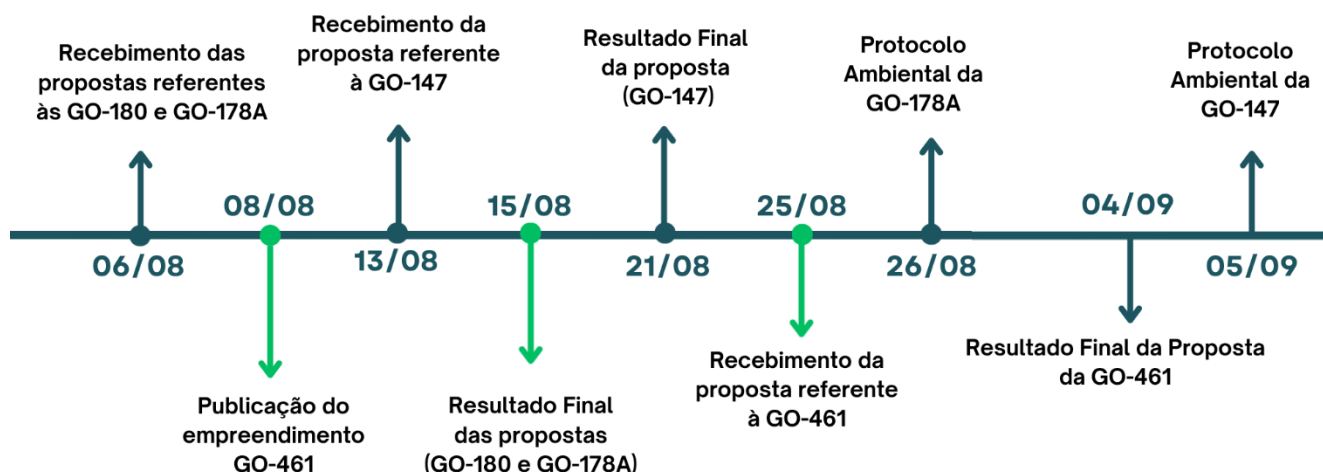Progresso das atividades executadas [Agosto/2025]
Timeline




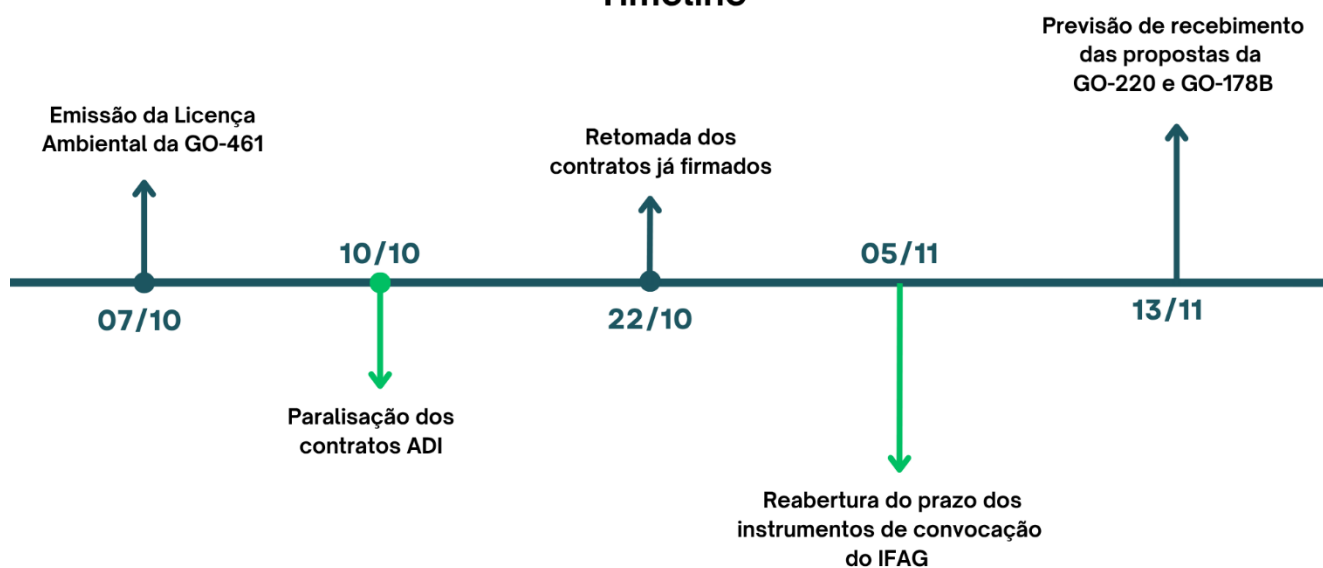
Progresso das atividades executadas [Setembro/2025]

Timeline

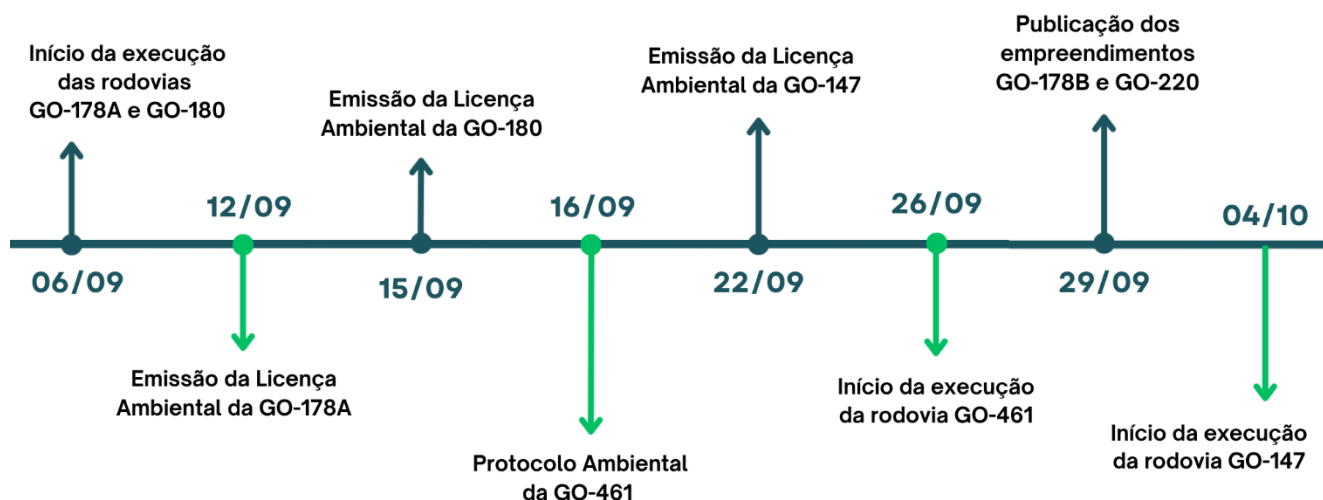

Progresso das atividades executadas [Outubro/2025]

Timeline






Progresso das atividades executadas [Novembro/2025]

Timeline



Progresso das atividades executadas [Dezembro/2025]

Timeline

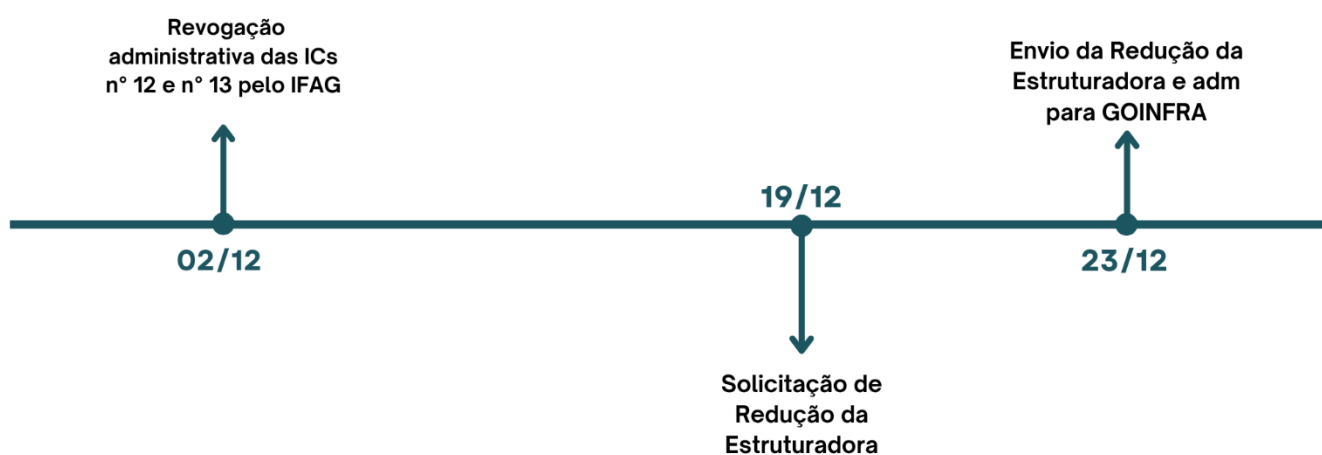




Progresso das atividades executadas [Janeiro/2026]

Timeline



Progresso das atividades executadas [Fevereiro/2026]


Timeline

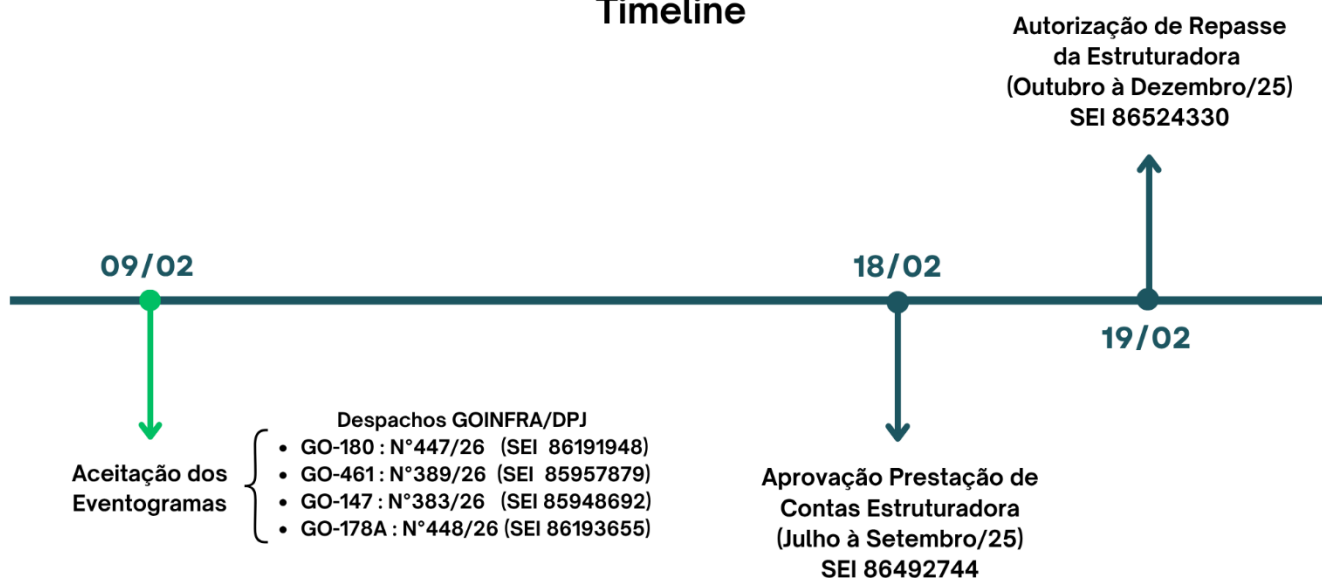




Progresso das atividades executadas [Março/2026]

Timeline

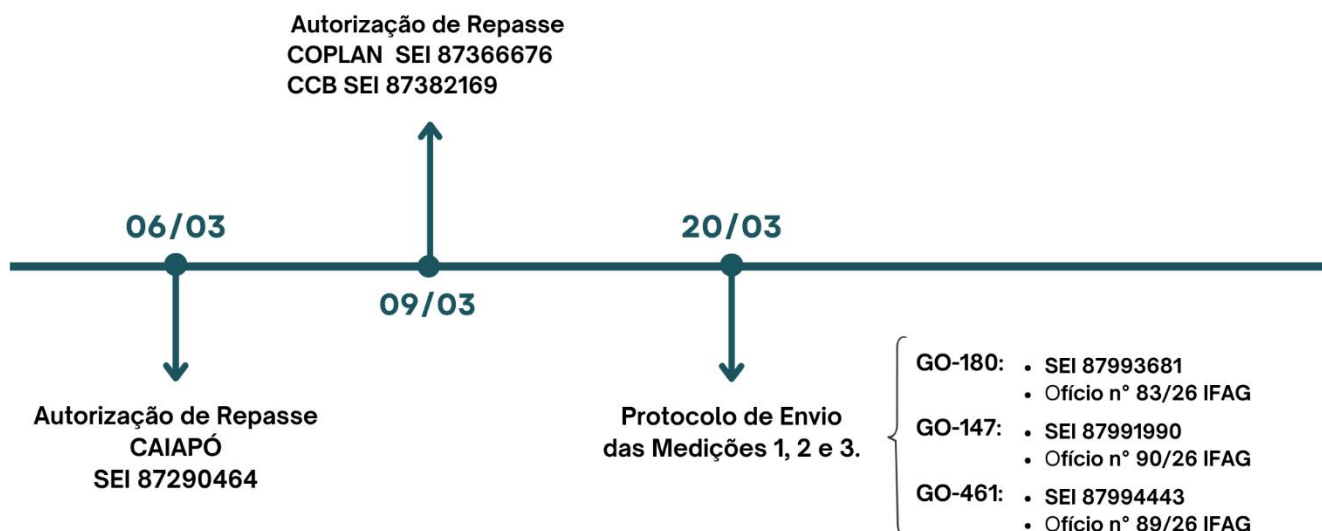

Progresso das atividades executadas [Abril/2026]

Timeline

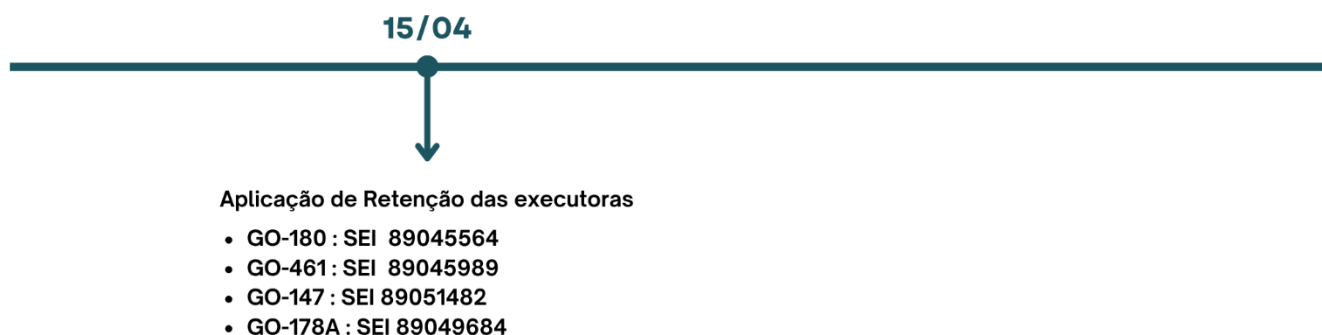

- Reuniões de Governança realizadas durante o mês de abril.

Durante o mês de abril, as reuniões de governança do Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP) mantiveram foco no acompanhamento da execução contratual, no controle técnico das obras e na gestão dos riscos operacionais e financeiros associados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA. A Coordenação Executiva seguiu atuando como instância integradora entre IFAG, GOINFRA, empresas estruturadoras, certificadoras e assessoramento jurídico, assegurando alinhamento institucional, rastreabilidade das deliberações e fortalecimento dos mecanismos de governança do programa.

As agendas iniciais do mês concentraram-se na análise de temas estratégicos relacionados à prestação de contas, empenho de recursos, impactos operacionais junto à GOINFRA e tratativas referentes ao aditivo contratual do CAEP. Também foram discutidos alinhamentos institucionais com IFAG, aspectos relacionados às entregas dos produtos contratados e medidas voltadas à manutenção da regularidade administrativa e financeira do programa.

No âmbito técnico-operacional, as reuniões com Dynatest e Bureau Veritas aprofundaram a análise de não conformidades identificadas em projetos geotécnicos e na documentação técnica associada às obras, especialmente nos empreendimentos vinculados à CCL, CCB e Coplan. Foram avaliados impactos decorrentes de inconsistências em sondagens geotécnicas, riscos de certificação e possíveis repercussões contratuais relacionadas à necessidade de revisão de estudos, alterações de projeto e reequilíbrio econômico-financeiro das obras.

As reuniões também abordaram atrasos na entrega de disciplinas técnicas, pendências documentais e limitações operacionais que impactam diretamente os processos de certificação e aprovação das medições. Nesse contexto, foram discutidas medidas de mitigação, incluindo intensificação das notificações formais às executoras, revisão de fluxos de fiscalização e necessidade de reforço nos controles de rastreabilidade técnica e documental das obras.

As agendas com a Alvarez & Marsal concentraram-se na atualização dos painéis BI, no acompanhamento dos riscos e na consolidação dos processos de prestação de contas e medições. Foram discutidos ajustes metodológicos para utilização de prestações de contas em formato proforma até aprovação definitiva das medições, bem como integração de informações financeiras e operacionais às ferramentas de acompanhamento e gestão de riscos, incluindo a plataforma IRIS.

Em paralelo, reuniões com a Manesco trataram do alinhamento institucional relacionado às tratativas com a GOINFRA e com o Ministério Público, especialmente em temas ligados à transparência, prestação de contas e segurança jurídica do programa IFAG-Manesco. Também foram debatidos aspectos relacionados às mesas técnicas junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), incluindo certificação, amostragem, supervisão e revisão de cláusulas e exigências previstas no TAG.

O mês foi encerrado com discussões voltadas à reprogramação de eventos, revisão de fluxos operacionais e definição de estratégias de negociação junto às executoras e contratadas, além da análise de questões relacionadas a certificação, respostas a ofícios, faturamento e repasses financeiros. Em síntese, abril foi marcado pelo aprofundamento dos controles técnicos e contratuais, pela intensificação das tratativas institucionais e pelo fortalecimento das ações de governança voltadas à mitigação de riscos e à continuidade operacional do programa FUNDEINFRA.

CAEP | Controle de Reuniões




Data	Participantes	Assuntos
02/04/2026	Representantes CAEP - Dynatest, Bureau Veritas, Alvarez & Marsal e Manesco	Reunião de Governança CAEP - pauta: Agenda com o governador e representação jurídica; Impacto operacional e relações com a GOINFRA; Prestação de contas e empenho de recursos; Discussão sobre o aditivo CAEP; Entregas, produtos e reuniões com IFAG.
10/04/2026	Dynatest: Victor Castro, Josiley Prado, CAEP: Alex Pineli IFAG: Sérgio Borges e Eliseu Garcia	Reunião de Governança IFAG e Dynatest - resumo ata: A reunião teve como objetivo revisar o status das equipes de campo, a paralisação parcial das obras da CCL e os impactos técnicos e contratuais decorrentes de não conformidades no projeto geotécnico e na documentação associada. Inicialmente foi detalhada a paralisação de serviços na CCL motivada por uma nota técnica que apontou inconsistências, com execução limitada apenas à trafegabilidade e manutenção de acessos enquanto as pendências não forem resolvidas. O grupo identificou um problema crítico de rastreabilidade das fotos das sondagens geotécnicas, constatando discrepância entre o número de furos e as fotos apresentadas, e decidiu que as sondagens deverão ser refeitas para evitar aprovações parciais que impactem demais disciplinas dependentes. Foi estimado que a repetição dos ensaios demandará cerca de 20 dias. Foram discutidos riscos contratuais relacionados ao critério dos 10% no TAG e possíveis variações de custo por alterações de drenagem e pavimentação, além da necessidade de estudos de capacidade da pedra Rio Claro e de elaboração de advertências e planos de ação para resguardar o IFAG diante de pedidos de reequilíbrio contratuais pela CCL. Também se deliberou sobre notificações formais a executoras em atraso e sobre a necessidade de advertência direta à Caiapó e outras empresas que descumprem cláusulas contratuais. Finalmente, a equipe avaliou riscos de atraso na entrega do geotécnico da Caiapó, necessidade de repactuação de prazos com Engesur/Coplan e a possível alteração de traçado da CCB com impacto em licenciamento e pleitos de reequilíbrio por variação de custos como diesel.
10/04/2026	Bureau Veritas: Vinicius Coutinho, Ciro Sampaio e Luis Quatorze CAEP: Alex Pineli IFAG: Sérgio Borges	Reunião de Governança IFAG e Dynatest - resumo ata: A apresentação incluiu o andamento das tratativas com a Goinfra sobre prestações de contas, a preocupação com exigências do diário de obra e a expectativa de envio de documento para resposta rápida, com intenção de avaliar o checklist quando for recebido para decidir retroações necessárias. A reunião aprofundou atrasos e pendências do projeto geotécnico que bloqueiam várias disciplinas de certificação, especialmente nos empreendimentos Coplan, CCB e CCL, e houve concordância em evitar aprovações finais enquanto houver risco de alterações geotécnicas significativas. Foi destacado que engenheiros de campo têm atuado como projetistas em algumas obras, reduzindo velocidade e qualidade das respostas técnicas, e recomendou-se notificação forma.
10/04/2026	A&M: Walter Schneider e Igor Ferreira CAEP: Alex Pineli IFAG: Joberth Bernazzoli e Eliseu Garcia	Reunião de Governança IFAG e A&M - resumo ata: A reunião teve como objetivo revisar os avanços dos produtos previstos em contrato, atualizar o painel de BI e tratar do acompanhamento de riscos e das medições para prestação de Contas. O time apresentou o painel de BI: a regra atual é reportar apenas itens concluídos sem ponderação, foi publicada a visualização referente a março e ficou previsto incluir as duas primeiras semanas de abril na semana seguinte; também foi informado que não houve atualização nos acompanhamentos financeiros durante a semana. O grupo discutiu o produto 4.2 e acordou utilizar prestações de contas trimestrais e mensais em formato proforma até a aprovação formal das medições, ressaltando a necessidade de retroagir essas informações aos relatórios quando as medições forem aprovadas e alinhar esse procedimento com Sérgio. Foram relatadas reuniões mensais com empreiteiras para gestão de riscos, pendências de importação de riscos das obras 461 e 180 para a ferramenta IRIS e a inclusão planejada da frequência de atualização nas páginas do BI.
10/04/2026	IFAG: Sérgio Fonseca e Bruna Mendes Manesco: Marcos Perez, Gabriel Schroeder, Antônio Gonçalves CAEP: Alex Pineli	Reunião de Governança IFAG e Manesco: O encontro teve como objetivo alinhar ações decorrentes das tratativas com a Secretaria de Infraestrutura (Goinfra) e com o Ministério Público sobre a transparência e prestação de contas do programa IFAG-Manesco
23/04/2026	Representantes CAEP - Dynatest, Bureau Veritas, Alvarez & Marsal e Manesco	Reunião de Governança CAEP - pauta: Contexto das mesas técnicas com o TCE; Esclarecimentos sobre ensaios e certificação; Operacionalização do acompanhamento e amostragem; Supervisão; Reprogramação de eventos e exigência trimestral da Goinfra; Revisão do TAG e encaminhamentos para mesas técnicas;
30/04/2026	Representantes CAEP - Dynatest, Bureau Veritas, Alvarez & Marsal e Manesco	Reunião de Governança CAEP - pauta: Fluxos, metodologia e prazo da Parceria; Problemas operacionais - bueiros e certificação; Estratégia de negociação com o contratado e proposta operacional; Respostas a ofícios da CCB; Situação do pagamento, repasse e faturamento.

- Análise do processo de medição do mês anterior - abril/2026 - 9ª medição

A medição foi estruturada sob a lógica formal de avaliação por produto, com base em critérios previamente definidos pela fiscalização, os quais consideram, de forma ponderada, a qualidade do atendimento e da equipe técnica, a qualidade da documentação e dos relatórios, bem como a conformidade com os prazos, convertendo o resultado avaliativo em parâmetro de pagamento dos serviços efetivamente comprovados. Tal sistemática reforça a robustez do processo de medição, assegura transparência, uniformidade de critérios e maior segurança institucional quanto à regularidade da despesa.

QUADRO FINANCEIRO CONSOLIDADO — 8ª MEDIÇÃO		
Contrato n.º 01/2025 Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos – CAEP		
Data de Assinatura do Contrato: 10/07/2025	Vigência: 36 meses	Referência: 8ª Medição – Fevereiro/2026

Valor Inicial do Contrato	Valor Atual do Contrato	Valor Acumulado Medido	Valor da 8ª Medição	% Acumulado Executado	Saldo Contratual
R\$ 36.179.265,65	R\$ 21.912.482,34	R\$ 6.851.013,84	R\$ 538.089,55	31,27%	R\$ 15.061.468,50

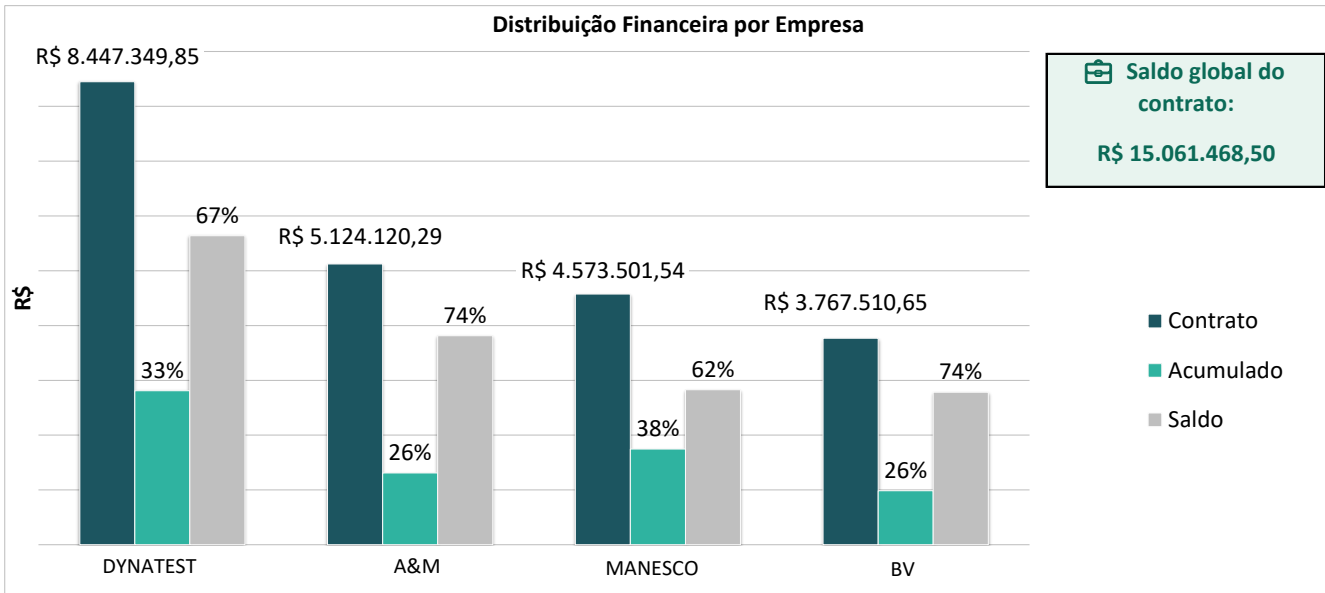

⚠ OBSERVAÇÃO SOBRE ADITIVO CONTRATUAL
Os valores apresentados a partir da 7ª medição consideram a readequação dos preços e quantitativos proposto na minuta do termo aditivo contratual.

RESUMO FINANCEIRO POR EMPRESA — 8ª MEDIÇÃO						
Empresa	Valor Mês	Valor Acumulado	Valor Contrato	% Executado	Saldo	Status
DYNA	R\$ 221.476,39	R\$ 2.810.260,74	R\$ 8.447.349,85	33,27%	R\$ 5.637.089,11	Pago
A&M	R\$ 112.199,28	R\$ 1.310.648,48	R\$ 5.124.120,29	25,58%	R\$ 3.813.471,81	Pago
MANESCO	R\$ 83.147,47	R\$ 1.745.355,15	R\$ 4.573.501,54	38,16%	R\$ 2.828.146,39	Pago
BV	R\$ 121.266,41	R\$ 984.749,47	R\$ 3.767.510,65	26,14%	R\$ 2.782.761,18	Pago
TOTAL	R\$ 538.089,55	R\$ 6.851.013,84	R\$ 21.912.482,34	31,27%	R\$ 15.061.468,50	

Sob a perspectiva físico-financeira, a 9ª medição totaliza **R\$ 604.720,77**, elevando o montante acumulado medido para **R\$ 7.455.734,61**, frente ao valor global contratual de **R\$ 21.912.482,34**, o que corresponde a **34,03%** de execução acumulada do contrato. O quadro financeiro demonstra, ainda, que a medição em referência permanece vinculada à readequação econômica decorrente da proposta de supressão relacionada ao termo aditivo em discussão, conforme registrado na própria planilha de medição, a qual consigna que os valores previstos para a competência foram estimados com base na proposta comercial de supressão, permanecendo necessária a aprovação e validação pela GOINFRA para formalização do aditivo e subsequente desembolso financeiro.

RESUMO FINANCEIRO POR EMPRESA — 9ª MEDIÇÃO				
Contrato n.º 01/2025 CAEP Referência: Abril/2026				
Empresa	Valor Mês	Valor Acumulado	% Executado	Saldo Contratual
DYNA	R\$ 221.476,39	R\$ 3.031.737,12	35,89%	R\$ 5.415.612,73
A&M	R\$ 112.199,28	R\$ 1.422.847,77	27,77%	R\$ 3.701.272,53
MANESCO	R\$ 149.778,69	R\$ 1.895.133,84	41,44%	R\$ 2.678.367,70
BV	R\$ 121.266,41	R\$ 1.106.015,88	29,36%	R\$ 2.661.494,77
TOTAL	R\$ 604.720,77	R\$ 7.455.734,61	34,03%	R\$ 14.456.747,73

No que se refere ao desempenho técnico das entregas reconhecidas na competência, verifica-se que os produtos efetivamente medidos foram recebidos com **avaliação integral para fins de pagamento**, não havendo, no conjunto dos itens faturados na 9ª medição, ocorrência de redutor financeiro aplicado por insuficiência técnica da entrega. Os produtos medidos no período foram expressamente registrados com **nota avaliativa de 100,00%**, a exemplo dos Produtos 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.3 e 5.4, evidenciando aderência ao escopo contratual, suficiência documental e regularidade para reconhecimento financeiro na competência. Do ponto de vista financeiro e de governança da medição, o conjunto dos itens reconhecidos demonstra conformidade satisfatória, sem indicativo de glosa técnica ou de necessidade de adoção de redutor sobre os valores medidos no período.

BASE TÉCNICA — PLANILHA DE MEDIÇÃO IFAG (9ª MEDIÇÃO)										
ID	Produto	Unidade	Valor Unit.	Valor Contrato	% Acum.	Quant Med.	Valor Final	Valor Mês	Valor Acum.	Empresa
1.1	COORDENAÇÃO GERAL	MENSAL	R\$ 59.212,49	R\$ 2.095.854,28	30,86%	1,00	R\$ 59.212,49	R\$ 59.212,49	R\$ 615.542,06	DYNA
1.2	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	MENSAL	R\$ 8.503,60	R\$ 615.391,05	69,83%	1,00	R\$ 8.503,60	R\$ 8.503,60	R\$ 402.801,05	DYNA
1.3	COMUNICAÇÃO SOCIAL	MENSAL	R\$ 28.778,99	R\$ 180.720,54	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.720,54	A&M
1.4	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	MENSAL	R\$ 23.940,25	R\$ 872.086,22	33,02%	1,00	R\$ 23.940,25	R\$ 23.940,25	R\$ 273.579,97	A&M
2.1	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	MENSAL	R\$ 58.407,02	R\$ 2.001.747,91	28,36%	1,00	R\$ 58.407,02	R\$ 58.407,02	R\$ 541.572,49	DYNA
2.2	ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	POR OBRA	R\$ 116.110,78	R\$ 851.091,98	36,15%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307.693,53	DYNA
2.3	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LIC	POR OBRA		R\$ 109.380,60	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.380,60	DYNA
2.4	GERENCIAMENTO TÉCNICO	OBRA x MÊS	R\$ 23.838,32	R\$ 2.288.478,72	28,06%	4,00	R\$ 95.353,28	R\$ 95.353,28	R\$ 606.723,39	DYNA
2.5	RECEBIMENTO DE OBRA	POR OBRA	R\$ 9.345,33	R\$ 37.381,32	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	DYNA
2.6	LICENÇA AMBIENTAL	POR OBRA		R\$ 448.023,99	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448.023,99	DYNA
3.1	RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	MENSAL	R\$ 47.233,29	R\$ 1.775.628,33	35,32%	1,00	R\$ 47.233,29	R\$ 47.233,29	R\$ 594.795,96	BV
3.2	PLANOS DE INSPEÇÃO	POR OBRA		R\$ 159.562,60	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.562,60	BV
3.3	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	OBRA x MÊS	R\$ 18.508,28	R\$ 1.832.319,72	19,81%	4,00	R\$ 74.033,12	R\$ 74.033,12	R\$ 351.657,32	BV
4.1	REPORTE DO PORTFÓLIO	MENSAL	R\$ 73.357,00	R\$ 2.630.004,74	31,83%	1,00	R\$ 73.357,00	R\$ 73.357,00	R\$ 796.079,74	A&M
4.2	CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	OBRA x MÊS	R\$ 9.418,33	R\$ 866.486,36	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	A&M
4.3	GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	MENSAL	R\$ 14.902,03	R\$ 574.822,43	31,49%	1,00	R\$ 14.902,03	R\$ 14.902,03	R\$ 172.467,51	A&M
5.1	ASSESSORIA JURÍDICA CONTÍNUA	MENSAL	R\$ 30.672,92	R\$ 1.141.600,88	34,60%	1,00	R\$ 30.672,92	R\$ 30.672,92	R\$ 374.777,88	MANESCO
5.2	ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	POR OBRA		R\$ 557.270,70	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 557.270,70	MANESCO
5.3	RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	MENSAL	R\$ 52.474,55	R\$ 1.953.025,63	34,60%	1,00	R\$ 52.474,55	R\$ 52.474,55	R\$ 641.161,88	MANESCO
5.4	CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	MENSAL	R\$ 66.631,22	R\$ 921.604,33	37,70%	1,00	R\$ 66.631,22	R\$ 66.631,22	R\$ 321.923,38	MANESCO

Nesse sentido, registra-se que, no universo dos produtos avaliados na 9ª medição, tendo em vista as notas de avaliação obtidas, **não houve necessidade de apresentação de plano de ação corretivo**. Tal conclusão decorre do fato de que todos os produtos efetivamente avaliados na competência foram reconhecidos com desempenho integral para fins de medição, preservando-se, assim, a regularidade do fluxo contratual e a continuidade da execução nos ciclos subsequentes.

Por fim, apresenta-se o acompanhamento financeiro das medições do CAEP até o mês anterior:

LINHA DO TEMPO DE MEDIÇÕES — STATUS FINANCEIRO										
Contrato n.º 01/2025 CAEP Medições 1 a 9										
● Pago ● Processado ● Em análise										
Empresa	MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO 2	MEDIÇÃO 3	MEDIÇÃO 4	MEDIÇÃO 5	MEDIÇÃO 6	MEDIÇÃO 7	MEDIÇÃO 8	MEDIÇÃO 9	
Empresa	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago
DYNA	R\$ 312.192,07	R\$ 389.743,01	R\$ 739.212,32	R\$ 270.833,58	R\$ 373.090,29	R\$ 319.147,94	R\$ 184.565,14	R\$ 221.476,39	R\$ 221.476,39	
A&M	R\$ 133.535,85	R\$ 200.293,76	R\$ 200.293,76	R\$ 122.760,04	R\$ 200.293,75	R\$ 200.293,76	R\$ 140.978,27	R\$ 112.199,28	R\$ 112.199,28	
MANESCO	R\$ 274.536,70	R\$ 285.876,79	R\$ 406.518,01	R\$ 114.510,63	R\$ 224.791,05	R\$ 272.827,03	R\$ 83.147,47	R\$ 83.147,47	R\$ 149.778,69	
BV	R\$ 58.320,94	R\$ 127.367,69	R\$ 118.619,99	R\$ 93.505,33	R\$ 182.892,53	R\$ 161.510,16	R\$ 121.266,41	R\$ 121.266,41	R\$ 121.266,41	
TOTAL	R\$ 778.585,56	R\$ 1.003.281,25	R\$ 1.464.644,08	R\$ 601.609,58	R\$ 981.067,62	R\$ 953.778,89	R\$ 529.957,29	R\$ 538.089,55	R\$ 604.720,77	

2.2 Produto 1.2 – Relatório de Relações Institucionais

2.2.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.2, referente ao Relatório de Relações Institucionais, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório detalhado que descreve atividades realizadas no período em atendimento às diversas interrelações institucionais necessárias à boa execução do portfólio. Deverá contemplar no mínimo:

- Relatório de Relacionamento Institucional: relatório que descreve a interação entre as diversas áreas do projeto, garantindo que o trabalho de cada setor (engenharia, certificação, contabilidade e jurídico) esteja alinhado e coordenado. Este relatório monitorará a integração dos processos e identificará oportunidades de integração entre as atividades.”*

2.2.2 Produtos desenvolvidos no período

- Integração Institucional e Consolidação de Processos executados em abril.

Durante o mês de abril, o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP) manteve agenda contínua de reuniões técnicas e de alinhamento operacional voltadas ao acompanhamento da execução das obras, à análise de medições e projetos, e à coordenação entre as equipes técnicas responsáveis pelo monitoramento dos empreendimentos vinculados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA. As agendas envolveram representantes do próprio CAEP, das equipes técnicas da Dynatest, da Alvarez & Marsal, da Bureau Veritas, do Instituto para Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (IFAG) e da assessoria jurídica da Manesco.

As reuniões de alinhamento com a equipe da Dynatest concentraram-se na atualização do status dos projetos e obras, incluindo pendências em disciplinas técnicas como geotecnia, drenagem e topografia, além da avaliação de impactos dessas restrições nos processos de medição e certificação. Também foram discutidas limitações operacionais em campo, necessidade de retrabalhos, controle de variações contratuais dentro dos limites previstos e reforço na rastreabilidade documental das atividades executadas, especialmente em relação às evidências geotécnicas e às não conformidades recorrentes identificadas nas frentes de obra.

No âmbito institucional e jurídico, reuniões com IFAG e Manesco abordaram riscos operacionais e contratuais relacionados à paralisação parcial de obras da CCL, análise de notificações e advertências às executoras, além da definição de estratégias de resposta técnica e documental para resguardar o programa diante de possíveis pleitos futuros. Também foram discutidos mecanismos de comprovação documental, histórico de cronogramas e metodologias de avaliação ESG aplicadas às executoras, com foco na estruturação de indicadores ambientais, sociais e de governança.

As agendas com a Alvarez & Marsal concentraram-se no alinhamento das prestações de contas trimestrais, na unificação de relatórios e na revisão dos critérios de medição física e financeira das obras. Foram discutidos aspectos relacionados à governança das medições, interpretação de índices de execução e adequação dos fluxos de acompanhamento às exigências de controle da GOINFRA, bem como controvérsias envolvendo a supressão e eventual reinstalação do Produto 1.3 no contrato do IFAG.

Em paralelo, reuniões integradas entre CAEP, Manesco, Dynatest, Bureau Veritas e A&M trataram de atrasos em pagamentos, riscos associados à paralisação de repasses financeiros e necessidade de alinhamento dos fluxos operacionais e das responsabilidades entre os agentes envolvidos. Também foram discutidas adequações de medições ao eventograma, impactos das não conformidades acumuladas e critérios para tomada de decisão quanto à continuidade das liberações financeiras.

Em síntese, abril foi marcado pelo aprofundamento das discussões técnicas e contratuais relacionadas à certificação, medição e regularidade documental das obras, bem como pelo fortalecimento da articulação institucional entre as equipes técnicas, jurídicas e de governança do programa.

Destaca-se, adicionalmente, que, embora tenha sido apontada, no âmbito da análise da 2ª prestação de contas, a necessidade de inclusão das atas completas das reuniões realizadas, optou-se, neste produto, pela apresentação consolidada das informações em formato de síntese técnica. Tal diretriz decorre da necessidade de assegurar maior confiabilidade dos temas tratados, compatibilização entre os diversos stakeholders envolvidos e padronização das informações apresentadas. A apresentação estruturada em planilha, contendo datas, participantes e assuntos, permite adequada rastreabilidade das atividades executadas, bem como melhor visualização da evolução temporal das ações, garantindo transparência, objetividade e aderência às diretrizes de governança do programa.

Data	Participantes	Assuntos
10/04/2026	IFAG: Sérgio Fonseca, Eliseu Garcia e Bruna Mendes Manesco: Gabriel Schroeder, Antônio Gonçalves CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento IFAG e Manesco - Advertência CCL: O encontro teve por objetivo alinhar a resposta técnica e jurídica do IFAG e do Manesco ao posicionamento da CCL sobre paralisação e certificação do projeto. Inicialmente foram expostas preocupações de que a carta da CCL extrapola a nota técnica e pode embasar pleitos futuros, especialmente diante da mobilização de equipamentos no canteiro e da alegação de paralisação não determinada; por isso propôs-se construir uma resposta cronológica e técnica sobre responsabilidades e atrasos. Em seguida analisaram-se riscos operacionais e contratuais, ressaltando que atrasos na entrega de projetos pela CCL influenciam prazos e certificação e que a paralisação deve ser dissociada do contrato como um todo. Foram definidos itens de prova a coletar (inventário de mobilização, histórico de cronogramas, gravação documental) e ações concretas como emissão de advertências a empreiteiras e solicitação formal de cronogramas e identificação de projetistas por disciplina. Também foi apresentada a metodologia ESG aplicada às executoras, com formulário transformado em indicadores ambientais, sociais e de governança, escala de 0 a 4, pesos por natureza (legal, contratual, boa prática) e conversão em percentual e faixas de maturidade.
13/04/2026	A&M: Walter Schneider e Igor Ferreira CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/A&M - resumo ata: A reunião teve como objetivo alinhar a prestação de contas trimestral e o checklist do consórcio, com foco na unificação de relatórios e na forma de medir a execução física versus financeira.
14/04/2026	Dynatest: Guilherme Soares, Luiz Henrique Costa, Edson Shimizu, José Augusto Meister e Victor Castro, Álvaro Laquis, Emine Lauara, Lara Cristina CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/Dynatest - resumo ata: A reunião teve como objetivo revisar o status dos projetos e da obra da CAEP, com foco em estudos técnicos, medições, não conformidades e impactos contratuais. Foi organizada a troca de presença, links e arquivos entre participantes no início da sessão. Em sequência, foram apresentados avanços nos estudos, com entregas parciais dos projetos geométrico e de drenagem e pendência do relatório geotécnico com entrega prevista até quinta-feira, o que impede aceitação de terraplanagem e pavimentação enquanto os ensaios não forem refeitos com fotos e rastreabilidade GPS. A equipe discutiu operação em campo limitada à conservação, pendências de medições sob responsabilidade da Goinfra e a retomada da rotina interna de envio de não conformidades às sextas-feiras para encerrar itens acumulados e atualizar o BI quando necessário. Foi detalhado o controle de variações contratuais dentro do limite de 10% e os riscos de drenagem e geotecnia que podem exceder esse limite, incluindo divergências sobre responsáveis pelas revisões de projeto e necessidade de atualizar programações disciplinares conforme aprovações. Por fim, foram revisadas entregas e notificações por trecho, pendências documentais e de topografia, retrabalhos em campo, problemas de solo expansivo, encaminhamentos para pareceres e minutas de liberação de medições, e a não conformidade recorrente na execução de cercas com impacto financeiro em boletins de medição.
20/04/2026	A&M: Walter Schneider e Igor Ferreira CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/A&M - resumo ata: A reunião tratou da controvérsia sobre a supressão e eventual reinstalação do produto de comunicação identificado como 1.3 no contrato do IFAG, examinando o contexto trazido pela Goinfra, a posição de Armando e o ponto de vista da nova gestora Alessandra.
23/04/2026	A&M: Walter Schneider , Gabrielle Rocha e Igor Ferreira Dynatest: Victor Castro CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/A&M - resumo ata: A reunião teve como objetivo revisar a governança das prestações de contas e o processamento das medições no programa, com foco na interpretação do índice 80/100 e na nova forma de planejar o executado em função do realizado, sob acompanhamento trimestral pela GOINFRA.
27/04/2026	A&M: Walter Schneider e Igor Ferreira BV: Vinicius Coutinho CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/A&M/Certificação - pauta: Atrasos, riscos e responsabilidade por paralisações de pagamento no modelo de execução adotado.
28/04/2026	Manesco: Gabriel Schroeder e Lucas Pinto Dynatest: Edson Shimizu CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/Manesco/Dynatest - pauta: A reunião teve como objetivo alinhar fluxos, responsabilidades e pendências da parceria GOINFRA-IFAG.
29/04/2026	Manesco: Gabriel Schroeder e Daniel Esteves CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/Manesco - pauta: A reunião teve como objetivo tratar medições das executoras, adequação ao eventograma e decisões de pagamento diante de não conformidades e atrasos acumulados.

2.3 Produto 1.3 – Relatório de Comunicação Integrada

2.3.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.3, referente ao Relatório de Comunicação Integrada, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório com o objetivo de garantir que as informações sobre o andamento dos projetos e obras de infraestrutura sejam comunicadas de forma transparente e acessível às partes interessadas, incluindo as comunidades locais, órgãos governamentais, parceiros privados e o público em geral. Deverá contemplar no mínimo:

- *Este relatório abordará estratégias e atividades desenvolvidas, em andamento e planejadas, que tem como objetivo transparência do relacionamento proativo, minimizando o impacto da elaboração de projeto e execução da obra e assegurar a adesão das comunidades aos projetos de infraestrutura.”*

2.3.1.1 Suspensão dos Serviços de Comunicação Integrada

Em virtude da supressão do Produto 1.3 (Comunicação Social) no âmbito do Contrato nº 01/2025 (CAEP–IFAG), devidamente formalizada mediante aditivo contratual, os serviços vinculados a este item foram encerrados de forma regular e definitiva. O IFAG adotou as medidas cabíveis para garantir a regularidade do processo, preservando o erário e assegurando a conformidade contratual. O e-mail de registro do tema, segue abaixo para fins de comprovação.

De: Engenharia Infra <engenharia_infra@ifag.org.br>
Data: 5 de fevereiro de 2025 às 15:17:14 BRT
Para: Gabriel Schneider de Almeida <gschneider@manesco.com.br>, Alex Pinelli <alex.pinelli@dynatest.com.br>, Sérgio Borges Fonseca Junior <sergio.junior@ifag.org.br>, Pedro Salomão Rodrigues de Abreu <pedro.abreu@ifag.org.br>
Assunto: Re: Supressão Contratual [QED-MRPAM.FID1537640]

Boa Tarde Gabriel / Alex,

Em observância ao Parecer encaminhado pela Empresa Manesco Advogados que versa sobre o aditivo de supressão dos serviços do CAEP, mais especificamente sobre o produto 1.3, informamos que:

1 – Para contextualização e maior segurança jurídica, solicitamos que seja incorporado ao Parecer, jurisprudências que anuem a referida supressão de um produto de forma integral do escopo do contrato, ou seja, Acórdãos, Decisões Transitadas em Julgado, Pareceres Normativos, que tratem o assunto e embasem tecnicamente esta decisão;

2 – Inserir no escopo da documentação, memória de cálculo apresentada pela empresa Alvarez e Marçal, demonstrando a inviabilidade do produto com a redução de 7 obras para 3 obras. Nesse demonstrativo é essencial fazer um comparativo de valores entre a atual estrutura para a entrega do produto e a estrutura necessária para atender a redução de obras, aplicando a redução de 47,60%;

3 – Conforme sugerido no Parecer, o IFAG já realizou cobranças à GOINFRA, através de ofício, para dar celeridade nas respostas, no que concerne à redução proposta, porém ainda não obtivemos retorno, dando aquiescência para alteração da redução, conforme proposta encaminhada pelo CAEP;

4 – Para não gerar insegurança jurídica aos envolvidos e não trazer prejuízos ao Consórcio e visando evitar danos ao erário, o IFAG solicita a suspensão da prestação dos serviços constantes do Produto 1.3 (sine die), até que se obtenha resposta da GOINFRA/SEINFRA acerca da supressão dos serviços sugerida pelo CAEP.

2.4 Produto 1.4 – Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC)

2.4.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.4, referente ao Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC), é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório de todas as atividades de manutenção e desenvolvimento de plataforma integrada de gestão no âmbito do programa de gestão dos produtos, que consolida as atividades prestadas e apuração dos indicadores de apuração e desempenho.”

2.4.1.1 Publicação Rotineira do Painel de Sala de Situação no Site do IFAG

É publicado quinzenalmente, em conformidade com a estratégia do IFAG e CAEP. No entanto, ressalta-se que a edição de 07/04/2026 refere-se exclusivamente à última quinzena de março, não integrando o ciclo de publicações de abril. As publicações de abril correspondem às datas de 22/04/2026 e 30/04/2026.

A cada atualização, o BI é inicialmente publicado em ambiente preliminar para avaliação e aprovação do IFAG. Um e-mail é encaminhado ao IFAG solicitando a aprovação formal e, após a manifestação favorável do órgão — formalizada via e-mail —, o painel é publicado no site do IFAG. Segue abaixo evidências das aprovações do IFAG:



 Adriano Silva de Faria
Para:  Ferreira, Igor
Cc: Eliseu Silva Garcia <eliseu.garcia@ifag.org.br>; +6 outros

Responder Responder a todos Encaminhar

Qui, 23/04/2026 13:41

 Você respondeu em Qui, 23/04/2026 14:35

Exibir conversa

 [EXTERNAL EMAIL]: Use Caution

Prezado, Igor.
Boa tarde.
Após consulta à equipe do IFAG, deliberou-se para a **aprovação** da publicação.
Obrigado.

Em qui., 23 de abr. de 2026 às 09:23, Ferreira, Igor <i.ferreira@alvarezandmarsal.com> escreveu:
Prezados, bom dia!

Em atendimento à solicitação recebida dia 22/04/2026 quanto a temporalidade de publicação das informações de avanço físico (de atualização mensal), inserimos a informação de mês de referência no painel de Resumo Executivo e Relatório Unifilar.

 Adriano Silva de Faria
Para:  Ferreira, Igor
Cc: Eliseu Silva Garcia <eliseu.garcia@ifag.org.br>; +6 outros

Responder Responder a todos Encaminhar

Seg, 04/05/2026 11:39

 Você respondeu em Seg, 04/05/2026 13:02

Exibir conversa

 [EXTERNAL EMAIL]: Use Caution

Prezado, Igor.
Bom dia.
A equipe do IFAG realizou a conferência e está de acordo com a publicação da atualização do painel.
Obrigado.


Em qui., 30 de abr. de 2026 às 13:43, Ferreira, Igor <i.ferreira@alvarezandmarsal.com> escreveu:
Prezados, boa tarde!

Formalizamos através deste e-mail, a publicação do BI, no Drive do IFAG, para uma avaliação e posterior confirmação de que poderemos publicar no site do IFAG.

2.4.1.2 As publicações contemplam as principais rotinas de atualização do Portfólio e do Painel de Acompanhamento Visual, bem como dos painéis de Resumo Executivo e Unifilar. Painel de Avanço Físico e Unifilar


- **Indicador de Avanço Físico da Obra:** Como estruturação de processos, e vinculado ao Produto 4.1 Gestão de Portfólio de Projetos, foram realizadas reuniões com o consórcio (CAEP) para definição dos pesos de ponderação do indicador de avanço físico global de cada obra. Com a aprovação dos eventogramas e a consolidação dessa metodologia, tornou-se possível estruturar um cálculo padronizado e consistente do avanço global por empreendimento.

Como resultado direto desse trabalho, e no âmbito do Produto 1.4, foi disponibilizado o painel de acompanhamento unifilar publicado no BI, atualizado mensalmente, que traduz de forma visual a evolução semanal das obras e a porcentagem de evolução global mensal, conforme representado no painel abaixo.

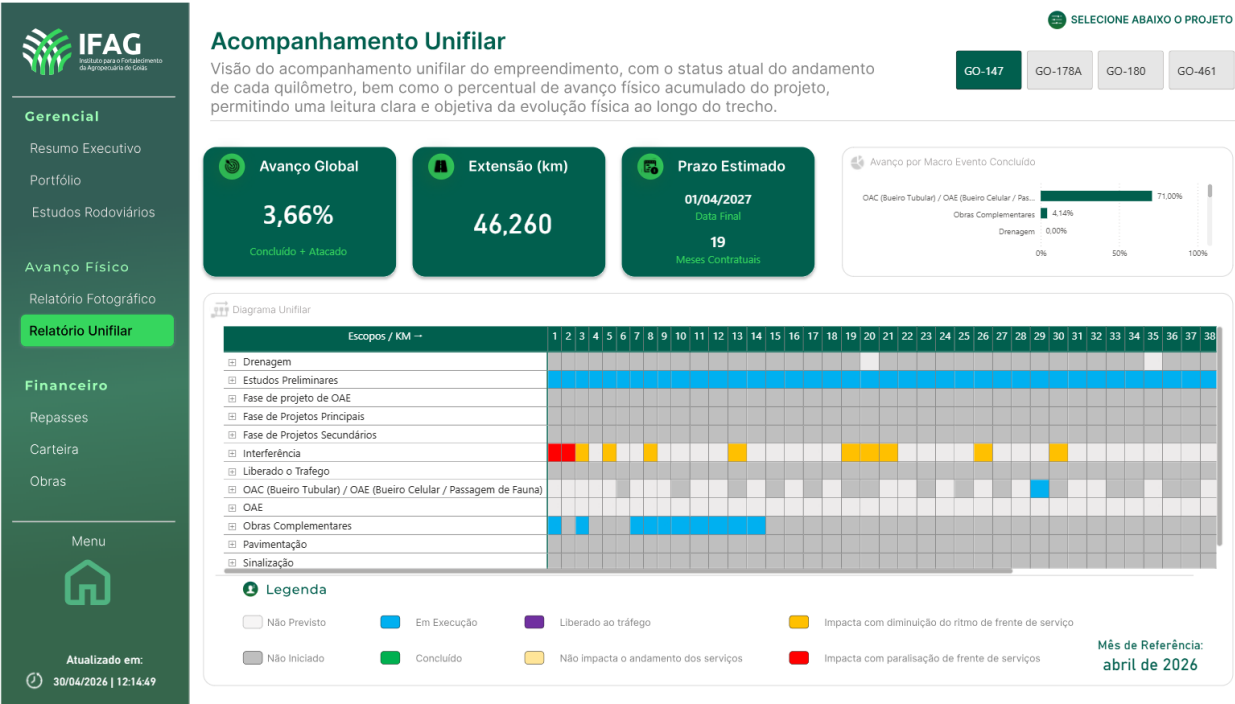

2.4.1.4 Atualização dos Painéis Financeiros

- **Painéis Financeiros:** No período em análise, foram realizadas atualizações nos painéis financeiros com foco na atualização das informações referentes às solicitações de repasses à estruturadora, abrangendo os meses de janeiro, fevereiro e março de 2026. Essas atualizações visam refletir de forma mais fiel a evolução temporal das solicitações de repasse, contribuindo para a manutenção da base de dados atualizada e alinhada aos registros administrativos do período. Ressalta-se que as alterações efetuadas tiveram caráter pontual e informativo, não implicando mudanças na estrutura, metodologia ou critérios de análise dos painéis financeiros, os quais permanecem consistentes com o padrão previamente estabelecido para o acompanhamento gerencial e institucional dos empreendimentos.

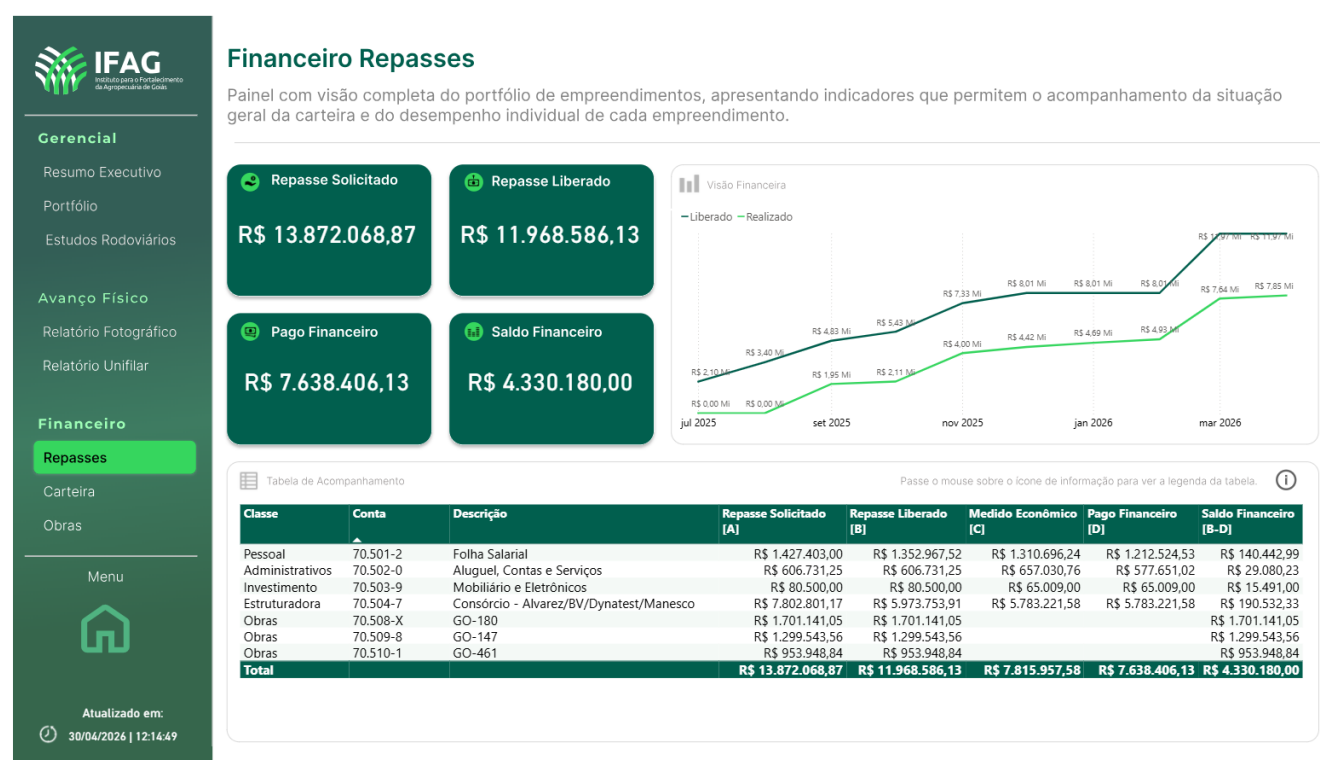



IFAG
Instituto para o Fortalecimento
da Agropecuária do Estado

Gerencial

Resumo Executivo

Portfólio

Estudos Rodoviários

Avanço Físico

Relatório Fotográfico

Relatório Unifilar

Financeiro

Repasses

Carteira

Obras

Menu




Atualizado em:
30/04/2026 | 12:14:49

Financeiro Carteira

Painel com visão consolidada do portfólio de projetos, contemplando o orçado e o realizado, o saldo a executar, o status e os principais desvios identificados.

Tabela de Acompanhamento				Passe o mouse sobre o ícone de informação para ver a legenda da tabela.			
Rodovia	Linha de Base Total [B]	Previsto no Mês [C]	Realizado no Mês [D]	Desvio no Mês [D-C]	Linha de Base Acumulada [E]	Realizado Acumulado [F]	Desvio Acumulado [F-E]
GO-147	R\$ 151.600.155,38	R\$ 14.316.599,25			R\$ 10.481.991,85		
GO-178A	R\$ 116.104.898,13	R\$ 19.063.535,35			R\$ 9.455.452,61		
GO-180	R\$ 123.529.511,69	R\$ 9.265.838,98			R\$ 5.486.948,11		
GO-461	R\$ 96.273.306,17	R\$ 2.969.054,34			R\$ 3.888.923,13		
Total	R\$ 487.507.871,37	R\$ 45.615.027,92			R\$ 29.313.315,70		

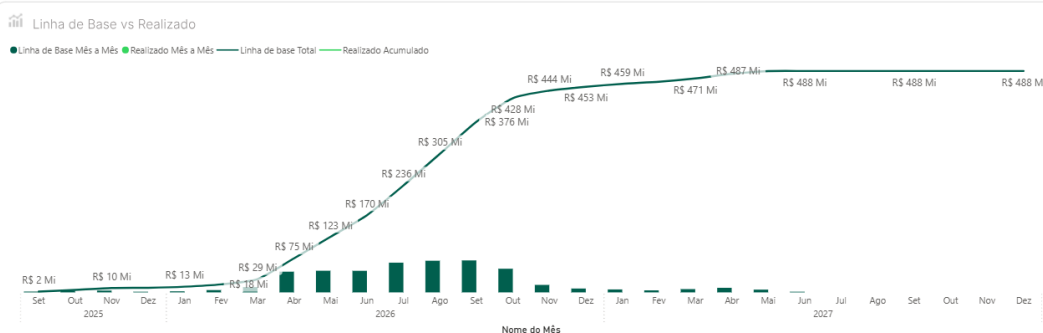

Financeiro Obras

Visão integrada da execução econômica, comparando orçamento e realizado, valores comprometidos (gastos firmes/prováveis) e forecast, com destaque para variações e impactos.

Principais Indicadores

R\$ Anteprojeto

R\$ 546,61 Mi

R\$ Linha de Base

R\$ 487,51 Mi




Tabela de Acompanhamento				Passe o mouse sobre o ícone de informação para ver a legenda da tabela.			
Evento Macro	Linha de Base Total [B]	Previsto no Mês [C]	Realizado no Mês [D]	Desvio no Mês [D-C]	Linha de Base Acumulada [E]	Realizado Acumulado [F]	Desvio Acumulado [F-E]
01.ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 27.840.582,26	R\$ 2.513.838,55			R\$ 1.272.525,56		
02.CANTEIRO DE OBRA	R\$ 10.345.939,14	R\$ 695.350,97			R\$ 2.914.493,40		
03.MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 649.529,08	R\$ 18.153,67			R\$ 271.653,28		
04.TERRAPLENAGEM	R\$ 80.937.046,09	R\$ 20.861.219,64			R\$ 9.790.049,52		
05.PAVIMENTAÇÃO	R\$ 275.141.531,14	R\$ 12.869.042,37			R\$ 369.892,29		
06.DRENAGEM	R\$ 34.987.611,01	R\$ 3.114.537,72			R\$ 712.412,27		
07.OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 7.972.036,78	R\$ 1.386.257,04			R\$ 3.801.513,14		
08.OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 2.694.845,78				R\$ 599.327,67		
08.SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	R\$ 4.124.969,43	R\$ 1.025,00			R\$ 15.931,65		
RODOVIÁRIA							
09.AMBIENTAL	R\$ 1.480.267,28	R\$ 366.580,11					
Total	R\$ 487.507.871,37	R\$ 45.615.027,92			R\$ 29.313.315,70		

- **Acompanhamento Visual:** No período de referência, o Painel de Acompanhamento Fotográfico passou por atualizações em três datas distintas. A atualização realizada em 07/04/2026 refere-se exclusivamente à última quinzena de março, não integrando o ciclo regular de publicações de abril. Já as publicações efetuadas em 22/04/2026 e 30/04/2026 correspondem, respectivamente, à primeira e à última quinzena de abril. As imagens foram incorporadas de forma estruturada ao painel, possibilitando evidenciar a evolução das frentes de serviço e o progresso físico dos empreendimentos ao longo dos períodos analisados. As informações utilizadas têm como base os relatórios semanais de acompanhamento de obras, sendo consolidadas e disponibilizadas pelo CAEP, com atualização quinzenal e validação realizada pelo IFAG, assegurando a consistência, a confiabilidade e a rastreabilidade dos registros apresentados no painel.



Gerencial

- Resumo Executivo
- Portfólio
- Estudos Rodoviários

Avanço Físico

- Relatório Fotográfico**
- Relatório Unifilar

Financeiro

- Repasse
- Carteira
- Obras

Menu

Atualizado em:
30/04/2026 | 12:14:49

Acompanhamento Fotográfico

O acompanhamento fotográfico registra o progresso das atividades em campo, proporcionando uma visão in loco do andamento do projeto.

UTILIZE OS FILTROS PARA EXPLORAR OS DADOS LIMPAR FILTROS

Rodovia: Todos Disciplina: Todos Data: 17/09/2025 a 24/04/2026

Descrição das Atividades - Selecione um ponto no mapa abaixo para detalhar.

Sem disciplina exclusiva selecionada.



Selecione um ponto no mapa para detalhar.



25 de novembro de 2025
22K 450002 7986555
Est.378+00 a 407+00 corpo de aterro em execução
#GO 178_A
Número do índice: 13

- **Portfólio:** No âmbito do Produto 4.1 — Gestão de Portfólio de Projetos (PMO) —, foram realizadas reuniões de PMO com o CAEP e com o IFAG para acompanhamento, revisão e consolidação das informações relacionadas às etapas e fases dos projetos que compõem o portfólio de empreendimentos monitorados. As atualizações realizadas permitiram refletir o status atual de cada iniciativa, em conformidade com as práticas e nomenclaturas adotadas na gestão de projetos, proporcionando uma visão consolidada do andamento do portfólio. No período em questão, houve as seguintes atualizações:

- Evolução dos tópicos de Fase de Estudos das GO-461 e GO-147, de “A iniciar” para “Em curso”;
- Evolução do tópico de Desapropriação da GO-147, de “A iniciar” para “Em curso”.



IFAG
Instituto para o Fortalecimento da Administração Pública

Gerencial

Resumo Executivo

Portfólio

Estudos Rodoviários

Avanço Físico

Relatório Fotográfico

Relatório Unifilar

Financeiro

Repasse

Carteira

Obras

Menu



Atualizado em:

30/04/2026 | 12:14:49

Visão Portfólio

Visão geral do portfólio de empreendimentos, com apresentação dos principais indicadores da carteira e do desempenho individual de cada empreendimento.

Obras em Iniciação
0
*Projetos em elaboração pela COINFRA

Obras em Contratação
0

Obras em Implantação
4

Obras em Encerramento
0

Obras Encerradas
0
*Projetos aceitos pela COINFRA

Tabela de Acompanhamento

RODOVIA	FASE	STATUS	ANTEPROJETO	CONTRATAÇÃO EPC	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	PROJETO EXECUTIVO	FASE DE ESTUDOS	PROJETO EXECUTIVO VIÁRIO PRINCIPAL	PROJETO EXECUTIVO VIÁRIO SECUNDÁRIO	OBRAS ARTES ESPECIAIS	APROVAÇÃO EXE
GO-147	Implantação	Ativo	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Em curso	Em curso	Em curso	À iniciar	À iniciar	À
GO-180	Implantação	Ativo	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Em curso	Em curso	Em curso	À iniciar	À iniciar	À
GO-461	Implantação	Ativo	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Em curso	Em curso	Em curso	À iniciar	N/A	À
GO-178	Implantação	Ativo	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Em curso	Em curso	Em curso	Em curso	N/A	À

Legenda

Finalizado

— Refere-se aos processos que já foram concluídos, com todas as etapas encerradas.

Em curso

— Refere-se aos processos que estão em andamento, com ações sendo realizadas e acompanhamento ativo.

À iniciar

— Refere-se aos processos que ainda não foram iniciados, mas que estão previstos nas etapas do empreendimento.

N/A

— Refere-se aos processos para os quais a etapa do empreendimento não se aplica.

2.4.2 Produtos desenvolvidos no período

CAEP Controle de Produtos										CAEP CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS	
ID	Produto	Empresa Responsável	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data de Início	Data da entrega	Status Entrega		
1	1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3	Geral	01/04/2026	30/04/2026	Entregue		
2	1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	Geral	01/04/2026	30/04/2026	Entregue		

-CONFIDENCIAL-

34

ENCERRAMENTO

O **Relatório Mensal N° 10**, referente à consolidação e à apresentação das atividades desenvolvidas durante o mês de referente ao período **01 de abril/2026 até 30 de abril/2026**, em conformidade ao Contrato N° 01/2025-IFAG, apresenta-se constituído de 35 (Trinta e Cinco) páginas e 07 (Sete) anexos e adotou metodologia tecnicamente adequada e aderente às melhores práticas do assunto em questão, representando a opinião de seus subscritores.

Goiânia, 07 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente
 **ALEX DE VASCONCELOS PINELI ALVES**
Data: 13/05/2026 16:57:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alex de V. Pineli Alves

CAEP – Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos
Produto P1.1 e P1.2 – Relatório mensal – Grupo 1



Vinicius Daher

CAEP – Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos
Produto P1.3 e P1.4 – Relatório mensal – Grupo 1

ANEXOS**LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS**

REF.	DESCRIÇÃO
Anexo I	P1.1 - Controle de Entrega de Produtos de abril.xlsx
Anexo II	P1.1 - Dashboard da Análise de Entrega de Produtos - abril.pdf
Anexo III	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de abril.xlsx
Anexo IV	P1.1 - Timeline de Acompanhamento Macro até abril 2026.pdf
Anexo V	P1.2 - Controle de Reuniões do mês de abril.xlsx
Anexo VI	1.4. Anexos.zip
Anexo VII	Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3 (2)

CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

 **Dynatest**[®]

MANESCO

 **INFRA**
& CAPITAL PROJECTS
BY ALVAREZ & MARSAL



RELATÓRIO CAEP

Grupo 1 - Coordenação Geral Executiva

Relatório Mensal N° 11

Referente ao período de execução de 01.05.26 até 31.05.26

08 de Junho de 2026

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	3
2 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA.....	4
2.1 Produto 1.1 – Relatório de Coordenação Geral	5
2.1.1 Descrição das atividades atribuídas	5
2.1.2 Produtos desenvolvidos no período	5
2.2 Produto 1.2 – Relatório de Relações Institucionais	29
2.2.1 Descrição das atividades atribuídas	29
2.2.2 Produtos desenvolvidos no período	29
2.3 Produto 1.3 – Relatório de Comunicação Integrada	35
2.3.1 Descrição das atividades atribuídas	35
2.4 Produto 1.4 – Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC)	36
2.4.1 Descrição das atividades atribuídas	36
2.4.2 Produtos desenvolvidos no período	44
ENCERRAMENTO.....	45
ANEXOS	46

1 APRESENTAÇÃO

A seleção da empresa Estruturadora pelo Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG - ocorreu por meio do Instrumento de Convocação nº 01/2025 para empresas ou consórcio estruturador, qualificados junto à SEINFRA, conforme o Chamamento Público para pré-qualificação nº 001/2024 da SEINFRA. Consagrado vencedor, o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos - CAEP – desenvolverá, ao longo do contrato, atividades especializadas em gestão de infraestrutura, divididas conformes os grupos:



Coordenação Geral Executiva



Gestão de Engenharia e Socioambiental



Certificação de Projetos e Obras



Gestão de Processos Administrativos e Contábeis



Assessoramento e Consultoria Jurídica

Figura 1 – Imagem ilustrativa da gestão em infraestrutura.

O CAEP é formado pelas empresas Dynatest Engenharia LTDA, Bureau Veritas do Brasil Sociedade Classificadora e Certificadora LTDA., Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA e Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados.

O Consórcio Estruturador apresenta ao IFAG o **Relatório Mensal Nº 11**, referente ao período de **01 de Maio/2026 até 31 de Maio/2026**, em conformidade ao Contrato Nº 01/2025-IFAG.

O presente Relatório Mensal apresenta os elementos do objeto contratual descrito no Termo de Referência como “Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA”.

2 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

A Coordenação Geral Executiva atua como agente de interface entre todos os envolvidos, isto é, IFAG, SEINFRA, GOINFRA, empresas projetistas, empresas executoras e empresas supervisoras, garantindo que o objetivo seja executado de forma eficaz, transparente e coordenada. A função central desta coordenação é manter a coesão entre as diversas áreas envolvidas (gerenciamento de obras, projetos, governança, contábil, legal, dentre outras) e assegurar que todas as atividades sejam realizadas de acordo com os padrões técnicos, legais e de governança definidos pela SEINFRA, GOINFRA, FUNDEINFRA e IFAG.

Principais atividades:

- Gestão centralizada;
- Integração das atividades;
- Interlocução com partes interessadas (stakeholders);
- Comunicação integrada;
- Acompanhamento de cronogramas e alocação de recursos;
- Gestão integrada de riscos;
- Acompanhamento de processos e prestação de contas;
- Desenvolvimento e manutenção de sistemas e painéis do tipo sala de situação.

2.1 Produto 1.1 – Relatório de Coordenação Geral

2.1.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.1, referente ao Relatório de Coordenação Geral, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório detalhado que descreve a estrutura da Coordenação Central, responsável pela gestão centralizada de todas as (macro)atividades e seus produtos, no âmbito de suas atribuições e responsabilidades. Deverá contemplar no mínimo:

- Progresso e Prestação de Contas das Atividades: relatório que consolida o progresso de todas as atividades executadas, em execução e planejadas, indicando as fases atuais de atendimento (status), a fim de assegurar a prestação de contas à Associação, SEINFRA, órgãos de controle, e demais partes interessadas além de oferecer transparência aos demais stakeholders quanto às suas atividades. Esses relatórios incluirão indicadores de desempenho globais e parciais, cumprimento de prazos, resultados financeiros e alinhamento às normas técnicas e legais.*
- Plano de Gestão Integrada de Riscos: documento que consolida a gestão de riscos de todas as áreas do projeto, garantindo que a visão abrangente e atualizada dos riscos envolvidos (financeiros, operacionais, ambientais, jurídicos, ou outros inerentes ao objetivo do projeto). O plano estabelecerá as medidas de mitigação e contingência, indicando os responsáveis por cada ação, além de promover a coordenação entre os setores para garantir uma resposta integrada.”*

2.1.2 Produtos desenvolvidos no período

- Planilha de Controle de Produtos referente ao mês de maio.

Durante o mês de maio de 2026, o CAEP manteve elevado nível de produção técnica, administrativa e institucional, com a emissão de documentos voltados ao acompanhamento das obras, à análise de projetos executivos, à gestão contratual e ao fortalecimento da governança do Programa. O período foi marcado por intensa atuação das equipes, com destaque para atas de reuniões de alinhamento técnico e operacional, notificações de não conformidade, pareceres técnicos, notas técnicas, relatórios de acompanhamento de obras, boletins de medição e instrumentos de assessoramento jurídico.

O conjunto de entregas evidencia a atuação integrada das empresas consorciadas Dynatest, A&M Infra, Bureau Veritas e Manesco, que atuaram de forma complementar nas frentes de engenharia, gestão contratual, certificação, planejamento financeiro, gestão de riscos e assessoramento jurídico. Observou-se predominância das atividades vinculadas às frentes de Gerenciamento Técnico, Coordenação de

Serviços de Engenharia e Análise de Projeto e RPFO, responsáveis pela maior parte das entregas relacionadas ao acompanhamento dos empreendimentos e à análise técnica dos projetos executivos.

No âmbito técnico-operacional, destacaram-se as análises e aceitação de projetos executivos, abrangendo estudos geotécnicos, geológicos, hidrológicos, drenagem, terraplenagem, pavimentação e projeto geométrico. Também foram emitidos pareceres de conformidade ambiental, avaliações de segurança do trabalho, análises de pendências documentais, eventogramas e notificações de não conformidade de natureza contratual, ambiental e de obra, além de boletins de medição e relatórios semanais de acompanhamento.

As atividades do mês abrangeram os empreendimentos GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461, que concentraram reuniões de alinhamento técnico, análises especializadas, pareceres ambientais, notificações e relatórios de acompanhamento de obras. A recorrência dessas entregas demonstra a continuidade das ações de fiscalização, controle técnico e monitoramento dos empreendimentos acompanhados pelo consórcio.

No campo da gestão contratual e assessoramento jurídico, a Manesco manteve atuação relevante por meio da elaboração de relatórios jurídicos, revisões de minutas, respostas a ofícios, análises de cronogramas e documentos voltados à gestão contratual das obras. Paralelamente, a A&M Infra contribuiu com relatórios de portfólio, dashboards gerenciais, acompanhamentos financeiros, matrizes de riscos e relatórios IRIS, reforçando os mecanismos de governança, transparência e suporte à tomada de decisão.

No campo da certificação, o Bureau Veritas manteve as atividades de verificação independente, com a emissão do Relatório Mensal de Gestão da Certificação e dos relatórios técnicos de obra referentes aos empreendimentos GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461, fortalecendo os mecanismos de inspeção técnica e controle externo.

Além das entregas concluídas, o mês de maio registrou produtos em elaboração relacionados à padronização dos processos de fiscalização ambiental e de segurança do trabalho, evidenciando a continuidade das ações de aprimoramento institucional.

Dessa forma, o controle de produtos referente ao mês de maio de 2026 apresenta um panorama abrangente e atualizado da atuação do CAEP no período, assegurando rastreabilidade documental, transparência na execução das atividades e aderência às responsabilidades previstas no escopo contratual.

Apresenta-se, portanto, a seguir, a planilha consolidada das entregas de maio de 2026, contendo a identificação do produto, a empresa responsável, o tipo de documento, a descrição, o empreendimento correspondente, a data de entrega e o status atualizado, permanecendo como ferramenta fundamental para o acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas pelo consórcio.

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-102.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	04/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.3	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Setembro/2025	GO-180	04/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-002.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-180	04/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-003.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Novembro/2025	GO-180	04/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-017.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	04/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-047.1	Parecer	Parecer Técnico - Eventograma	GO-180	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-461	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-002.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Novembro/2025	GO-461	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-003.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Dezembro/2025	GO-461	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-025.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-030.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-031.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-031.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-107.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	06/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-018.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	06/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-108.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	07/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-109.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	07/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-077.1	Parecer	Parecer Técnico - Eventograma	GO-461	07/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-105.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	07/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-106.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	07/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-110.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	08/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-111.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	08/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-076.1	Parecer	Parecer Técnico - Eventograma	GO-147	08/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-078.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Terraplenagem	GO-178A	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-019.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	GO-461	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-020.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza SST	GO-461	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-027.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	GO-178A	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-028.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Segurança do Trabalho	GO-178A	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-029.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-034.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-035.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-035.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	08/05/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião 08/05/2026	Reunião	Reunião de alinhamento entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	08/05/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta - bueiros sem armação - Relatório de Medição - CCB	Gestão Contratual	Revisão de minuta sobre a execução de bueiros sem armação para relatório de medição de serviços executados pela CCB	GO-147	08/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-138.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-139.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos, DAP e DUP	GO-147	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-140.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-141.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos	GO-178A	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-142.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-180	11/05/2026	Entregue

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-143.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP, Hidrologia e Geotecnia	GO-180	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-144.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-461	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-145.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-461	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-075.1	Parecer	Parecer Técnico - DUP	GO-178A	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-079.1	Parecer	Parecer Técnico - DUP	GO-180	11/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-112.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	11/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Setembro/2025	GO-147	11/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-002.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-147	11/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-003.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Novembro/2025	GO-147	11/05/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 10	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a abril de 2026	Geral	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-146.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos	GO-461	13/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-012.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Projeto	GO-147	13/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-013.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	13/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-026.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	13/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-031.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	13/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-032.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	13/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-032.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	13/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-114.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	14/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-115.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	14/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-113.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	14/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-014.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza SST	GO-147	14/05/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Nota Técnica em resposta ao Ofício CCB-28/2026	Gestão Contratual	Minuta de resposta ao Ofício 28/2026 da CCB sobre bueiros sem armacão	GO-147	14/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-116.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	15/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-117.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	15/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-044.1	Parecer	Parecer Técnico - Projeto Geométrico	GO-461	15/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-147.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Hidrológicos	GO-180	15/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-149.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-461	15/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-150.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-461	15/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-026.2	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	15/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-031.2	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	15/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-032.2	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	15/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-032.2	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	15/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-080.1	Parecer	Parecer Técnico - DUP	GO-461	18/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-118.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	18/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-048.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade SST	GO-147	18/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-050.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	18/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-051.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	18/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-148.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Drenagem	GO-178A	19/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-123.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	20/05/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-081.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	20/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-082.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-180	20/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-084.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	20/05/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Matriz RACI	Outros	Apoio na elaboração de Matriz RACI pelo CAEP considerando as alterações nas responsabilidades da parceria após Mesa Técnica Revisão do Parecer Técnico (PA-078) elaborado pelo CAEP em resposta à CCL/TRAFFECOM	Geral	20/05/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Parecer Técnico (PA-078)	Gestão Contratual		GO-178A	20/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-119.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	21/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-120.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-121.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-122.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-015.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-016.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-147	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-083.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-027.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-032.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-033.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-033.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	21/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-125.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	22/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-126.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	22/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-020.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-180	22/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-021.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	22/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-021.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-461	22/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-022.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	22/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-029.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-178A	22/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-086.1	Parecer	Parecer Técnico - Relatório de Não Conformidade NC-018	GO-461	22/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-087.1	Parecer	Parecer Técnico - Ocorrência apontada na passagem de fauna	GO-147	22/05/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Resposta ao Ofício 031/2026 da CCB	Gestão Contratual	Elaboração de resposta ao Ofício 031/2026 da CCB quanto à notificação de atraso do cronograma na entrega dos projetos executivos	GO-147	22/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	IT-006.1	Instrução Técnica	Instrução Técnica Inspeção em Alojamentos	Geral	25/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-151.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	25/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-085.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Terraplenagem	GO-461	25/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-088.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Terraplenagem	GO-178A	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-124.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-017.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-147	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-023.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza SST	GO-180	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-024.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-180	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-089.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-090.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-091.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-180	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-092.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	25/05/2026	Entregue

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-093.1	Parecer	Parecer Técnico Análise de pendência documental referente à supervisora	GO-147	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-094.1	Parecer	Parecer Técnico Análise de pendência documental referente à supervisora	GO-180	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-095.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-096.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-180	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-097.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-100.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-022.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	26/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-023.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	26/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-030.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-178A	26/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-101.1	Parecer	Parecer Técnico Análise de pendência documental referente à supervisora	GO-178A	26/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-102.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	26/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-152.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	27/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-153.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos	GO-147	27/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-154.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	27/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-155.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos	GO-178A	27/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-103.1	Parecer	Parecer Técnico - DUP	GO-178A	27/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-104.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto Geométrico	GO-147	27/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-133.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	27/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-129.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	28/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-130.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	28/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-127.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	28/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-024.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-461	28/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-099.1	Parecer	Parecer Técnico Análise de pendência documental referente à supervisora	GO-461	28/05/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião 28/05/2026	Reunião	Reunião entre IFAG e equipe jurídica do CAEP sobre acompanhamento de cronograma e aplicação de penalidades	Geral	28/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-128.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	29/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-156.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto Geométrico	GO-180	29/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-157.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	29/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-158.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto Geométrico, Projeto de Drenagem e DUP	GO-178A	29/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-108.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Pavimentação	GO-461	29/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-031.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	29/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-032.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza SST	GO-178A	29/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-028.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	29/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-033.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	29/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-034.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	29/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-034.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	29/05/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3	Geral	31/05/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	Geral	31/05/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	[TIC] Sala de Situação - Manual Descritivo do Portal de Acompanhamento	Geral	31/05/2026	Entregue

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°11 - 01.05.26 31.05.26	Geral	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	[CAEP.IFAG] Portfólio	Geral	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Alocação de Recursos - Interno IFAG	Geral	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Ata de Reunião	Controle de Reuniões A&M	Geral	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Outros	E-mails de Aprovação	Geral	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Outros	KPI - Alocação de Recursos - Sala de Situação	Geral	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Outros	KPI - Gestão Integrada	Geral	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Ata de Reunião	[2026.05] Controle de Reuniões A&M.xlsx	Geral	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	IFAG - Portfólio de Projetos.xlsx	Geral	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Acompanhamento Financeiro - GO-147	Geral	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Acompanhamento Financeiro - GO-178A	GO-147	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Acompanhamento Financeiro - GO-180	GO-178A	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Acompanhamento Financeiro - GO-461	GO-180	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	[GO147] Relatório Financeiro - Set a Nov - 2025	GO-147	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	[GO180] Relatório Financeiro - Set a Nov - 2025	GO-180	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	[GO461] Relatório Financeiro - Out a Dez - 2025	GO-461	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	GO147 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Nov	GO-147	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	GO147 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Out	GO-147	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	GO147 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Set	GO-147	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	GO180 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Nov	GO-180	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	GO180 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Out	GO-180	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	GO180 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Set	GO-180	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	GO461 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Dez	GO-461	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	GO461 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Nov	GO-461	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	GO461 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Out	GO-461	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	4.2. Financeiro Carteira - Sala de Situação	Geral	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	4.2. Financeiro Obras - Sala de Situação	Geral	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	4.2. Financeiro Repasses - Sala de Situação	Geral	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°11 - 01.05.26 31.05.26	Geral	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO178A	GO-178A	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO147	GO-147	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO180	GO-180	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO461	GO-461	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - Programa	Geral	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO178A	GO-178A	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO147	GO-147	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO180	GO-180	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO461	GO-461	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - Programa	Geral	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°11 - 01.05.26 31.05.26	Geral	31/05/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo I - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - controle de recebimento e arquivamento de documentos e informações relevantes para a gestão contratual no período de recorte	Geral	31/05/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo II - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - perguntas aos responsáveis no período de recorte	Geral	31/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-131.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	01/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-132.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	01/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-098.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	03/06/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Relatório Grupo 1 - Relatório Mensal N°11	Relatório Mensal	Relatório Mensal da Entrega de Produtos de Maio	Geral	07/06/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Timeline de Acompanhamento Macro até maio 2026	Outros	Timeline de Coordenação de Pontos Macros	Geral	07/06/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Dashboard da Análise de Entrega de Produtos - maio	Outros	Dashboard Mensal de Análise de entregas CAEP	Geral	07/06/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Controle de Entrega de Produtos de maio	Outros	Planilha do Gerenciamento de entregas Mensal	Geral	07/06/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de maio	Outros	Planilha com o Quadro Financeiro Mensal	Geral	07/06/2026	Entregue

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de maio	Outros	Planilha com o Quadro Financeiro Mensal	Geral	07/06/2026	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	P1.2 - Controle de Reuniões do mês de	Outros	Planilha do Controle de Reuniões	Geral	07/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-008.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-461	08/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-009.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-147	08/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-009.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-180	08/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-009.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	08/06/2026	Entregue
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	RL-P3.1-BI008-RGC-001	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Gestão da Certificação	Geral	09/06/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.05 - GO-180	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-180	09/06/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.05 - GO-178A	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-178A	09/06/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.05 - GO-147	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-147	09/06/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.05 - GO-461	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-461	09/06/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 11	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a maio de 2026	Geral	N/A	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	P5.3 - Relatório de Gestão Contratual	Relatório Técnico	Relatório de Gestão Contratual referente às obras em andamento no período de recorte	Geral	N/A	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	POP-007.1	Procedimento Operacional Padrão	Procedimento Operacional Padrão Fiscalização e Gestão Ambiental.	Geral		Em elaboração
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	POP-008.1	Procedimento Operacional	Procedimento Operacional Padrão Fiscalização em Segurança do	Geral		Em
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Parecer	Carta 012-2026 Carta CAEP aditivo contratual_v1assinado	Geral	31/05/2026	Entregue

- Dashboard Analítico das Entregas Executadas em maio.

O painel analítico de entregas apresenta uma visão consolidada do desempenho do CAEP no mês de maio de 2026, permitindo à Coordenação Geral Executiva acompanhar, de forma sintética e visual, os principais indicadores de produção e o comportamento das frentes de trabalho ao longo do período. A ferramenta reúne informações essenciais para a gestão contratual, como o volume total de produtos emitidos, o percentual de execução, a distribuição por status, a participação das empresas consorciadas e o comparativo entre as frentes técnicas, jurídicas, administrativas e de governança.

No período, foram registrados 218 produtos, dos quais 216 (99%) foram efetivamente entregues e apenas 2 (1%) permaneciam em elaboração, conforme demonstrado no dashboard consolidado. Os indicadores evidenciam um desempenho altamente satisfatório e representam um crescimento significativo em relação ao mês anterior, refletindo a intensificação das atividades de acompanhamento técnico, gestão contratual e monitoramento dos empreendimentos.

A distribuição por frentes de atuação indica a predominância da área de Gestão de Engenharia, Meio Ambiente e Desapropriação, responsável por 152 documentos, seguida por Gestão de Projetos e Contabilidade, com 40 entregas, Assessoramento e Consultoria Jurídica, com 11, Coordenação Executiva, com 10, e Certificação de Projetos e Obras, com 5 documentos. Essa configuração reforça o caráter multidisciplinar da atuação do CAEP e demonstra a forte concentração das atividades nas frentes técnicas de engenharia, fiscalização e acompanhamento operacional das obras.

No recorte por empresa, observa-se a liderança da Dynatest, com 158 produtos entregues, seguida pela A&M Infra, com 44, pela Manesco, com 11, e pelo Bureau Veritas, com 5 documentos. A distribuição evidencia a predominância das atividades técnicas e operacionais conduzidas pela equipe de engenharia, ao mesmo tempo em que confirma a integração entre as áreas de governança, assessoramento jurídico, gestão financeira e certificação independente.

A análise temporal demonstra que a produção esteve distribuída ao longo de todo o mês de maio, com picos expressivos de emissão especialmente nos dias 25 e 31, destacando-se este último como o dia de maior volume de entregas do período, com 46 documentos registrados. Esses momentos de maior concentração refletem a consolidação de relatórios de acompanhamento de obras, notas técnicas, pareceres técnicos, documentos jurídicos, relatórios financeiros e instrumentos de gestão associados ao fechamento dos ciclos semanais e mensais de controle e prestação de contas.

O dashboard fortalece o papel da Coordenação Geral Executiva ao viabilizar uma visão integrada e transparente das entregas, apoiando a prestação de contas à GOINFRA, ao IFAG e aos órgãos de controle. A centralização das informações permite monitorar prazos, avaliar o desempenho das frentes de trabalho, identificar tendências operacionais e antecipar pontos de atenção, contribuindo diretamente para a tomada de decisões estratégicas e para a mitigação de riscos.

Assim, apresenta-se o painel atualizado de análise das entregas do CAEP referente ao mês de maio de 2026, elaborado a partir da consolidação dos dados da planilha de controle e dos registros produzidos pelas empresas consorciadas. A visualização evidencia a manutenção de elevado desempenho produtivo no período, reafirmando a capacidade do consórcio de operar com eficiência, rastreabilidade e governança na execução de suas responsabilidades contratuais.

CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Dashboard: Análise de Entregas CAEP


216
Entregues

218
Total

Tipos de Produtos Entregáveis

- ☐ 1.1 COORDENAÇÃO GERAL
- ☐ 1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
- ☐ 1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL
- ☐ 1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES
- ☐ 2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- ☐ 2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO
- ☐ 2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO
- ☐ 3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO
- ☐ 3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
- ☐ 4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO
- ☐ 4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL
- ☐ 4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE
- ☐ 5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO
- ☐ 5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL

Produtos X Entrega

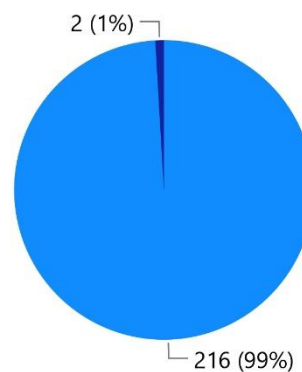


● Entregue ● Em elaboração


Quantidade de Documentos por Frente

	n°
Gestão de Engenharia, Meio Ambiente e Desapropriação	152
Gestão de Projetos e Contabilidade	40
Assessoramento e Consultoria Jurídica	11
Coordenação Executiva	10
Certificação de Projetos e Obras	5

Produtos por Empresa

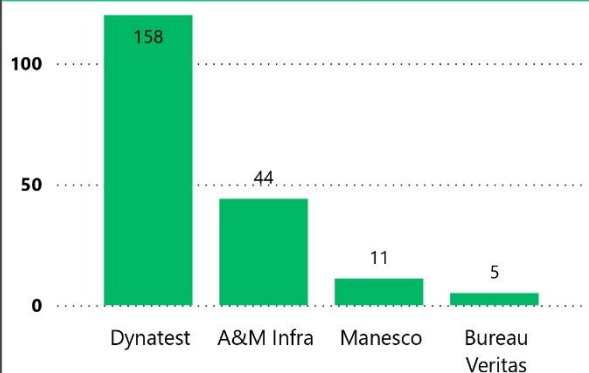

Controle de produtos mensal

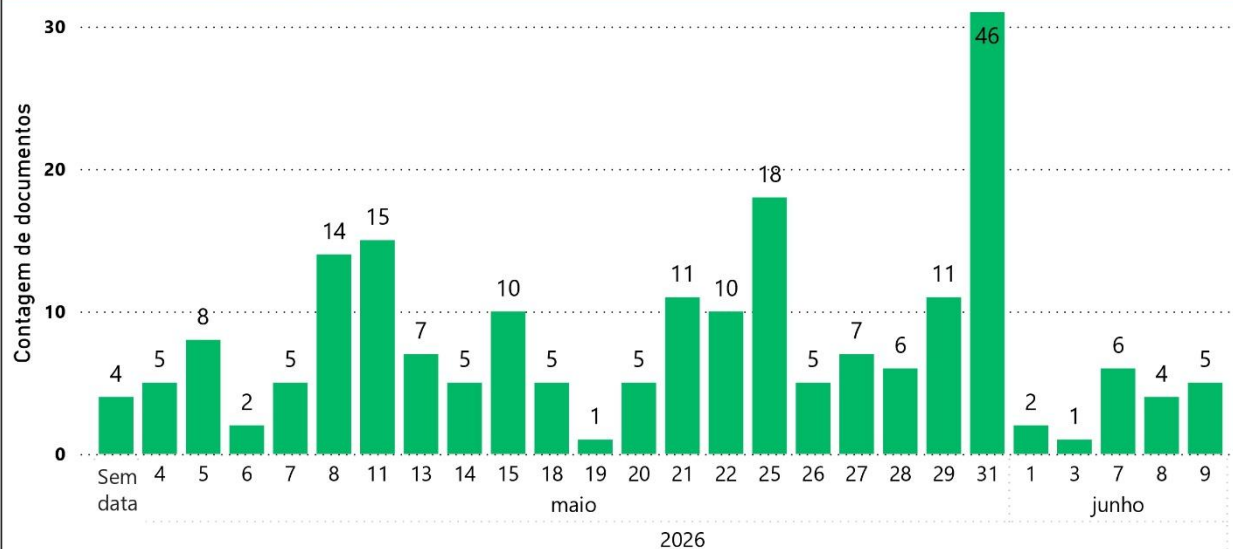

- Linha do Tempo do Progresso das Atividades Executadas em maio de 2026

O mês de maio de 2026 caracterizou-se pela continuidade das atividades de acompanhamento, monitoramento e controle dos empreendimentos vinculados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA, sob coordenação do Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP). Embora não tenham sido registrados novos marcos estruturantes relacionados à publicação de empreendimentos, recebimento ou julgamento de propostas, emissão de licenças ambientais ou início de novas frentes de execução, o período foi marcado pela efetivação de importantes etapas de natureza financeira e contratual associadas às obras em andamento.

Nesse contexto, destacam-se os pagamentos das medições referentes ao primeiro trimestre de execução dos contratos, realizados por intermédio do IFAG, contemplando a rodovia GO-180 em 6 de maio, correspondente aos serviços executados entre setembro e novembro de 2025; a rodovia GO-461 em 8 de maio, referente ao período compreendido entre outubro e dezembro de 2025; e a rodovia GO-147 em 12 de maio, relativa aos serviços executados entre setembro e novembro de 2025. Esses pagamentos representam marcos relevantes para a manutenção do fluxo financeiro dos contratos e refletem a regular evolução dos serviços executados, observados os procedimentos de medição, conferência, certificação e aprovação estabelecidos no âmbito do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA.

Durante o período, o CAEP manteve sua atuação voltada à coordenação das atividades de monitoramento técnico, administrativo, financeiro, jurídico e socioambiental, acompanhando a tramitação dos processos de medição, a conformidade documental e o alinhamento entre os agentes envolvidos na execução dos empreendimentos. As ações desenvolvidas contribuíram para assegurar a regularidade dos desembolsos e a aderência dos contratos aos instrumentos de governança e controle adotados pelo FUNDEINFRA.


Esse cenário demonstra que o programa permanece em uma fase de execução consolidada, na qual os esforços institucionais concentram-se no acompanhamento do desempenho físico e financeiro das obras, na mitigação de riscos e na garantia da conformidade contratual e administrativa dos empreendimentos em execução.

Assim, a linha do tempo de maio de 2026 evidencia um período de estabilidade institucional e operacional, no qual os principais registros estão associados à gestão financeira dos contratos em andamento. A efetivação dos pagamentos das medições trimestrais reforça a continuidade da execução das obras e reafirma o papel do CAEP como instância técnica responsável pela integração das frentes de trabalho, pelo acompanhamento dos processos e pela transparência na condução dos empreendimentos estruturantes do Estado de Goiás.

Timeline




Timeline

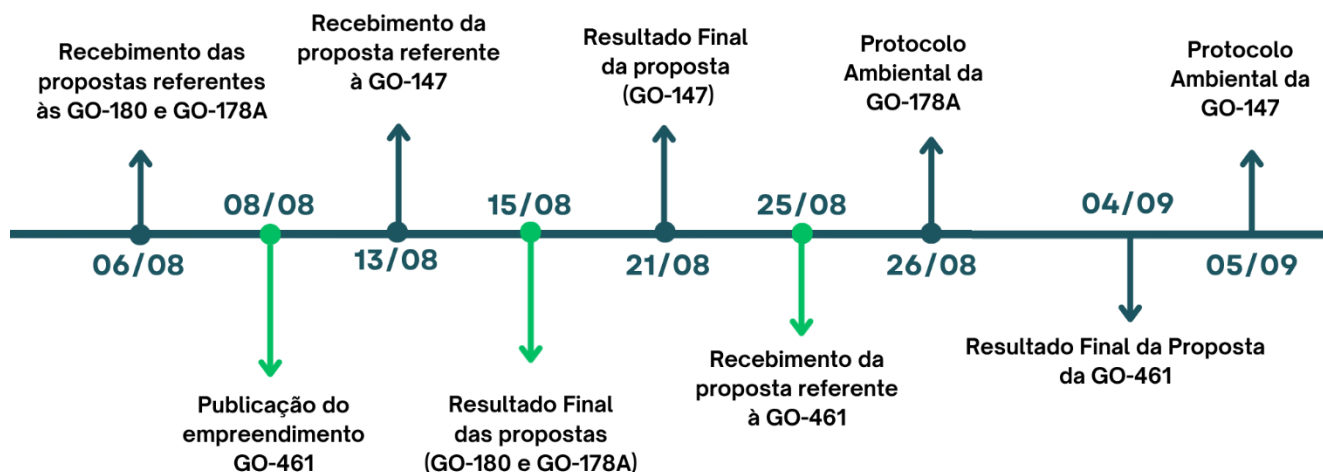




Progresso das atividades executadas [Setembro/2025]

Timeline

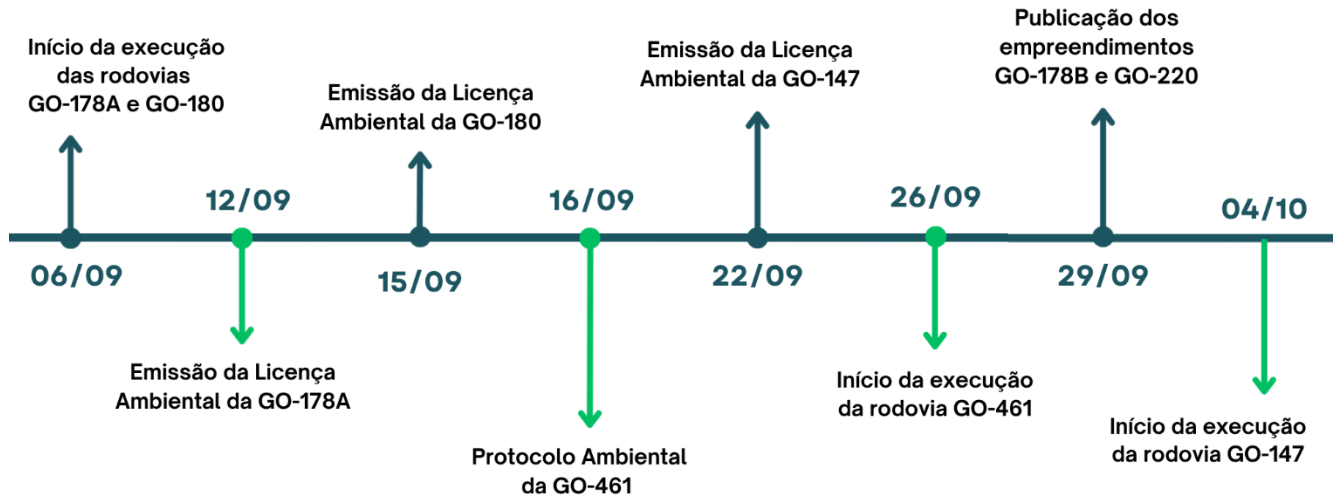

Progresso das atividades executadas [Outubro/2025]


Timeline

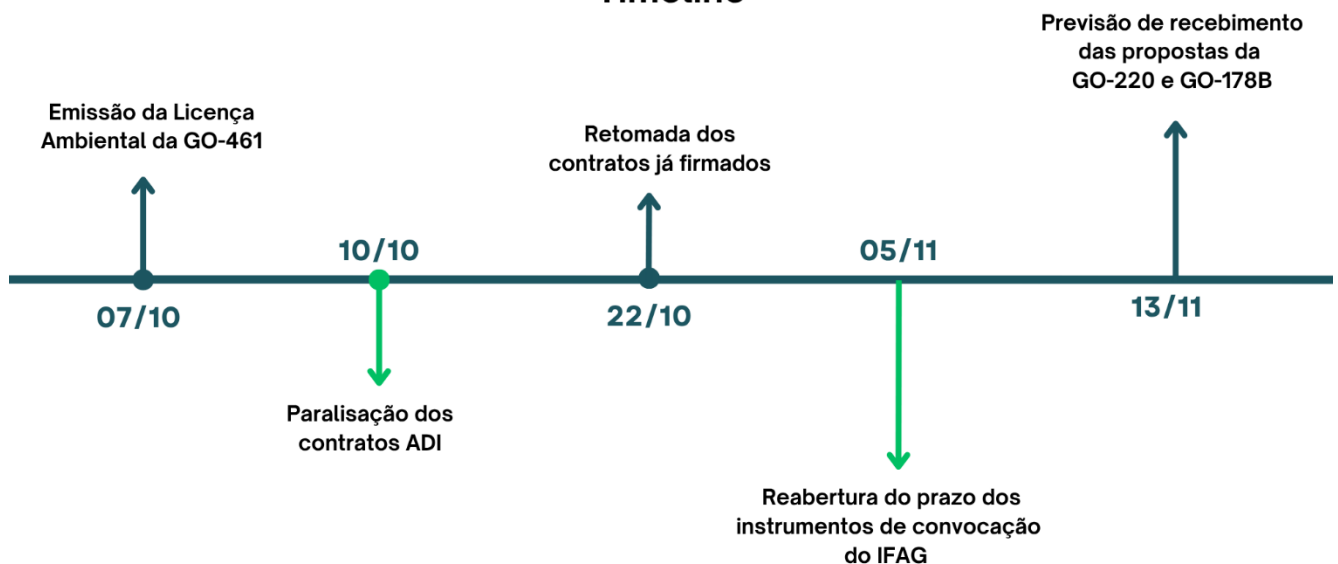




Progresso das atividades executadas [Novembro/2025]

Timeline



Progresso das atividades executadas [Dezembro/2025]

Timeline

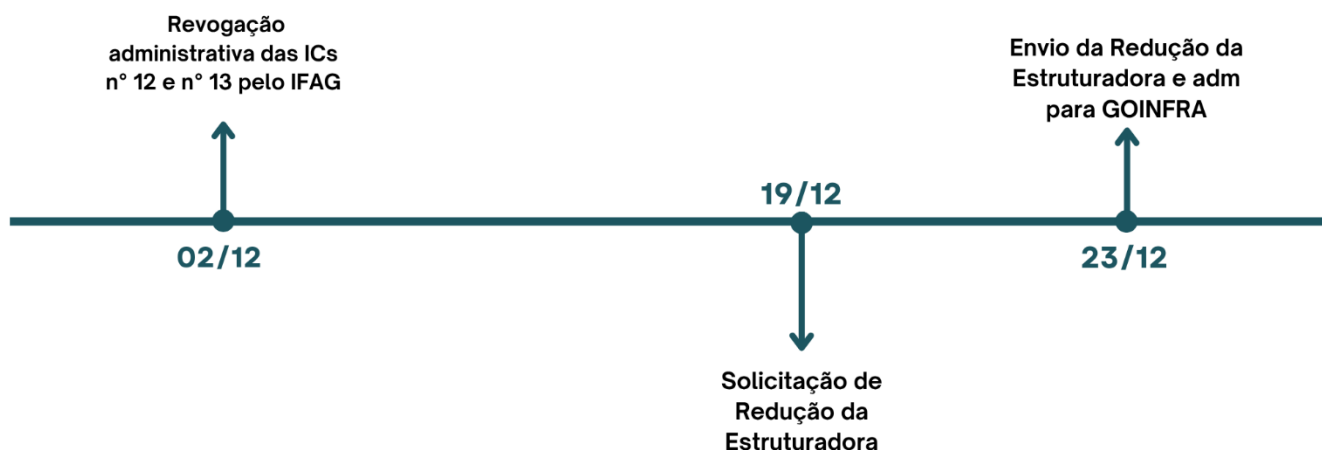




Progresso das atividades executadas [Janeiro/2026]

Timeline



Progresso das atividades executadas [Fevereiro/2026]


Timeline

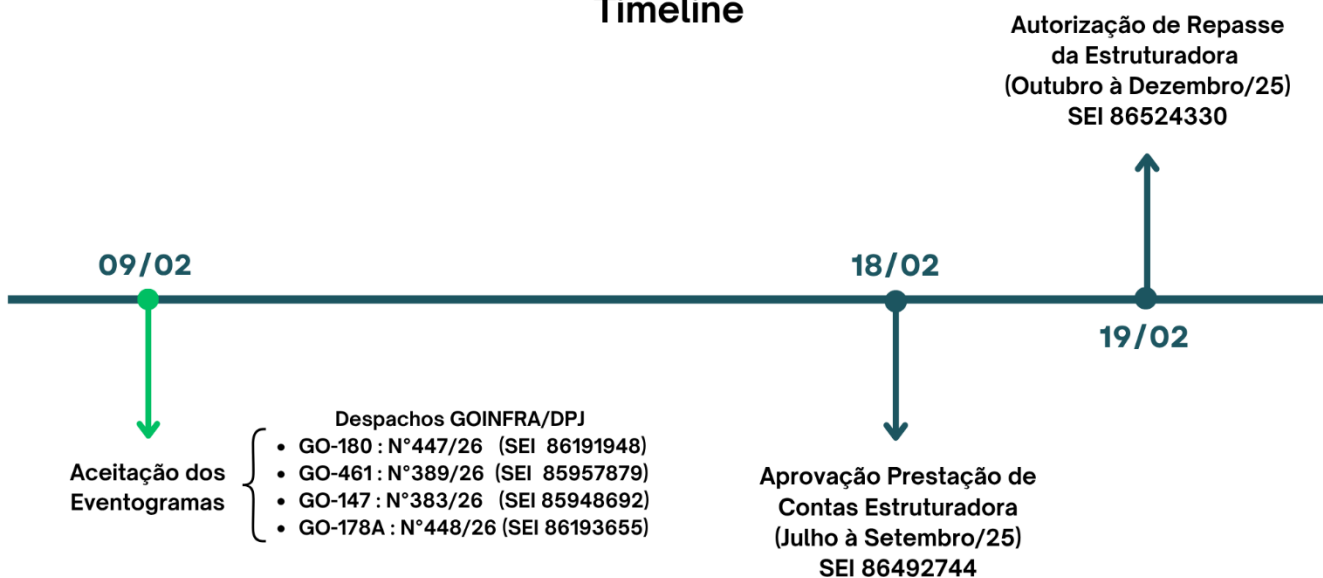




Progresso das atividades executadas [Março/2026]

Timeline

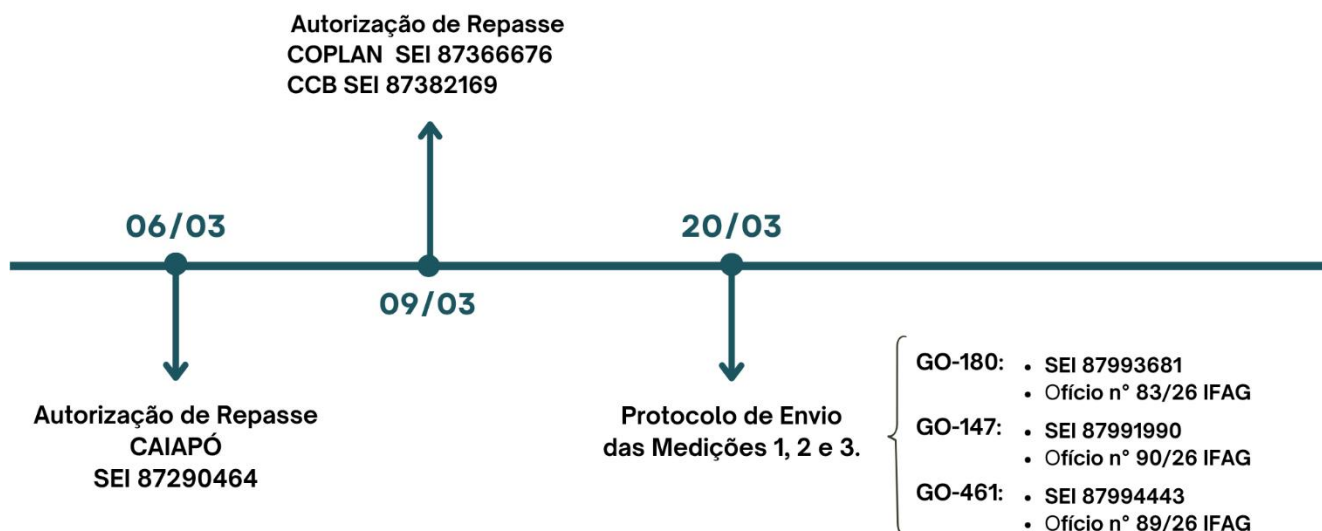

Progresso das atividades executadas [Abril/2026]

Timeline

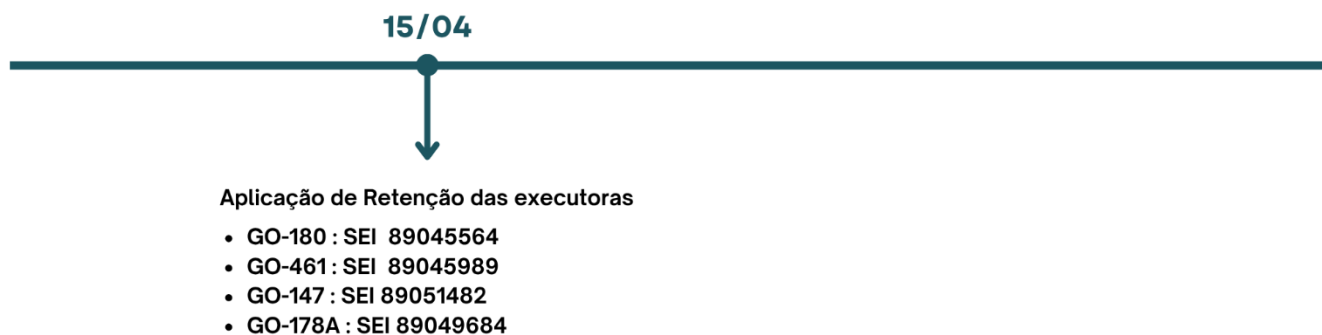

Timeline



- Reuniões de Governança realizadas durante o mês de maio.

Durante o mês de maio, as reuniões de governança do Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP) concentraram-se no fortalecimento dos mecanismos de controle técnico, contratual e financeiro do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA, com ênfase na certificação de projetos e obras, na gestão de não conformidades e na consolidação dos fluxos de governança entre IFAG, GOINFRA, empresas executoras, certificadora e consórcio estruturador. A Coordenação Executiva manteve sua atuação como instância integradora entre os diversos agentes envolvidos, promovendo alinhamento institucional e padronização dos processos de tomada de decisão.

As agendas internas de governança do CAEP concentraram-se na estruturação documental dos empreendimentos, no aperfeiçoamento dos fluxos de certificação, na revisão de responsabilidades entre as equipes envolvidas e na reorganização dos processos de acompanhamento dos projetos. Também foram discutidos temas relacionados ao Produto 1.3, à revisão de aditivos contratuais e à definição de fluxogramas operacionais.

No âmbito técnico-operacional, as reuniões com a Dynatest tiveram como foco principal a situação dos projetos das rodovias GO-180, GO-147, GO-178 e demais empreendimentos em andamento, com destaque para os impactos decorrentes de atrasos em disciplinas críticas, especialmente geotecnia, hidrologia, drenagem e desapropriações. Foram discutidos riscos associados ao avanço das obras sem aprovação definitiva dos projetos, limitações para certificação, necessidade de emissão de circulares e notificações preventivas, além da adoção de mecanismos de controle para evitar pagamentos e medições desvinculados da conformidade técnica exigida contratualmente.

As reuniões com a Bureau Veritas aprofundaram as discussões sobre não conformidades de execução, riscos de certificação e responsabilidades das executoras quanto à qualidade dos projetos e serviços

executados. Foram debatidos casos de execução de obras sem documentação executiva completa, divergências de interpretação contratual relativas aos limites de avanço físico sem projetos aprovados e necessidade de adoção de medidas graduais de controle, incluindo notificações, advertências e eventuais sanções administrativas. Também foram alinhados procedimentos para consolidação de evidências técnicas e fortalecimento da atuação da certificadora como instância independente de validação dos empreendimentos.

As agendas com a Alvarez & Marsal concentraram-se na governança financeira do programa, incluindo prestação de contas, validação de medições, acompanhamento dos riscos financeiros e consolidação de relatórios gerenciais. Foram discutidos mecanismos de rastreabilidade de solicitações, repasses e alterações contratuais, além do aperfeiçoamento dos painéis de monitoramento e integração de informações físicas e financeiras. Destacou-se também a busca por ferramentas que permitam maior automação e transparência dos controles, reduzindo riscos operacionais e fortalecendo a capacidade de acompanhamento do portfólio de obras.

Em paralelo, as reuniões com a Manesco tiveram como foco a reprogramação das atividades do consórcio, a redistribuição formal de responsabilidades entre IFAG, GOINFRA, consórcio e executoras, bem como a elaboração de documentos voltados à definição dos fluxos institucionais e das responsabilidades de cada agente. As discussões buscaram fortalecer a segurança jurídica dos processos, assegurar maior clareza na governança contratual e promover alinhamento prévio entre os órgãos envolvidos antes da formalização dos encaminhamentos.

Em síntese, maio foi marcado pelo aprofundamento das discussões relacionadas à certificação, conformidade contratual, gestão de riscos e controle das medições, evidenciando a necessidade de maior integração entre os processos de projeto, execução e fiscalização das obras. As reuniões realizadas no período reforçaram a governança do programa, ampliaram a rastreabilidade das decisões e contribuíram para o fortalecimento dos mecanismos de controle técnico, financeiro e institucional necessários à adequada condução dos empreendimentos vinculados ao FUNDEINFRA.


CAEP Controle de Reuniões			CAEP
Data	Participantes	Assuntos	
07/05/2026	Representantes CAEP: Dynatest, Bureau Veritas, Alvarez & Marsal e Manesco	Reunião de Governança CAEP - pauta: Medição e não conformidades; Estruturação documental e PMO; Histórico, divisão de conteúdo e responsabilidades; Produto 1.3 e revisão do aditivo; Avaliação dos estudos e repositório de projetos; Alteração de materiais, riscos e apoio jurídico; Definição de fluxos para Goinfra e certificação.	
08/05/2026	Dynatest: Victor Castro CAEP: Alex Pineli IFAG: Sérgio Borges e Eliseu Garcia	Reunião de Governança IFAG e Dynatest - resumo ata: A reunião tratou do status de projetos (Caiaipó, CCL, CCB, Coplan) e das implicações da qualidade dos entregáveis sobre as frentes de obra e pagamentos contratuais. No projeto Caiaipó (trecho 180) foram discutidas as disciplinas DUP, Hidrologia, Geotecnia e Projeto Geométrico: hidrologia/drenagem obteve aprovação que permitiu avanços, mas a geotecnia (identificada como gargalo) está na quarta revisão (entregue em 24/4) com inconsistências em ensaios e boletins fotográficos que podem levar à reprovação. A equipe reportou que a construtora já executa cerca de 20 km de terraplenagem sem geotecnia aprovada, colocando em risco atingir 50% do valor global do contrato sem projeto de terraplenagem aprovado. O geométrico será analisado preliminarmente, condicionado à coerência com sondagens e correções geotécnicas. Sobre CCL e CCB, a geotecnia da CCL apresentou problemas semelhantes e a drenagem teve aprovação com ressalva quantitativa, com avaliação em curso sobre compensações orçamentárias e quantitativas. A CCB apresentou entregas incompletas e baixa qualidade técnica recorrente, incluindo disciplinas como desapropriação; a equipe sugeriu notificação mais dura à contratada e possível advertência formal se não houver melhora até a semana seguinte. A Coplan foi elogiada pela qualidade relativa da documentação e retomada de entregas, com avaliações prévias já encaminhadas para DUP e geométrico. Foram mencionadas limitações operacionais: sem aprovação final da geotecnia não é possível concluir análises finais de terraplenagem e pavimentação, mesmo com partes do viário já entregues. Em campo, Caiaipó retomou forte terraplenagem em ~20 km, CCL avançou em drenagem e montagem de bueiros, e as variações de terraplenagem reportadas (~10 cm) não impactam o projeto de forma expressiva.	
08/05/2026	Bureau Veritas: Vinicius Coutinho e Ciro Sampaio CAEP: Alex Pineli IFAG: Sérgio Borges e Eliseu Garcia	Reunião de Governança IFAG e BV - resumo ata: A reunião tratou da situação das obras sob responsabilidade do IFAG, com foco em não conformidades de execução sem projeto executivo adequado, interpretações contratuais controversas e o papel do consórcio e da certificadora na garantia técnica e na mitigação de riscos jurídicos. Participantes discutiram avanços na interlocução com Goinfra e sinais favoráveis de manutenção das obras sob IFAG. Foi debatida em detalhe a redação controversa da cláusula que permitiria até 50% da obra sem entrega total dos projetos, cuja interpretação ambigua tem permitido início de serviços com anteprojetos incompletos. Foram relatadas várias não conformidades práticas: drenagens e bueiros executados fora de normas técnicas, omissões contratuais (por exemplo, especificação de aço ausente na CPU) e práticas locais que substituem projeto por orçamentos locais. A equipe enfatizou que a construtora é responsável pela qualidade e deve produzir estudo de abrangência, análise de causa raiz e plano de ação para cada não conformidade; a fiscalização, supervisão e certificadora são garantias de terceiros, sem eximir responsabilidades da empreiteira. Discussões sobre normas e revisão normativa destacaram o risco de pleitos por aumento de custo caso seja imposta versão normativa posterior à vigente na licitação; ficou claro que a decisão sobre qual revisão aplicar compete aos contratantes (IFAG/Goinfra) e que é possível validar normas estrangeiras desde que cálculos comprovem a solução. Por fim, acordou-se que a certificadora prestará análises independentes e haverá consolidação técnica entre equipes para apoiar avaliações e respostas técnicas frente a executoras e para gerar evidências formais de descumprimentos contratuais.	
08/05/2026	A&M: Walter Schneider e Igor Ferreira CAEP: Alex Pineli IFAG: Sérgio Borges, Joberth Bernazzoli e Eliseu Garcia	Reunião de Governança IFAG e A&M - resumo ata: A reunião tratou de status de relatórios financeiros, validação de medições e alinhamento de governança de riscos para as obras do programa. Foram apresentados progresso em publicações visuais, atualização de portfólio e consolidação de relatórios contábeis, com importação de riscos na plataforma IRIS e geração de relatórios de situação. Nos controles financeiros, a equipe enfatizou a necessidade de formalização e rastreabilidade de pedidos, repasses e alterações (ex.: cronogramas, pedidos de repasse, lançamentos manuais de taxas e reembolsos). Foi debatida a preferência por comunicações por e-mail para reduzir erro humano, o uso do Drive como registro complementar e a sugestão de automatizar check-ins semanais (possível uso de IA) para registrar movimentações sem burocratizar.	
08/05/2026	IFAG: Sérgio Fonseca Manesco: Daniel Esteves, Ludmilla Ribeiro, Gabriel Schroeder, Antônio Gonçalves, Lucas Saraiva. CAEP: Alex Pineli	Reunião de Governança IFAG e Manesco: A reunião tratou da reprogramação do consórcio e da formalização da redistribuição de responsabilidades entre Goinfra, IFAG, consórcio e executoras, com foco em documentos que detalham status e fluxos. Foram discutidos prazos, necessidade de revisão interna e alinhamento antes de encaminhamentos formais. O consórcio informou que está elaborando dois documentos: um relatório de status das obras e contratos e outro detalhando fluxos e responsabilidades. Álvares & Marsal lideram a confecção desses documentos, que o consórcio pretende revisar internamente antes do envio ao IFAG; a previsão é que estejam prontos por volta de terça-feira, com ressalva sobre a necessidade de tempo para garantir qualidade e alinhamento prévio com a Goinfra.	

CAEP Controle de Reuniões			CAEP
Data	Participantes	Assuntos	
14/05/2026	Representantes CAEP: Dynatest, Bureau Veritas, Alvarez & Marsal e Manesco	Reunião de Governança CAEP - pauta: Ausência do Alex e transição de responsabilidades; Compartilhamento de documentos e fluxogramas; Debate técnico - plano de trabalho versus eventograma; Checkpoints, prioridades e alinhamento de fluxos; Documentos de contexto, histórico e prestação de contas; Advertência do IFAG e histórico com a CCL; Execução de bueiros sem armação e necessidade de avaliação técnica; Aceleração das obras, segurança e supervisão; Falta de cronogramas e impacto nas inspeções e certificação; Responsabilidades operacionais, certificação e uso da matriz RACI; Proposta de reunião para mapear programação e gaps; Detalhamento da apresentação por empreendimento; BV - Inspeção do cumprimento contratual e itens omissos.	
15/05/2026	Dynatest: Victor Castro CAEP: Edson Shimizu IFAG: Sérgio Borges e Eliseu Garcia	Reunião de Governança IFAG e Dynatest - resumo ata: A reunião tratou de alinhamentos operacionais e de governança contratual relacionados a projetos e obras, com foco em atrasos técnicos, necessidade de certificação e medidas documentais para mitigar riscos. Foram levantados riscos de execução e conformidade: avanço rápido da frente de terraplenagem pode levar ao atingimento de indicadores (50%) sem aval executivo, motivando proposta de emitir uma circular de alerta em vez de notificação imediata para criar documentação de acompanhamento; Edson comprometeu-se a tratar com o escritório Manesco e preparar minuta estrutural de circular. Na CCB existe risco de alteração de cronograma por pagamentos irregulares a projetistas, ausência de disciplinas básicas (geologia) e pendência de atualização de licença ambiental, o que coloca em alerta a necessidade de notificações formais caso ocorram intervenções em trechos não licenciados. Em gestão contratual e financeira, a equipe identificou ausência de mecanismo que vincule pagamento à certificação da obra (diferente do projeto, que tem evento de certificação no eventograma). Eliseu mencionou alternativas como doação da obra, certificação por medição e uso de cláusulas de seguro-garantia para retenção; Sérgio destacou que falta de certificação configura descumprimento contratual passível de multa e defendeu exigir certificação nas entregas e segurar pagamentos até conformidade. A equipe concordou sobre a necessidade de correção contratual e gestão robusta com evidências e notificações reiteradas para viabilizar ações administrativas futuras.	
15/05/2026	Bureau Veritas: Vinicius Coutinho e Ciro Sampaio CAEP: Edson Shimizu IFAG: Sérgio Borges e Eliseu Garcia	Reunião de Governança IFAG e BV - resumo ata: A reunião tratou do avanço de obras sem documentação executiva completa e do risco iminente de não certificação dos empreendimentos, com debate sobre responsabilidades contratuais, fiscalização e medidas punitivas. Participantes concordaram na necessidade de ação coordenada do consórcio e do IFAG para garantir conformidade documental e técnica. Houve consenso sobre conflito de autoridade entre Goinfra (pressão por entrega rápida) e IFAG (requisitos de certificação), com riscos de obras avançarem sem acompanhamento técnico. Foi discutida a entrada de segundo turno sem formalização. Medidas propostas incluíram emissão colaborativa de circular enumerando deficiências e alertando sobre penalidades, institucionalização de reuniões de acompanhamento com atas para evidenciar cobranças, criação de pontos focais por empresa para apoio a notificações, e formatação de apresentação/gráfico situacional do progresso por obra. Houve apoio à adoção de medidas punitivas graduais (notificação, advertência, multa, paralisação) caso documentação contratual não seja regularizada.	
15/05/2026	A&M: Walter Schneider e Igor Ferreira CAEP: Edson Shimizu IFAG: Sérgio Borges, Joberth Bernazzolli e Eliseu Garcia	Reunião de Governança IFAG e A&M - resumo ata: A reunião tratou da finalização da prestação de contas, da metodologia dos relatórios e dos riscos de execução financeira em obras, com foco nas divergências entre avanço físico e financeiro e na necessidade de controles e responsabilização das construtoras. Foi confirmada a postergação da publicação do acompanhamento visual para a semana do dia 18 devido às adequações nas prestações solicitadas pelo IFAG, sem prejuízo ao total mensal de publicações. Quanto a controles e ferramentas, Igor apresentou a intenção de produzir um one-page com controles macro para acompanhamento semanal, com protótipo previsto para a semana seguinte e participação da Dynatest e A&M. Eliseu sugeriu simplificar demonstração de avanço físico usando diagrama unifilar e dados de BI; propôs reunião com Edson e Igor para demonstrar a base integrada. Joberth pediu que relatórios e baselines indiquem versões para evidenciar a evolução documental.	
21/05/2026	Representantes CAEP: Dynatest, Bureau Veritas, Alvarez & Marsal e Manesco	Reunião de Governança CAEP - pauta: Apresentação da reunião com a GOINFRA e proposta de procedimento; Alinhamento operacional, minuta do circular e ênfase em certificação; Reposicionamento da certificação e organização de players; Suspensão dos FUPs com o IFAG; Pendências operacionais e prestação de contas do 1º trimestre; Reprogramação, aditivo do produto 2.4 e fluxogramas da RACI; Posicionamento da certificadora sobre não conformidade.	

- Análise do processo de medição do mês anterior - maio/2026 - 10ª medição.

A medição foi estruturada sob a lógica formal de avaliação por produto, com base em critérios previamente definidos pela fiscalização, os quais consideram, de forma ponderada, a qualidade do atendimento e da equipe técnica, a qualidade da documentação e dos relatórios, bem como a conformidade com os prazos, convertendo o resultado avaliativo em parâmetro de pagamento dos serviços efetivamente comprovados. Tal sistemática reforça a robustez do processo de medição, assegura transparência, uniformidade de critérios e maior segurança institucional quanto à regularidade da despesa.

QUADRO FINANCEIRO CONSOLIDADO — 10ª MEDIÇÃO					
Contrato n.º 01/2025 Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos – CAEP					
Data de Assinatura do Contrato: 10/07/2025 Vigência: 36 meses			Referência: 10ª Medição – Maio/2026		
Valor Total do Contrato	Valor Acumulado Medido	Valor da 10ª Medição	Saldo Contratual	% Acumulado Executado	Valor Inicial do Contrato
R\$ 21.912.482,34	R\$ 7.993.824,17	R\$ 538.089,55	R\$ 13.918.658,18	36,48%	R\$ 36.179.265,65

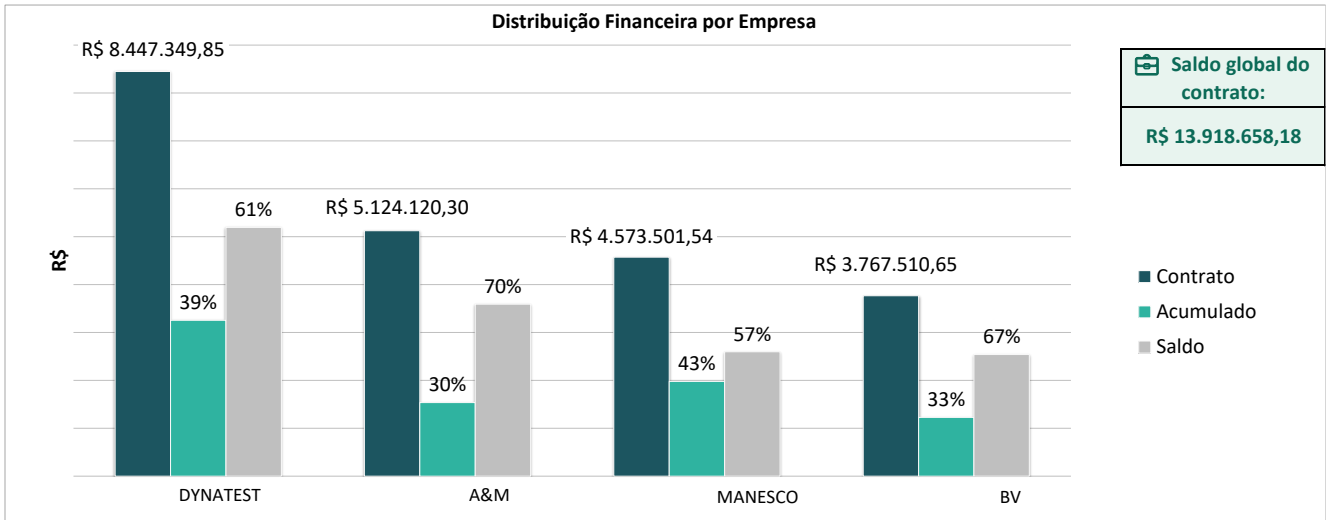

⚠ OBSERVAÇÃO SOBRE ADITIVO CONTRATUAL
Os valores apresentados a partir da 7ª medição consideram a readequação dos preços e quantitativos proposto na minuta do termo aditivo contratual.

RESUMO FINANCEIRO POR EMPRESA — 10ª MEDIÇÃO						
Empresa	Valor Mês	Valor Acumulado	Valor Contrato	% Executado	Saldo	Status
DYNA	R\$ 221.476,39	R\$ 3.253.213,50	R\$ 8.447.349,85	38,51%	R\$ 5.194.136,35	Processado
A&M	R\$ 112.199,28	R\$ 1.535.047,06	R\$ 5.124.120,30	29,96%	R\$ 3.589.073,24	Processado
MANESCO	R\$ 83.147,47	R\$ 1.978.281,31	R\$ 4.573.501,54	43,26%	R\$ 2.595.220,23	Processado
BV	R\$ 121.266,41	R\$ 1.227.282,30	R\$ 3.767.510,65	32,58%	R\$ 2.540.228,35	Processado
TOTAL	R\$ 538.089,55	R\$ 7.993.824,17	R\$ 21.912.482,34	36,48%	R\$ 13.918.658,18	

Sob a perspectiva físico-financeira, a 10ª medição totaliza R\$ 538.089,55, elevando o montante acumulado medido para R\$ 7.993.824,17, frente ao valor global contratual de R\$ 21.912.482,34, o que corresponde a 36,48% de execução acumulada do contrato.

RESUMO FINANCEIRO POR EMPRESA — 10ª MEDIÇÃO				
Contrato n.º 01/2025 CAEP Referência: Maio/2026				
Empresa	Valor Mês	Valor Acumulado	% Executado	Saldo Contratual
DYNA	R\$ 221.476,39	R\$ 3.253.213,50	38,51%	R\$ 5.194.136,35
A&M	R\$ 112.199,28	R\$ 1.535.047,06	29,96%	R\$ 3.589.073,24
MANESCO	R\$ 83.147,47	R\$ 1.978.281,31	43,26%	R\$ 2.595.220,23
BV	R\$ 121.266,41	R\$ 1.227.282,30	32,58%	R\$ 2.540.228,35
TOTAL	R\$ 538.089,55	R\$ 7.993.824,17	36,48%	R\$ 13.918.658,18

No que se refere ao desempenho técnico das entregas reconhecidas na competência, verifica-se que os produtos efetivamente medidos foram recebidos com **avaliação integral para fins de pagamento**, não havendo, no conjunto dos itens faturados na **10ª medição**, ocorrência de redutor financeiro aplicado por insuficiência técnica da entrega. Os produtos medidos no período foram expressamente registrados com **nota avaliativa de 100,00%**, a exemplo dos Produtos 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 5.1 e 5.3, evidenciando aderência ao escopo contratual, suficiência documental e regularidade para reconhecimento financeiro na competência. Registra-se, ainda, que o **Produto 1.3 - Comunicação Social** permaneceu sem medição, em consonância com a lógica de supressão já refletida na planilha financeira, ao passo que outros produtos sem fato gerador ou sem materialidade de medição no período também não repercutiram financeiramente. Do ponto de vista financeiro e de governança da medição, o conjunto dos itens reconhecidos demonstra conformidade satisfatória, sem indicativo de glosa técnica ou de necessidade de adoção de redutor sobre os valores medidos no período.

BASE TÉCNICA - PLANILHA DE MEDIÇÃO IFAG (10ª MEDIÇÃO)									
ID	Produto	Unidade	Valor Unit.	Valor Contrato	% Acum.	Qntd.	Valor Final	Valor Acum.	Empresa
1.1	COORDENAÇÃO GERAL	MENSAL	R\$ 59.212,49	R\$ 2.095.854,28	34,43%	1,00	R\$ 59.212,49	R\$ 674.754,55	DYNA
1.2	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	MENSAL	R\$ 8.503,60	R\$ 615.391,05	73,41%	1,00	R\$ 8.503,60	R\$ 411.304,65	DYNA
1.3	COMUNICAÇÃO SOCIAL	MENSAL	R\$ 28.778,99	R\$ 180.720,54	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 180.720,54	A&M
1.4	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	MENSAL	R\$ 23.940,25	R\$ 872.086,22	36,59%	1,00	R\$ 23.940,25	R\$ 297.520,22	A&M
2.1	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	MENSAL	R\$ 58.407,02	R\$ 2.001.747,91	31,93%	1,00	R\$ 58.407,02	R\$ 599.979,51	DYNA
2.2	ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	POR OBRA	R\$ 116.110,78	R\$ 851.091,98	36,15%		R\$ 0,00	R\$ 307.693,53	DYNA
2.3	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LIC	POR OBRA		R\$ 109.380,60	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 109.380,60	DYNA
2.4	GERENCIAMENTO TÉCNICO	OBRA x MÊS	R\$ 23.838,32	R\$ 2.288.478,72	32,99%	4,00	R\$ 95.353,28	R\$ 702.076,67	DYNA
2.5	RECEBIMENTO DE OBRA	POR OBRA	R\$ 9.345,33	R\$ 37.381,32	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	DYNA
2.6	LICENÇA AMBIENTAL	POR OBRA		R\$ 448.023,99	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 448.023,99	DYNA
3.1	RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	MENSAL	R\$ 47.233,29	R\$ 1.775.628,33	38,89%	1,00	R\$ 47.233,29	R\$ 642.029,26	BV
3.2	PLANOS DE INSPEÇÃO	POR OBRA		R\$ 159.562,60	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 159.562,60	BV
3.3	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	OBRA x MÊS	R\$ 18.508,28	R\$ 1.832.319,72	24,15%	4,00	R\$ 74.033,12	R\$ 425.690,44	BV
4.1	REPORTE DO PORTFÓLIO	MENSAL	R\$ 73.357,00	R\$ 2.630.004,74	35,40%	1,00	R\$ 73.357,00	R\$ 869.436,74	A&M
4.2	CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	OBRA x MÊS	R\$ 9.418,33	R\$ 866.486,36	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	A&M
4.3	GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	MENSAL	R\$ 14.902,03	R\$ 574.822,43	34,82%	1,00	R\$ 14.902,03	R\$ 187.369,55	A&M
5.1	ASSESSORIA JURÍDICA CONTÍNUA	MENSAL	R\$ 30.672,92	R\$ 1.141.600,88	38,17%	1,00	R\$ 30.672,92	R\$ 405.450,80	MANESCO
5.2	ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	POR OBRA		R\$ 557.270,70	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 557.270,70	MANESCO
5.3	RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	MENSAL	R\$ 52.474,55	R\$ 1.953.025,63	38,17%	1,00	R\$ 52.474,55	R\$ 693.636,43	MANESCO
5.4	CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	MENSAL	R\$ 66.631,22	R\$ 921.604,33	37,70%		R\$ 0,00	R\$ 321.923,38	MANESCO

Nesse sentido, registra-se que, no universo dos produtos avaliados na **10ª medição**, tendo em vista as notas de avaliação obtidas, **não houve necessidade de apresentação de plano de ação corretivo**. Tal conclusão decorre do fato de que todos os produtos efetivamente avaliados na competência foram reconhecidos com desempenho integral para fins de medição, preservando-se, assim, a regularidade do fluxo contratual e a continuidade da execução nos ciclos subsequentes.

Por fim, apresenta-se o acompanhamento financeiro das medições do **CAEP** até o mês anterior:

LINHA DO TEMPO DE MEDIÇÕES — STATUS FINANCEIRO						
Contrato n.º 01/2025 CAEP Medições 1 a 10						
	● Pago	● Processado	● Em análise			
Empresa	MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO 2	MEDIÇÃO 3	MEDIÇÃO 4	MEDIÇÃO 5	
Empresa	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	
DYNA	R\$ 312.192,07	R\$ 389.743,01	R\$ 739.212,32	R\$ 270.833,58	R\$ 373.090,29	
A&M	R\$ 133.535,85	R\$ 200.293,76	R\$ 200.293,76	R\$ 122.760,04	R\$ 200.293,75	
MANESCO	R\$ 274.536,70	R\$ 285.876,79	R\$ 406.518,01	R\$ 114.510,63	R\$ 224.791,05	
BV	R\$ 58.320,94	R\$ 127.367,69	R\$ 118.619,99	R\$ 93.505,33	R\$ 182.892,53	
TOTAL	R\$ 778.585,56	R\$ 1.003.281,25	R\$ 1.464.644,08	R\$ 601.609,58	R\$ 981.067,62	

LINHA DO TEMPO DE MEDIÇÕES — STATUS FINANCEIRO					
Contrato n.º 01/2025 CAEP Medições 1 a 10					
● Pago ● Processado ● Em análise					
Empresa	MEDIÇÃO 6	MEDIÇÃO 7	MEDIÇÃO 8	MEDIÇÃO 9	MEDIÇÃO 10
Empresa	Pago	Pago	Pago	Pago	Processado
DYNA	R\$ 319.147,94	R\$ 184.565,14	R\$ 221.476,39	R\$ 221.476,39	R\$ 221.476,39
A&M	R\$ 200.293,76	R\$ 140.978,27	R\$ 112.199,28	R\$ 112.199,28	R\$ 112.199,28
MANESCO	R\$ 272.827,03	R\$ 83.147,47	R\$ 83.147,47	R\$ 149.778,69	R\$ 83.147,47
BV	R\$ 161.510,16	R\$ 121.266,41	R\$ 121.266,41	R\$ 121.266,41	R\$ 121.266,41
TOTAL	R\$ 953.778,89	R\$ 529.957,29	R\$ 538.089,55	R\$ 604.720,77	R\$ 538.089,55

2.2 Produto 1.2 – Relatório de Relações Institucionais

2.2.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.2, referente ao Relatório de Relações Institucionais, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório detalhado que descreve atividades realizadas no período em atendimento às diversas interrelações institucionais necessárias à boa execução do portfólio. Deverá contemplar no mínimo:

- *Relatório de Relacionamento Institucional: relatório que descreve a interação entre as diversas áreas do projeto, garantindo que o trabalho de cada setor (engenharia, certificação, contabilidade e jurídico) esteja alinhado e coordenado. Este relatório monitorará a integração dos processos e identificará oportunidades de integração entre as atividades.”*

2.2.2 Produtos desenvolvidos no período

- Integração Institucional e Consolidação de Processos executados em maio.

Durante o mês de maio, o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP) manteve agenda contínua de reuniões técnicas e de alinhamento operacional voltadas ao acompanhamento da execução das obras, à análise de projetos, medições e certificações, bem como à consolidação dos mecanismos de governança necessários ao monitoramento dos empreendimentos vinculados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA. As agendas envolveram representantes do próprio CAEP, das equipes técnicas da Dynatest, da Alvarez & Marsal, da Bureau Veritas, do Instituto para Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (IFAG), da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) e da assessoria jurídica da Manesco.

As pautas desenvolvidas ao longo do mês concentraram-se na estruturação dos fluxos de governança, na definição de responsabilidades institucionais e na consolidação de instrumentos de controle voltados ao acompanhamento das obras. Destacaram-se discussões relacionadas à elaboração de matrizes de responsabilidades, modelos de governança, fluxogramas operacionais, registros históricos dos empreendimentos e mecanismos de comunicação institucional, visando fortalecer a coordenação entre os diversos agentes envolvidos e aprimorar a rastreabilidade das decisões e dos processos.

As reuniões de alinhamento com a equipe da Dynatest concentraram-se na avaliação do andamento dos projetos e das obras, com destaque para os estudos geotécnicos, projetos geométricos, drenagem, desapropriações e licenciamento ambiental. Foram discutidas inconsistências em ensaios e documentos técnicos, impactos dessas restrições na certificação dos empreendimentos e riscos associados à execução de serviços sem aprovação definitiva dos projetos. Também foram abordadas questões relacionadas à rastreabilidade das informações de campo, controle tecnológico, documentação de medições e necessidade de reforço dos mecanismos de acompanhamento e fiscalização das obras.

No âmbito técnico e contratual, as agendas com a Bureau Veritas e a Manesco aprofundaram as discussões sobre conformidade normativa, responsabilidades das executoras, certificação de obras e interpretação dos instrumentos contratuais aplicáveis. Foram analisadas não conformidades identificadas em obras de drenagem e bueiros, riscos decorrentes da execução baseada em anteprojetos e a necessidade de alinhamento entre requisitos técnicos, jurídicos e financeiros para garantir maior segurança aos processos de medição, certificação e pagamento. Também foram debatidos procedimentos para emissão de notificações, tratamento de inconformidades e definição de responsabilidades em casos de descumprimento contratual.

As reuniões com a Alvarez & Marsal concentraram-se na estruturação dos processos de prestação de contas, na consolidação dos relatórios financeiros e na construção dos instrumentos de governança corporativa do consórcio. Também foram discutidas melhorias nos sistemas de acompanhamento gerencial, incluindo ferramentas visuais de controle, consolidação de bases de dados e preparação de materiais para atendimento aos órgãos de controle e demais stakeholders do programa.

Em paralelo, reuniões conjuntas entre CAEP, IFAG e GOINFRA trataram do status dos projetos executivos, das condicionantes para liberação de frentes de serviço e das pendências administrativas relacionadas à prestação de contas e à prorrogação contratual. As discussões evidenciaram a relevância dos estudos geotécnicos como principal fator condicionante para o avanço das disciplinas subsequentes e para a certificação das obras, bem como a necessidade de adequação documental para viabilizar medições, repasses financeiros e continuidade dos empreendimentos. Também foram debatidos mecanismos para utilização de aprovações com ressalvas, repactuação de cronogramas e mitigação dos impactos decorrentes de atrasos na entrega de projetos.

Em síntese, maio foi marcado pelo fortalecimento dos instrumentos de governança, pela intensificação do acompanhamento técnico dos projetos e pela consolidação dos processos de certificação, medição e prestação de contas. As atividades realizadas reforçaram a integração institucional entre os diversos agentes envolvidos, ampliaram a capacidade de monitoramento dos riscos associados aos empreendimentos e contribuíram para o aprimoramento dos mecanismos de controle, transparência e rastreabilidade adotados pelo CAEP no âmbito do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA.

Destaca-se, adicionalmente, que, embora tenha sido apontada, no âmbito da análise da 2ª prestação de contas, a necessidade de inclusão das atas completas das reuniões realizadas, optou-se, neste produto, pela apresentação consolidada das informações em formato de síntese técnica. Tal diretriz decorre da necessidade de assegurar maior confiabilidade na consolidação dos temas tratados, compatibilização entre os diversos stakeholders envolvidos e padronização das informações apresentadas. A apresentação estruturada em planilha, contendo datas, participantes e assuntos, permite adequada rastreabilidade das atividades executadas, bem como melhor visualização da evolução temporal das ações, garantindo transparência, objetividade e aderência às diretrizes de governança do programa.

Data	Participantes	Assuntos
05/05/2026	Dynatest: Guilherme Soares, Luiz Henrique Costa, Josiley Prado, Edson Shimizu, Victor Castro, Alvaro Laquis, Emine Lauara, Lara Cristina CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/Dynatest - resumo ata: A reunião teve como objetivo revisar o status técnico e operacional dos projetos e da obra Caiapó, tratar pendências de geotecnia, geométrico, drenagem, OAE, licenciamento ambiental e fechamento de medições, além de alinhar responsáveis e registros no BI. A equipe confirmou atualização do BI e relatou avanço de obra com cerca de 20 km atacados e aproximadamente 14 bueiros em execução. No âmbito ambiental houve pendência de licença travada na SEMA, orientação de contato com a consultora responsável pela licença anterior para retificação e determinação de que a executora registre boletim de ocorrência em casos de furto como documentação. Em medições e controles, a equipe avalia os eventogramas e medição da Coplan, foi indicada repactuação de prazos para a primeira semana de junho por restrições de geotecnia e desapropriação, e estabeleceu-se prazo para envio de documentos escaneados até dia 8, com transição para diários digitais e necessidade de correção de itens do anteprojeto.
06/05/2026	Representantes CAEP - Dynatest, Bureau Veritas, Alvarez & Marsal e Manesco	Reunião de Alinhamento CAEP - resumo ata: A reunião tratou da necessidade de estruturar governança, confeccionar relatórios formais sobre o histórico e riscos contratuais e decidir a estratégia de comunicação pública e institucional. Foi acordado produzir dois documentos básicos: um detalhando papéis e responsabilidades (até nível das construtoras) e outro narrando o histórico de execução contratual com riscos e justificativas. Sobre governança, o grupo propôs formalizar um PMO ou modelo de governança com definição de papéis, periodicidade de reuniões, um gerente de projetos responsável por acompanhamento e cobrança, além de painéis e reports gerenciais para as quatro obras em curso. Ficou definido que o escopo inicial do documento de papéis será restrito a quatro stakeholders (Goinfra, IFAG, CAEP e executoras), e que ajustes internos do consórcio serão tratados posteriormente.
06/05/2026	Manesco: Gabriel Schroeder e Antônio Gonçalves BV: Ciro Sampaio CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/Maesco/BV - resumo ata: A reunião examinou a medição do 1º trimestre focada em divergências na execução de 23 bueiros, com apenas dois itens lançados no trimestre e pressão por desbloqueio de pagamento frente a questionamentos de conformidade normativa. Técnica e juridicamente concluiu-se que a aferição da conformidade deve considerar o anteprojeto e as normas aplicáveis, não apenas o orçamento; por isso há entendimento predominante de que a execução ocorreu em desconformidade normativa. Foi relatado desgaste com a executora e disputa interpretativa sobre qual norma aplicar; existe anteprojeto sem detalhamento de armação e o orçamento não contemplou essa exigência, gerando debate sobre responsabilidade contratual e risco do executor.
11/05/2026	A&M: Walter Schneider e Igor Ferreira CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/A&M - resumo ata: A reunião tratou da revisão do book de governança e da estruturação de três documentos centrais para apresentação à Dra. Eliana e para organizar as quatro empresas do consórcio. Foi definido foco na priorização do documento de responsabilidades (RACI) e na integração de contribuições técnicas e contratuais antes da entrega final estimada até quinta-feira.
11/05/2026	Dynatest: Edson Shimizu e Victor Castro CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/Dynatest - resumo ata: A reunião tratou de inconsistências nos ensaios geotécnicos da CCL, riscos contratuais relacionados a pedreiras e da necessidade de criar macrofluxos para engenharia e financeiro. Foram discutidos problemas de qualidade de dados que comprometem projeto e execução e a interface entre projetos, certificação e prestação de contas. No âmbito contratual, a substituição de pedreira foi colocada como risco do contratado e deverá ser alinhada com Armando e Sérgio devido a possíveis pleitos. Também foram mencionadas evidências de autorização de exploração dos areais e necessidade eventual de acompanhamento técnico em campo para confirmar volumes e permissões.

CAEP | Controle de Reuniões



Data	Participantes	Assuntos
12/05/2026	Dynatest: Guilherme Soares, Luiz Henrique Costa, Josiley Prado, Victor Castro, Alvaro Laquis, Emine Lauara, Lara Cristina CAEP: Edson Shimizu	Reunião de Alinhamento CAEP/Dynatest - resumo ata: A reunião tratou da aprovação técnica de bueiros, liberação de frentes e status de medições e pagamentos, com foco em documentação, conformidade e continuidade de obras. Sobre aprovação técnica, foi definido que os bueiros nas dimensões e locais aprovados podem ser liberados porém dependem de acompanhamento do IFAG porque faltam memória de cálculo, notas de serviço e quadro de quantidades; discutiu-se uso restrito de "aprovação com ressalvas". Decidiu-se registrar medições como provisórias quando houver alteração e exigir projeto executivo com justificativa assinada pelo projetista para quaisquer mudanças de armadura, sob risco de refazimento pela executora. Estado das frentes e produção: Caiapó com aproximadamente 17–20 km de terraplenagem em ataque, com faltas pontuais de um ou dois bueiros; retomada de serviços na CCL e outras frentes está lenta, execução limitada a complementos de bueiros e passagens de fauna, equipamentos parcialmente desmobilizados e risco de retrabalho em frentes já abertas.
13/05/2026	A&M: Walter Schneider e Igor Ferreira CAEP: Edson Shimizu	Reunião de Alinhamento CAEP/A&M - resumo ata: A reunião tratou da apresentação e revisão de dois documentos para a nova governança: uma matriz de responsabilidades (matriz RACI) e um histórico/excel de execução contratual e medições financeiras, com foco em consolidar internamente antes de encaminhar à Goinfra e IFAG.
14/05/2026	IFAG: Sérgio Fonseca, Joberth Junior e Eliseu Garcia GOINFRA: Alessandra Carvalho, Rafael Coutinho, Felipe Martins. CAEP: Edson Shimizu e Walter Schneider	Reunião de Alinhamento GOINFRA + IFAG + CAEP - resumo: A reunião tratou do estado de análise e aprovação de projetos executivos, condicionantes para liberação de frentes de serviço e pendências administrativas relativas à prestação de contas e prorrogação do termo contratual. Foi reiterado o fluxo de análise em dois níveis (documental e técnico) e identificado o estudo geotécnico como principal restrição que condiciona terraplenagem, hidrologia e pavimentação. Status por entendimento: Caiapó tem 4 de 14 projetos entregues, com pendências geotécnicas e correções do geômetro; parte geométrica recebeu parecer extraoficial. A CCL/Trafecon possui 12 disciplinas, 8 já entregues e duas pré-aprovadas (geometria e drenagem); mesmo sem geotecnia totalmente aprovada, retomou drenagem e OACs em campo. Coplan/Engessur entregou 4 de 12 disciplinas e apresenta postura de cumprimento do rito. A CCB (Influência) apresenta projetos de baixa qualidade e atrasos, já notificada; iniciou turno noturno sem comunicar, motivando alocação de fiscalização noturna com apoio da Dynatest. Execução de obras: frentes de terraplenagem da Caiapó avançam em trechos com orientação de não executar camadas finais sem projeto aprovado; drenagem e OACs estão sendo executadas com base em anteprojeto, registradas em diário de obra e sujeitas a refazimento caso o executivo imponha alterações. Houve debate sobre interpretação do TAG: entendimento prévio permitia avanço até 50% com anteprojeto; coordenação e fiscalização enfatizam que avanço só deve ocorrer com alta aderência entre anteprojeto e projeto executivo para mitigar risco. Administrativo e financeiro: consignadas pendências na prestação de contas anual e trimestral, com envio de documentação e notas técnicas para justificar ressalvas. O consórcio pediu dilação de prazo para reprogramação (pedido de 10 dias úteis); a coordenação negociou prazo intermediário e pretende formalizar por ofício com evidências de notificação. A prorrogação do termo será feita por aditivo simples com justificativa técnica e jurídica.

Data	Participantes	Assuntos
19/05/2026	Dynatest: Guilherme Soares, Luiz Henrique Costa, Josiley Prado, Victor Castro, Alvaro Laquis, Emine Lauara, Lara Cristina CAEP: Edson Shimizu	Reunião de Alinhamento CAEP/Dynatest - resumo ata: A reunião tratou de problemas de rastreabilidade de informações geotécnicas, regras para medições e o papel da certificação nas obras. Foram discutidos inconsistências entre fotos de campo, boletins de sondagem e resultados laboratoriais, condicionando aprovação geotécnica à resolução desses problemas. Foi definida política rígida para não conformidades: tratar obras/entregas afetadas como evento único, exigir refazimento integral das partes não conformes e cronograma de execução, sem medições ou pagamentos parciais. A certificadora posicionada como agente contratual integrado, não burocrático; porém necessita de documentação detalhada de campo (cronograma executivo, histórico de materiais, programação semanal) porque trabalha por amostragem. Para alinhamento operacional será convocado um workshop geral com executoras, projetistas, controle tecnológico e certificação. Operação noturna e controle de turnos foram tema crítico: a certificadora não foi informada sobre trabalho em turno dobrado (contrato 147), gerando orientação para reorganização e coordenação intermediária de turnos para validar entregas noturnas.
25/05/2026	IFAG: Sérgio Fonseca, Joberth Junior e Eliseu Garcia GOINFRA: Alessandra Carvalho, Rafael Coutinho, Felipe Martins. CAEP: Edson Shimizu	Reunião de Alinhamento GOINFRA + IFAG + CAEP - resumo: A reunião tratou da proposta de supressão de escopo e do redesenho do gerenciamento técnico, da compatibilização jurídico-técnica para justificar aumentos de custo e das falhas documentais que travam repasses e medições. Foi apresentado que a supressão proposta implica redução proporcional de aproximadamente 48% entre empresas do CAEP e que a nova configuração técnica dimensiona equipe fixa por obra (engenheiro fiscal pleno + técnico), apoio adicional e engenheiro ambiental compartilhado. Debate sobre turno noturno: O Estado apoia turnos extras para cumprir cronograma, mas exigiu demonstração de vantagem frente ao custo e lembrou limite de 10% em obras e ausência de regra equivalente para a estruturadora. Optou-se por ampliar quantidades no produto 2.4 em vez de criar novo item. Foram relatadas insuficiência e discrepâncias na documentação de prestação de contas: registros de controle tecnológico ausentes, diários de obra incompletos, fotos faltantes, digitalizações inconsistentes e divergências entre medições, notas fiscais e relatórios. Essas pendências estão bloqueando repasses e provocando pedidos de adiantamento não atendidos. O CAEP afirma já ter enviado documentos pendentes e pretende corrigir deficiências. Foram confirmados repactuação de prazos de projetistas e executoras majoritariamente para a segunda quinzena de junho, uso de aprovações com ressalvas para não travar frentes e esforços intensivos na mitigação do crítico estudo geotécnico da CCL. Persistem riscos de perda de frentes por chuvas e questionamentos de fiscalização. A reunião terminou com confirmação de manter encontro subsequente na quinta e agradecimentos.

CAEP | Controle de Reuniões



Data	Participantes	Assuntos
28/05/2026	A&M: Walter Schneider, Gabrielle Rocha e Igor Ferreira Dynatest: Victor Castro CAEP: Edson Shimizu	Reunião de Alinhamento CAEP/Dyna/A&M - resumo ata: A reunião tratou da evolução do OnePage/BI de acompanhamento de ordens e contratos, da padronização de métricas físicas e financeiras e do desenho de governança do consórcio, com necessidade de respostas formais ao Ministério Público e preparação de workshop com executoras. Sobre o OnePage/BI, definiu-se apresentação inicial em PowerPoint com objetivo de automação futura; melhorias de visualização foram priorizadas (legenda, destaque de trechos não atacados, espessura do traçado GIS, compactação do cabeçalho para abrir espaço para status e gráficos). O mapa Plum Page deve incluir duas métricas de avanço físico: "concluído" e "concluído + atacado", além de blocos sintéticos (percentual, data programada, data reprogramada e comentário). Igor ficou responsável por compartilhar demonstrativo unifilar existente e ajustar integração com eventograma financeiro. Sobre métricas e cálculo de avanço, confirmou-se que o eventograma financeiro tem sido usado como base do peso para o avanço físico (percentual global exemplificado em 3,66), mas há necessidade de padronizar regras, granularidade e registrar fontes formais de dados. Foi discutida a limitação do indicador "concluído + atacado" em superestimar avanço quando atacado não está concluído nem ensaiado; destacou-se que ensaios de controle tecnológico são entrada para medição financeira e podem reduzir valores no fechamento trimestral. Optou-se por priorizar atualização mensal para prestação de contas e manter apresentações semanais/one-sheet separadas. Também ficou definido que Álvarez montará a narrativa unificada do workshop e cada consorciada apresentará dores e evidências para compor storytelling.

2.3 Produto 1.3 – Relatório de Comunicação Integrada

2.3.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.3, referente ao Relatório de Comunicação Integrada, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório com o objetivo de garantir que as informações sobre o andamento dos projetos e obras de infraestrutura sejam comunicadas de forma transparente e acessível às partes interessadas, incluindo as comunidades locais, órgãos governamentais, parceiros privados e o público em geral. Deverá contemplar no mínimo:

- *Este relatório abordará estratégias e atividades desenvolvidas, em andamento e planejadas, que tem como objetivo transparência do relacionamento proativo, minimizando o impacto da elaboração de projeto e execução da obra e assegurar a adesão das comunidades aos projetos de infraestrutura.”*

2.3.1.1 Suspensão dos Serviços de Comunicação Integrada

Em virtude da supressão do Produto 1.3 (Comunicação Social) no âmbito do Contrato nº 01/2025 (CAEP–IFAG), devidamente formalizada mediante aditivo contratual, os serviços vinculados a este item foram encerrados de forma regular e definitiva. O IFAG adotou as medidas cabíveis para garantir a regularidade do processo, preservando o erário e assegurando a conformidade contratual. O e-mail de registro do tema, segue abaixo para fins de comprovação.




Figura 2 – Evidência da supressão do Produto 1.3.

2.3.1.2 Retomada do produto 1.3 a partir da Reprogramação do Contrato nº 01/2025

Na proposta encaminhada pelo CAEP em 23/12/2025, após solicitação de redução do valor contratual no patamar de 47,8% em razão da supressão das três obras, ficou definida a exclusão do Produto 1.3, dado que a atividade ficaria insustentável com a aplicação do referido desconto.

Entretanto, após solicitação da GOINFRA em reunião realizada em 25/05/2026, decidiu-se pela reintrodução do Produto 1.3 no escopo do consórcio a partir de julho de 2026, com a aplicação do valor original previsto no Contrato nº 01/2025.

2.4 Produto 1.4 – Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC)

2.4.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.4, referente ao Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC), é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório de todas as atividades de manutenção e desenvolvimento de plataforma integrada de gestão no âmbito do programa de gestão dos produtos, que consolida as atividades prestadas e apuração dos indicadores de apuração e desempenho.”

2.4.1.1 Publicação Rotineira do Painel de Sala de Situação no Site do IFAG

No período de referência, as publicações do Painel de Acompanhamento Visual foram realizadas de forma quinzenal, em conformidade com a estratégia estabelecida pelo IFAG e pelo CAEP, tendo sua divulgação oficial no site ocorrida nos dias 04/05/2026 e 25/05/2026.

Adicionalmente, foram realizadas publicações preliminares no dia 22/05/2026 e outras duas no próprio dia 25/05/2026. Em cada ciclo de atualização, o BI é inicialmente publicado em ambiente preliminar para avaliação e aprovação do IFAG. Um e-mail é encaminhado ao IFAG solicitando a aprovação formal e, após a manifestação favorável do órgão — formalizada via e-mail —, o painel é publicado no site do IFAG. Segue abaixo evidências das aprovações do IFAG:



Ferreira, Igor

To: Adriano Silva de Faria <adriano.faria@ifag.org.br>

Cc: Eliseu Silva Garcia <eliseu.garcia@ifag.org.br>; +6 others

Adriano, boa tarde!

Obrigado pelo retorno! BI Publicado no site.

[Microsoft Power BI](#)

Quaisquer dúvidas ou considerações, me encontro à disposição.

Atenciosamente,

Igor Ferreira

Infra & Capital Projects

Alvarez & Marsal Brasil

Rua Surubim, 373 – 3º andar - Brooklin Novo

São Paulo, SP, Brasil, 04571-050

Mobile: +55 11 91087-0097

AlvarezandMarsal.com


Follow and connect with A&M:

[LinkedIn](#) | [Twitter](#) | [Facebook](#)



Mon 5/4/2026 1:04 PM

Figura 3 – Formalização da publicação da atualização da Sala de Situação/Plataforma Integrada.

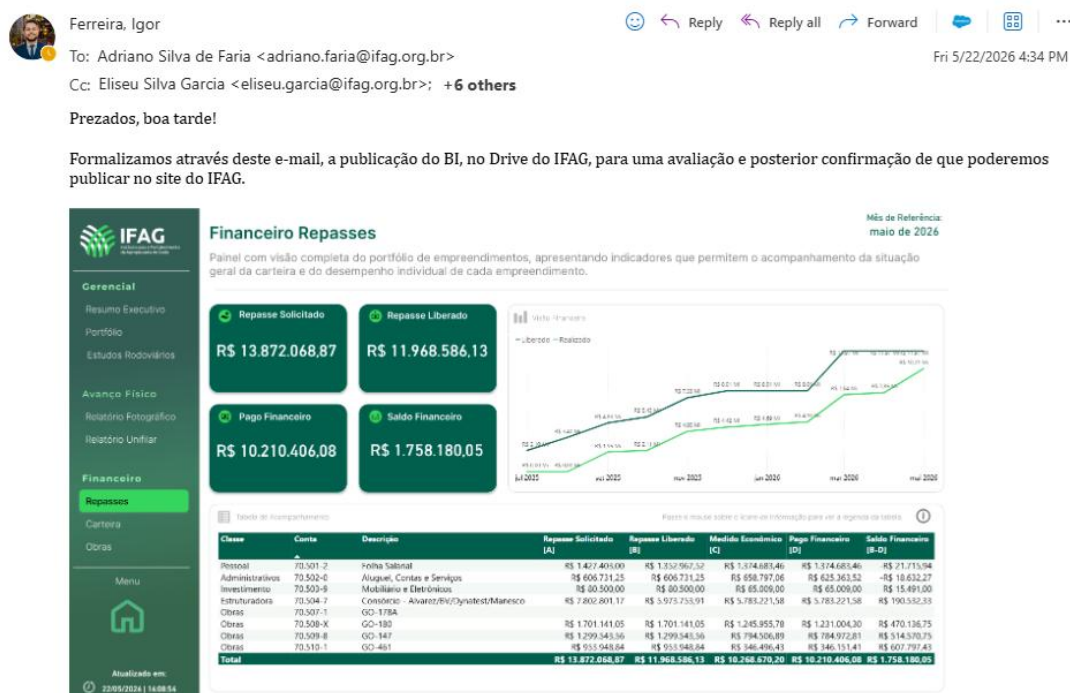

Link de acesso ao Drive com o link acessível ao BI para avaliação:

https://drive.google.com/drive/folders/1ubaSI14HB1gT1fpFNqAf97VmmSXs-NC?usp=drive_link

Aguardamos confirmação formal de que podemos publicar no site do IFAG.

Quaisquer dúvidas ou considerações, me encontro à disposição.

Figura 4 – Formalização da publicação da atualização da Sala de Situação/Plataforma Integrada.




Figura 5 – Formalização da publicação da atualização da Sala de Situação/Plataforma Integrada.

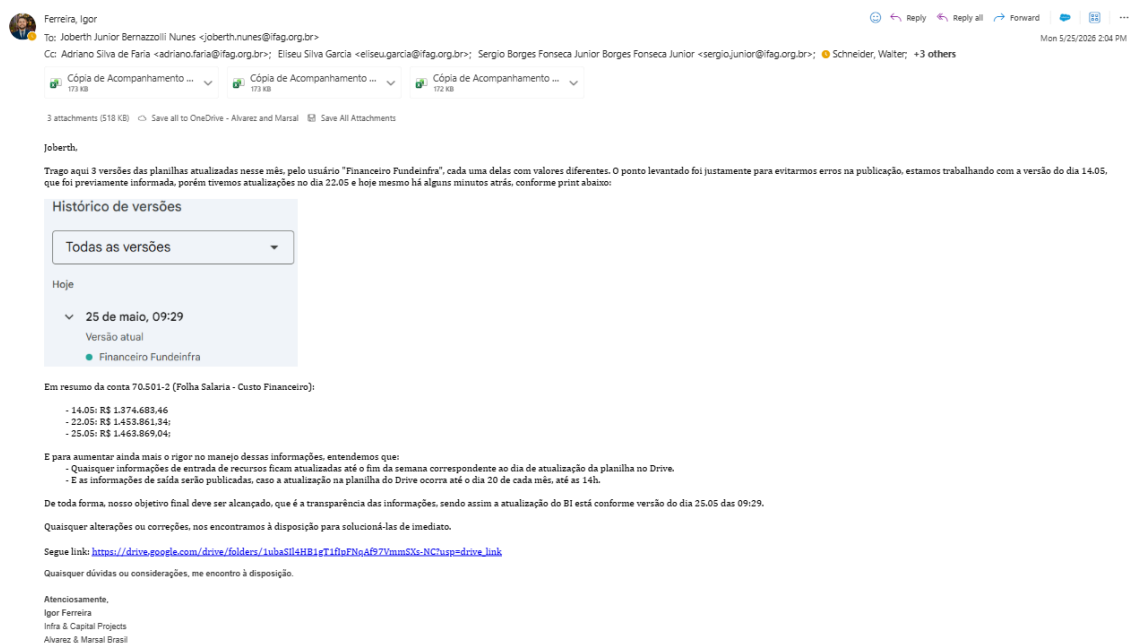


Figura 6 – Formalização da publicação da atualização da Sala de Situação/Plataforma Integrada.




Figura 7 – Formalização da publicação da atualização da Sala de Situação/Plataforma Integrada.

2.4.1.2 Painel de Avanço Físico e Unifilar

As publicações contemplam as principais rotinas de atualização do Portfólio e do Painel de Acompanhamento Visual, bem como dos painéis de Resumo Executivo e Unifilar.

- **Indicador de Avanço Físico da Obra:** Como estruturação de processos, e vinculado ao Produto 4.1 Gestão de Portfólio de Projetos, foram realizadas reuniões com o consórcio (CAEP) para definição dos pesos de ponderação do indicador de avanço físico global de cada obra. Com a aprovação dos eventogramas e a consolidação dessa metodologia, tornou-se possível estruturar um cálculo padronizado e consistente do avanço global por empreendimento, que vem sendo acompanhado mensalmente, através do monitoramento das atualizações dos unifilares e aprovações das medições.

Como resultado direto desse trabalho, e no âmbito do Produto 1.4, foi disponibilizado o painel de acompanhamento unifilar publicado no BI, atualizado mensalmente, que traduz de forma visual a evolução semanal das obras e a porcentagem de evolução global mensal, conforme representado no painel abaixo.

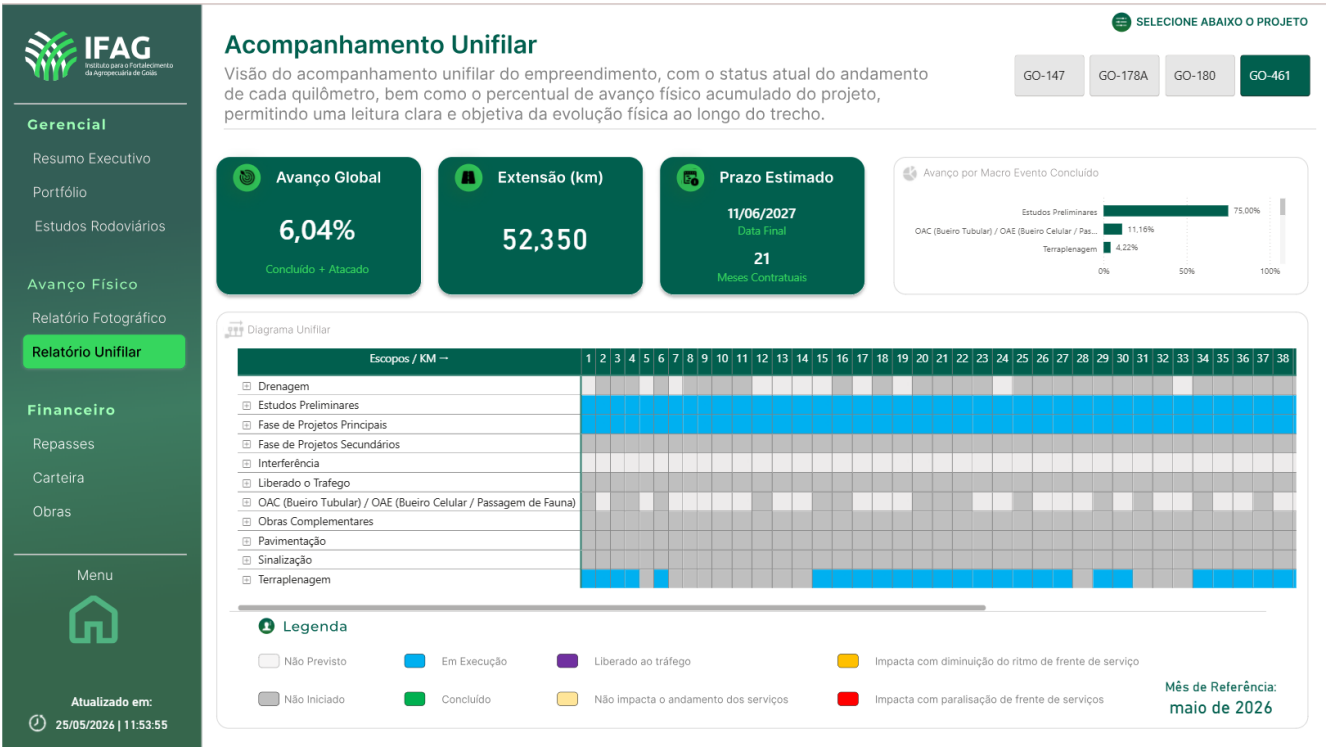


Figura 8 – Imagem ilustrativa da página de avanço físico e unifilar.

2.4.1.3 Atualização do Painel Resumo Executivo

Após a aprovação dos eventogramas pelo CAEP, o Painel Executivo passou por atualização rotineira dos dados já consolidados. A principal atualização foi a inclusão do mês de referência nos painéis de Resumo Executivo e Unifilar, com o objetivo de conferir maior clareza temporal às informações apresentadas. As demais atualizações realizadas correspondem à manutenção regular do painel, sem alterações estruturais ou inclusão de novos indicadores. Com a aprovação das medições e seus faturamentos, será incluída a visão financeira realizada por obra.

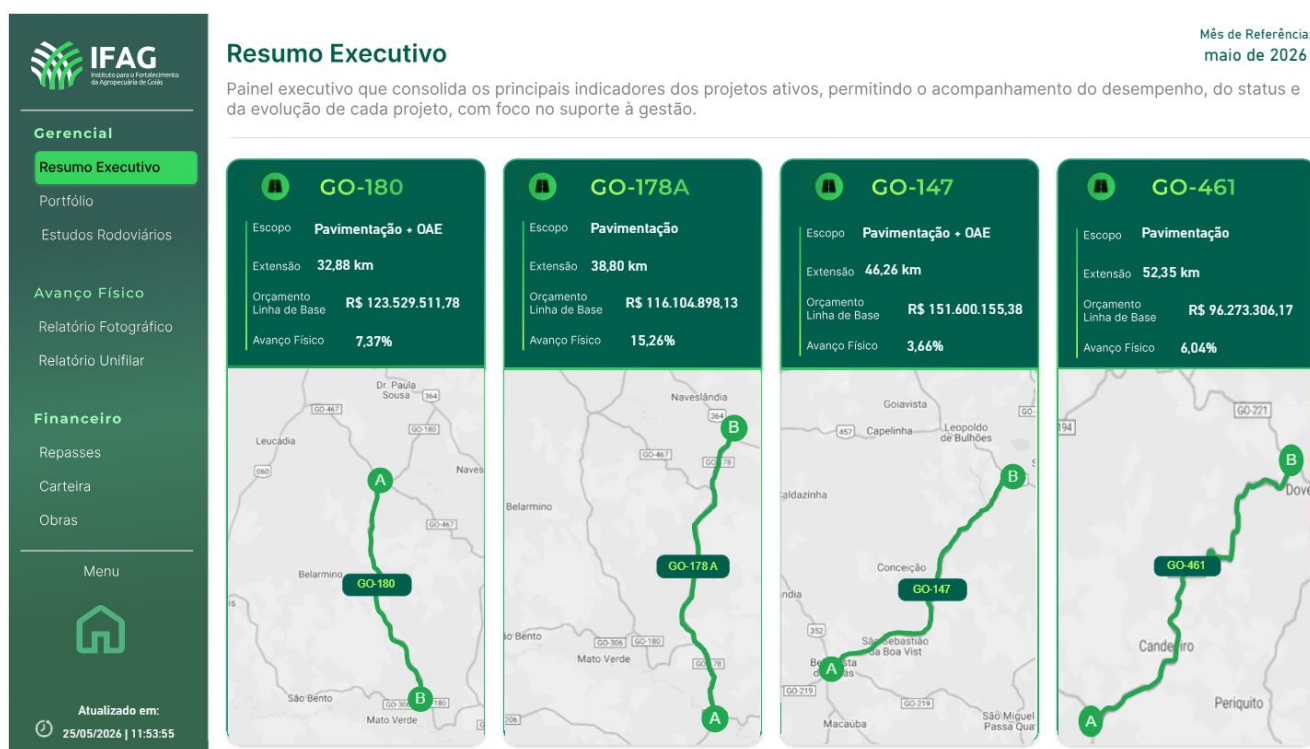


Figura 9 – Imagem ilustrativa da página de Resumo Executivo.

2.4.1.4 Atualização dos Painéis Financeiros

- **Painéis Financeiros:** No período em análise, foram realizadas atualizações nos painéis financeiros contemplando: (i) as solicitações de repasse à Estruturadora, formalizadas por meio do Ofício nº 170/2026, e à GO-178A, formalizadas por meio do Ofício nº 171/2026; (ii) as medições aprovadas e seus respectivos pagamentos referentes às obras GO-180, GO-147 e GO-461; e (iii) a atualização das informações de valores previstos em eventograma, após a aprovação do eventograma pelo CAEP. Essas atualizações visam refletir de forma mais fiel a evolução temporal das solicitações de repasse e do avanço fisco-financeiro das obras, contribuindo para a manutenção da base de dados atualizada e alinhada aos registros administrativos e técnicos do período. Ressalta-se que as alterações efetuadas tiveram caráter pontual e informativo, não implicando mudanças na estrutura, metodologia ou critérios de análise dos painéis financeiros, os quais permanecem consistentes com o padrão previamente estabelecido para o acompanhamento gerencial e institucional dos empreendimentos.



IFAG
Instituto para o Fortalecimento da Administração Pública

Gerencial

Resumo Executivo

Portfólio

Estudos Rodoviários

Avanço Físico

Relatório Fotográfico

Relatório Unifilar

Financeiro

Repasses

Carteira

Obras

Menu



Atualizado em:

25/05/2026 | 11:53:55

Financeiro Repasses

Mês de Referência:
maio de 2026

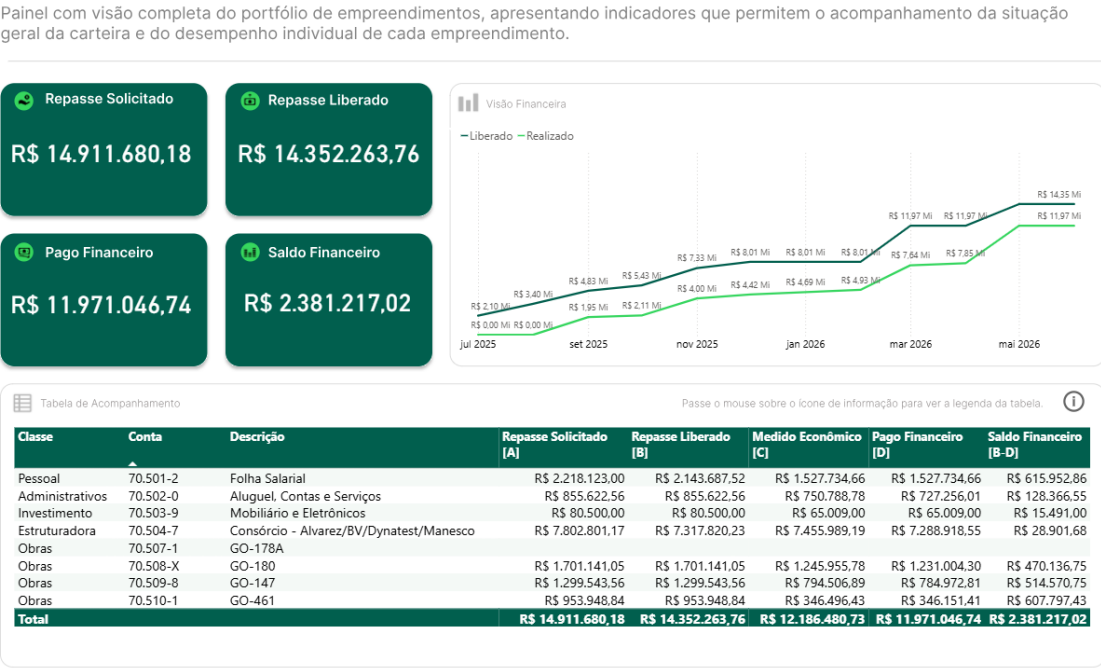


Figura 10 – Imagem ilustrativa da página Financeiro Repasses.



IFAG
Instituto para o Fortalecimento da Administração Pública

Gerencial

Resumo Executivo

Portfólio

Estudos Rodoviários

Avanço Físico

Relatório Fotográfico

Relatório Unifilar

Financeiro

Repasses

Carteira

Obras

Menu



Atualizado em:

25/05/2026 | 11:53:55

Financeiro Carteira

Mês de Referência:
maio de 2026

UTILIZE OS FILTROS PARA EXPLORAR OS DADOS

LIMPAR FILTROS

Painel com visão consolidada do portfólio de projetos, contemplando o orçado e o realizado, o saldo a executar, o status e os principais desvios identificados.

Região

Rodovia

Tipo de Obra

Fase

Todos

Todos

Todos

Todos

Tabela de Acompanhamento

Passar o mouse sobre o ícone de informação para ver a legenda da tabela.

Rodovia	Linha de Base Total [B]	Previsto no Mês [C]	Faturado no Mês [D]	Pago no Mês [G]	Desvio no Mês [D-C]	Linha de Base Acumulada [E]	Faturado Acumulado [F]	Desvio Acumulado [F-E]	Pago Acumulado [H]
GO-180	R\$ 123.529.511,78	R\$ 15.191.263,51				R\$ 24.702.996,81	R\$ 1.245.955,78	-R\$ 23.457.041,03	R\$ 1.231,00
GO-147	R\$ 151.600.155,38	R\$ 11.214.809,40				R\$ 23.985.066,50	R\$ 794.506,99	-R\$ 23.190.559,51	R\$ 784,97
GO-461	R\$ 96.273.306,17	R\$ 3.719.266,64				R\$ 10.136.295,72	R\$ 350.355,67	-R\$ 9.785.940,05	R\$ 346,15
Total	R\$ 487.507.871,45	R\$ 56.180.053,85				R\$ 103.149.689,68	R\$ 2.390.818,44	-R\$ 100.758.871,24	R\$ 2.362,12

Linha de Base vs Realizado

● Linha de Base Mês a Mês ● Faturado Acumulado ● Faturado no Mês — Linha de base Total

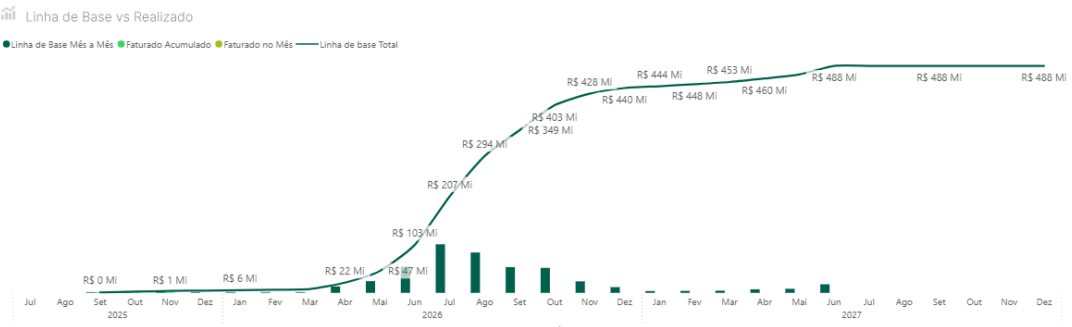


Figura 11 – Imagem ilustrativa da página Financeiro Carteira.

-CONFIDENCIAL-

41



Figura 12 – Imagem ilustrativa da página Financeiro Obras.

- **Acompanhamento Visual:** No período de referência, o Painel de Acompanhamento Fotográfico passou por atualizações em diferentes momentos ao longo de maio, seguindo a dinâmica de publicações quinzenais. A divulgação oficial no site ocorreu nos dias 04/05/2026 e 25/05/2026.

Adicionalmente, foram realizadas atualizações em caráter preliminar no dia 22/05/2026 e outras duas no próprio dia 25/05/2026, destinadas à revisão, ajuste e validação das informações antes de sua consolidação final no painel. As imagens foram incorporadas de forma estruturada ao painel, possibilitando evidenciar a evolução das frentes de serviço e o progresso físico dos empreendimentos ao longo dos períodos analisados. As informações utilizadas têm como base os relatórios semanais de acompanhamento de obras, sendo consolidadas e disponibilizadas pelo CAEP, com atualização quinzenal e validação realizada pelo IFAG, assegurando a consistência, a confiabilidade e a rastreabilidade dos registros apresentados no painel.

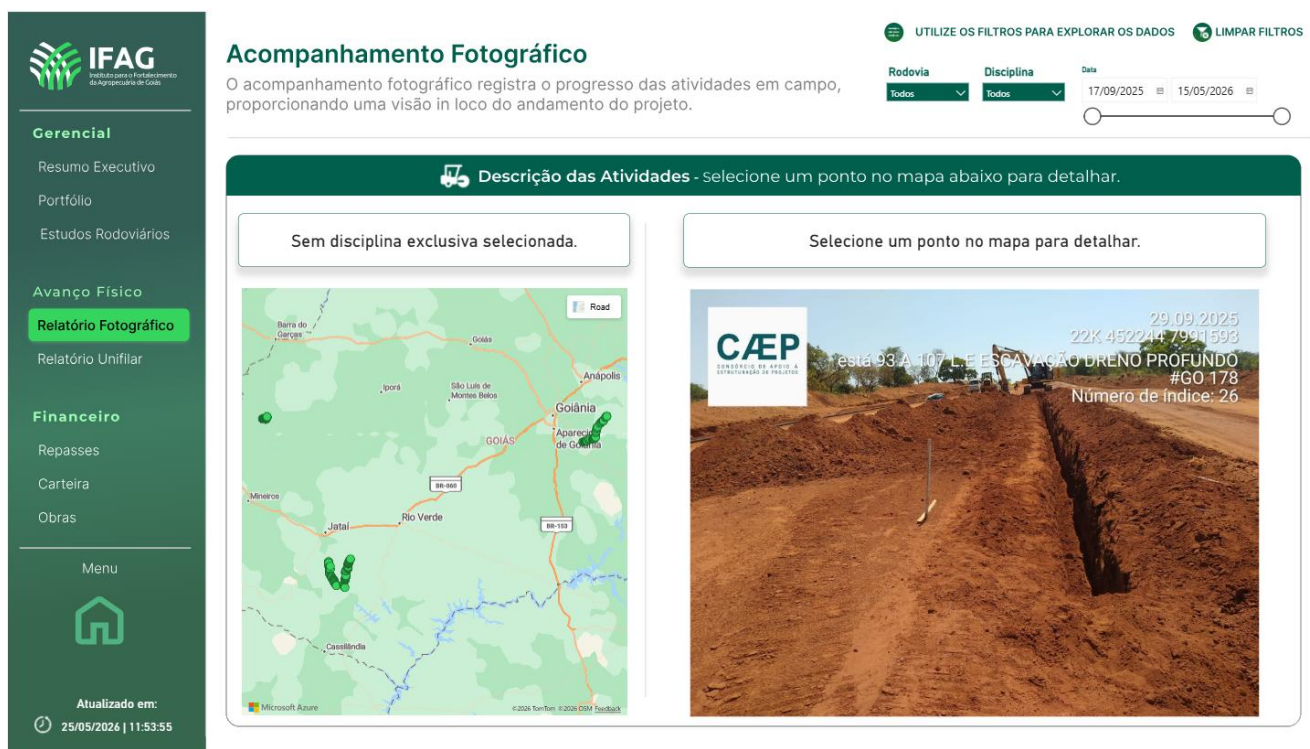


Figura 13 – Imagem ilustrativa da página Acompanhamento Fotográfico.

- **Portfólio:** No âmbito do Produto 4.1 — Gestão de Portfólio de Projetos (PMO) —, foram realizadas reuniões de PMO com o CAEP e com o IFAG para acompanhamento, revisão e consolidação das informações relacionadas às etapas e fases dos projetos que compõem o portfólio de empreendimentos monitorados. As atualizações realizadas permitiram refletir o status atual de cada iniciativa, em conformidade com as práticas e nomenclaturas adotadas na gestão de projetos, proporcionando uma visão consolidada do andamento do portfólio. No período em questão, houve as seguintes atualizações:

- Evolução do tópico de Projeto Executivo Viário Secundário das GO-461 e GO-147, de “A iniciar” para “Em curso”.

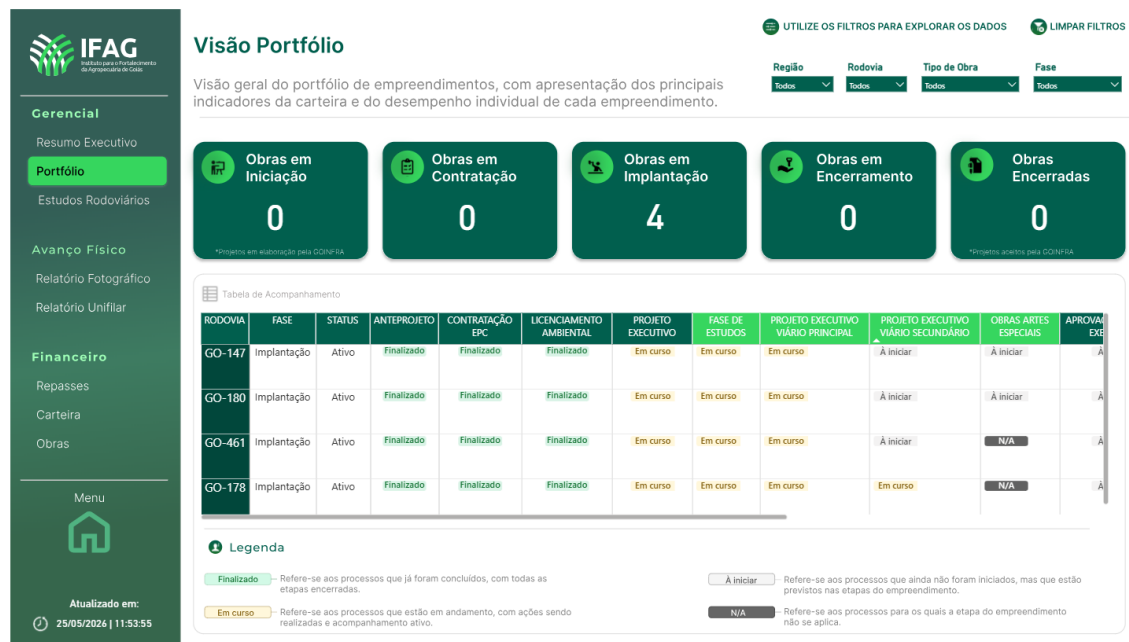


Figura 14 – Imagem ilustrativa da página Portfólio.

2.4.2 Produtos desenvolvidos no período

CAEP Controle de Produtos									
CAEP CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS									
ID	Produto	Empresa Responsável	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data de Início	Data da entrega	Status Entrega
1	1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	NA	Relatório Técnico	Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3	Geral	01/05/2026	31/05/2026	Entregue
2	1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	NA	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	Geral	01/05/2026	31/05/2026	Entregue
3	1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	NA	Relatório Mensal	[TIC] Sala de Situação - Manual Descritivo do Portal de Acompanhamento	Geral	01/05/2026	31/05/2026	Entregue

ENCERRAMENTO


O **Relatório Mensal Nº 11**, referente à consolidação e à apresentação das atividades desenvolvidas durante o mês de referente ao período **01 de Maio/2026 até 31 de Maio/2026**, em conformidade ao Contrato Nº 01/2025-IFAG.

Goiânia, 09 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente
 **ALEX DE VASCONCELOS PINELI ALVES**
Data: 18/06/2026 14:29:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alex de V. Pineli Alves

CAEP – Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos
Produto P1.1 e P1.2 – Relatório mensal – Grupo 1



Minicius Daher

CAEP – Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos
Produto P1.3 e P1.4 – Relatório mensal – Grupo 1

ANEXOS**LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS**

REF.	DESCRIÇÃO
Anexo I	P1.1 - Controle de Entrega de Produtos de maio.xlsx
Anexo II	P1.1 - Dashboard da Análise de Entrega de Produtos - maio.pdf
Anexo III	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de maio.xlsx
Anexo IV	P1.1 - Timeline de Acompanhamento Macro até maio 2026.pdf
Anexo V	P1.2 - Controle de Reuniões do mês de maio.xlsx
Anexo VI	1.3. Anexos.zip
Anexo VII	1.4. Anexos.zip

CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

 **Dynatest**[®]

MANESCO

 **INFRA**
& CAPITAL PROJECTS
BY ALVAREZ & MARSAL



RELATÓRIO CAEP

Grupo 1 - Coordenação Geral Executiva

Relatório Mensal N° 12

Referente ao período de execução de 01.06.26 até 30.06.26

08 de Julho de 2026

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	3
2 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA.....	4
2.1 Produto 1.1 – Relatório de Coordenação Geral	5
2.1.1 Descrição das atividades atribuídas	5
2.1.2 Produtos desenvolvidos no período	5
2.2 Produto 1.2 – Relatório de Relações Institucionais	27
2.2.1 Descrição das atividades atribuídas	27
2.2.2 Produtos desenvolvidos no período	27
2.3 Produto 1.3 – Relatório de Comunicação Integrada	31
2.3.1 Descrição das atividades atribuídas	33
2.4 Produto 1.4 – Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC)	34
2.4.1 Descrição das atividades atribuídas	34
2.4.2 Produtos desenvolvidos no período	44
ENCERRAMENTO.....	45

1 APRESENTAÇÃO

A seleção da empresa Estruturadora pelo Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG - ocorreu por meio do Instrumento de Convocação nº 01/2025 para empresas ou consórcio estruturador, qualificados junto à SEINFRA, conforme o Chamamento Público para pré-qualificação nº 001/2024 da SEINFRA. Consagrado vencedor, o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos - CAEP – desenvolverá, ao longo do contrato, atividades especializadas em gestão de infraestrutura, divididas conformes os grupos:



**Coordenação Geral
Executiva**



**Gestão de Engenharia
e Socioambiental**



**Certificação de
Projetos e
Obras**



**Gestão de Processos
Administrativos e
Contábeis**



**Assessoramento e
Consultoria Jurídica**

Figura 1 – Imagem ilustrativa da gestão em infraestrutura.

O CAEP é formado pelas empresas Dynatest Engenharia LTDA, Bureau Veritas do Brasil Sociedade Classificadora e Certificadora LTDA., Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA e Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados.

O Consórcio Estruturador apresenta ao IFAG o **Relatório Mensal Nº 12**, referente ao período de **01 de Junho/2026 até 30 de Junho/2026**, em conformidade ao Contrato Nº 01/2025-IFAG.

O presente Relatório Mensal apresenta os elementos do objeto contratual descrito no Termo de Referência como “Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA”.

2 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

A Coordenação Geral Executiva atua como agente de interface entre todos os envolvidos, isto é, IFAG, SEINFRA, GOINFRA, empresas projetistas, empresas executoras e empresas supervisoras, garantindo que o objetivo seja executado de forma eficaz, transparente e coordenada. A função central desta coordenação é manter a coesão entre as diversas áreas envolvidas (gerenciamento de obras, projetos, governança, contábil, legal, dentre outras) e assegurar que todas as atividades sejam realizadas de acordo com os padrões técnicos, legais e de governança definidos pela SEINFRA, GOINFRA, FUNDEINFRA e IFAG.

Principais atividades:

- Gestão centralizada;
- Integração das atividades;
- Interlocução com partes interessadas (stakeholders);
- Comunicação integrada;
- Acompanhamento de cronogramas e alocação de recursos;
- Gestão integrada de riscos;
- Acompanhamento de processos e prestação de contas;
- Desenvolvimento e manutenção de sistemas e painéis do tipo sala de situação.

2.1 Produto 1.1 – Relatório de Coordenação Geral

2.1.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.1, referente ao Relatório de Coordenação Geral, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório detalhado que descreve a estrutura da Coordenação Central, responsável pela gestão centralizada de todas as (macro)atividades e seus produtos, no âmbito de suas atribuições e responsabilidades. Deverá contemplar no mínimo:

- Progresso e Prestação de Contas das Atividades: relatório que consolida o progresso de todas as atividades executadas, em execução e planejadas, indicando as fases atuais de atendimento (status), a fim de assegurar a prestação de contas à Associação, SEINFRA, órgãos de controle, e demais partes interessadas além de oferecer transparência aos demais stakeholders quanto às suas atividades. Esses relatórios incluirão indicadores de desempenho globais e parciais, cumprimento de prazos, resultados financeiros e alinhamento às normas técnicas e legais.*
- Plano de Gestão Integrada de Riscos: documento que consolida a gestão de riscos de todas as áreas do projeto, garantindo que a visão abrangente e atualizada dos riscos envolvidos (financeiros, operacionais, ambientais, jurídicos, ou outros inerentes ao objetivo do projeto). O plano estabelecerá as medidas de mitigação e contingência, indicando os responsáveis por cada ação, além de promover a coordenação entre os setores para garantir uma resposta integrada.”*

2.1.2 Produtos desenvolvidos no período

- Planilha de Controle de Produtos referente ao mês de junho

Durante o mês de junho de 2026, o CAEP manteve elevado nível de produção técnica, administrativa e institucional, com a emissão de documentos voltados ao acompanhamento das obras, à análise de projetos executivos, à gestão contratual e ao fortalecimento da governança do Programa. O período foi marcado pela intensa atuação das equipes, com destaque para notas técnicas de análise e aceitação de projetos, pareceres técnicos, atas de reuniões de alinhamento, relatórios semanais de acompanhamento de obras, boletins de medição, análises ambientais, procedimentos operacionais e instrumentos de assessoramento jurídico e gestão contratual.

O conjunto de entregas evidencia a atuação integrada das empresas consorciadas Dynatest, A&M Infra, Bureau Veritas e Manesco, que contribuíram de forma complementar nas frentes de engenharia, planejamento, gestão de riscos, tecnologia da informação, certificação e assessoramento jurídico.

Observou-se predominância das atividades vinculadas às frentes de Gerenciamento Técnico, Coordenação de Serviços de Engenharia e Análise de Projeto e RPFO, responsáveis pelo maior volume de documentos relacionados ao acompanhamento dos empreendimentos e à evolução dos projetos executivos.

No âmbito técnico-operacional, destacaram-se as análises e aceitação de projetos executivos envolvendo desapropriação, terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, interferências, projetos geométricos e documentação complementar. Também foram emitidos pareceres de conformidade ambiental, análises de relatórios de controle ambiental, boletins de medição, relatórios semanais e mensais de acompanhamento de obras, relatórios de inspeção de alojamentos, notificações de não conformidade, ofícios, circulares técnicas e procedimentos operacionais voltados à fiscalização ambiental e à segurança do trabalho.

As atividades do mês abrangeram principalmente os empreendimentos GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461, que concentraram reuniões de alinhamento técnico e de obra, análises especializadas, pareceres ambientais, boletins de medição, relatórios de acompanhamento, avaliações de controle tecnológico e documentos relacionados ao avanço físico dos empreendimentos. A recorrência dessas entregas demonstra a continuidade das ações de fiscalização, controle técnico e monitoramento das obras acompanhadas pelo consórcio.

No campo da gestão contratual e assessoramento jurídico, a Manesco manteve atuação expressiva por meio da elaboração de pareceres jurídicos, minutas de advertência, respostas a ofícios, manifestações em processos administrativos, análises sobre sanções contratuais, revisões de instrumentos normativos, acompanhamento de demandas junto ao MPOG, GOINFRA e IFAG, além dos relatórios periódicos de assessoramento jurídico e gestão contratual. Paralelamente, a A&M Infra ampliou sua atuação com estudos de portfólio, painéis de gestão integrada, relatórios de tecnologia da informação, matrizes de riscos, painéis IRIS, acompanhamento de indicadores, controle de reuniões e documentos voltados ao suporte da governança e da gestão estratégica do Programa.

No campo da certificação, o Bureau Veritas manteve as atividades de verificação independente, com a emissão do Relatório Mensal de Gestão da Certificação e dos relatórios técnicos referentes às obras das rodovias GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461, fortalecendo os mecanismos de inspeção técnica, controle externo e conformidade dos empreendimentos.

Além das entregas concluídas, o mês de junho registrou alguns produtos em elaboração, principalmente pareceres técnicos relacionados ao controle tecnológico e topográfico da GO-147 e o Relatório Mensal de Assessoramento Jurídico, evidenciando a continuidade das atividades técnicas e administrativas que serão consolidadas nos ciclos subsequentes.

Dessa forma, o controle de produtos referente ao mês de junho de 2026 apresenta um panorama abrangente e atualizado da atuação do CAEP no período, assegurando rastreabilidade documental, transparência na execução das atividades e aderência às responsabilidades previstas no escopo contratual.

Apresenta-se, portanto, a seguir, a planilha consolidada das entregas de junho de 2026, contendo a identificação do produto, a empresa responsável, o tipo de documento, a descrição, o empreendimento correspondente, a data de entrega e o status atualizado, permanecendo como ferramenta fundamental para o acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas pelo consórcio.

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-159.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-147	01/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-160.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Desapropriação	GO-178A	01/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-105.1	Parecer	Solicitação de revisão de projeto do número N	GO-180	01/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-106.1	Parecer	Parecer Técnico Complementação Topografia	GO-178A	01/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-109.1	Parecer	Parecer Técnico Complementação DUP GO-180	GO-180	01/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-132.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	01/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-136.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	02/06/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião	Reunião	Reunião entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	02/06/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de advertência Caiapó	Gestão Contratual	Elaboração de minuta de advertência à Caiapó atraso na entrega dos projetos executivos	GO-180	02/06/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de advertência COPLAN	Gestão Contratual	Elaboração de minuta de advertência à COPLAN referente atraso na entrega dos projetos executivos	GO-461	02/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-114.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Pavimentação	GO-180	03/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-137.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	03/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-033.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	03/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-034.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	03/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-035.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	03/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-038.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	03/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	OF-001.1	Ofício	Resposta a Solicitação de Liberação de Medições	GO-180	03/06/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de advertência com multa CCB	Gestão Contratual	Elaboração de minuta de advertência com aplicação de multa à CCB referente atraso na entrega dos projetos executivos	GO-147	03/06/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Parecer sobre aplicabilidade de sanções às executoras Caiapó, COPLAN e CCB	Parecer	Manifestação jurídica acerca da aplicabilidade de advertência à Caiapó e à Coplan e advertência com multa à CCB	Geral	03/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-004.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Dezembro/2025	GO-180	04/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-005.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Janeiro/2026	GO-180	04/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-006.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Fevereiro/2026	GO-180	04/06/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-143.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	05/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-161.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-461	05/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-162.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	05/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-163.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	05/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-164.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Terraplenagem	GO-178A	05/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-115.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Drenagem	GO-461	05/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-116.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Sinalização	GO-147	05/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-117.1	Parecer	Parecer Técnico - COPLAN 099/2026	GO-461	05/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-135.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	05/06/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 11	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a maio de 2026	Geral	05/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-134.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	08/06/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	POP-007.1	Procedimento Operacional Padrão	Procedimento Operacional Padrão Fiscalização e Gestão Ambiental.	Geral	09/06/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	POP-008.1	Procedimento Operacional Padrão	Procedimento Operacional Padrão Fiscalização em Segurança do Trabalho.	Geral	09/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-140.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	09/06/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Revisão da Circular Técnica nº 01/2026	Gestão Contratual	Avaliação jurídica da Circular Técnica nº 01/2026, que tem como objetivo estabelecer diretrizes e controle de atividades em turno estendido e 2º turno (período noturno) nas obras rodoviárias sob acompanhamento do IFAG.	Geral	09/06/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	CT-001.1	Circular Técnica	CIRCULAR TÉCNICA Nº. 01/2026	Geral	10/06/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-107.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	10/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-139.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	10/06/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise do Ofício nº 299/2026 da Caiapó	Gestão Contratual	Análise do Ofício nº 299/2026 da Caiapó enviado em resposta a advertência 02/2026 referente atraso na entrega dos projetos executivos	GO-180	10/06/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-141.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	11/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-165.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	11/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-166.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto Geométrico	GO-147	11/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-138.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	11/06/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-142.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	12/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-167.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto Geométrico e Estudos Geotécnicos	GO-180	12/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-009.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-178A	12/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-035.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	12/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-036.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	12/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-036.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	12/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-030.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	12/06/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Resposta ao Ofício nº 037/2026 da CCB	Gestão Contratual	Elaboração de resposta ao Ofício 037/2026 da CCB no qual a CCB referente atraso na entrega dos projetos executivos	GO-147	12/06/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise jurídica sobre DMT e diário de obra	Gestão Contratual	Análise jurídica ref. DMT na matriz de risco e registros no diário de obra pela CCB.	Geral	12/06/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Minuta de resposta ao Ofício MPO nº 2026005877498 e complementação de informações	Manifestação em processo administrativo	Elaboração de resposta ao Ofício MPO nº 2026005877498 e complementação de informações relativas à parceria	Geral	13/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-111.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Pavimentação	GO-147	15/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-116.2	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Sinalização	GO-147	15/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-110.1	Parecer	Parecer Técnico - Tratativas Relacionadas às Áreas Sujeitas à Desapropriação	Geral	15/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-118.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (jan/26)	GO-180	15/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-119.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (fev/26)	GO-180	15/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-004.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Janeiro/2026	GO-461	15/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-005.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Fevereiro/2026	GO-461	15/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-006.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Março/2026	GO-461	15/06/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Análise da implementação de melhorias no portal IFAG	Outros	Análise das melhorias implementadas no portal institucional do IFAG.	Geral	15/06/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Minuta de resposta ao DESPACHO Nº 132/2026/GOINFRA/PR-ASFUNDEINFRA - 21316	Comunicação escrita	Elaboração de resposta ao DESPACHO Nº 132/2026/GOINFRA/PR-ASFUNDEINFRA - 21316, sobre a reprogramação proposta pela GOINFRA no Contrato nº 01/2025/IFAG.	Geral	15/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-145.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	16/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-148.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	16/06/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Resposta ao Ofício 103/2026 da COPLAN	Gestão Contratual	Elaboração de resposta ao Ofício nº 103/2026 da COPLAN	GO-461	16/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-168.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-180	17/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-112.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Terraplenagem	GO-180	17/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-113.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Drenagem	GO-180	17/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-146.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	17/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-147.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	17/06/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-036.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	17/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-037.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	17/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-037.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	17/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-031.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	17/06/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião	Reunião	Reunião entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	17/06/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-144.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	18/06/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-149.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	18/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-042.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	18/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-120.1	Parecer	Parecer Técnico - Avanço de execução da obra GO-147	GO-147	18/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-010.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-180	18/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-121.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	18/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-122.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	18/06/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-150.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	19/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-125.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-180	19/06/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Minuta de resposta ao Ofício nº 5188/2026/GOINFRA	Comunicação escrita	Elaboração de minuta de resposta ao Ofício nº 5188/2026/GOINFRA.	Geral	19/06/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Revisão do Parecer Técnico PA-120 CAEP	Gestão Contratual	Foi encaminhado Ofício nº 4958/2026/GOINFRA ao IFAG sobre o avanço das obras da Rodovia GO-147. Em resposta, o CAEP elaborou o Parecer Técnico PA-120.	GO-147	19/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-124.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Drenagem	GO-147	22/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-126.1	Parecer	Parecer Técnico - interferência de edificação lindeira na faixa de domínio - GO-178A	GO-178A	22/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-127.1	Parecer	Parecer Técnico - Eventograma	GO-178A	22/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-151.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	22/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-004.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Dezembro/2025	GO-147	22/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-005.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Janeiro/2026	GO-147	22/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-006.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Fevereiro/2026	GO-147	22/06/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Ata de oitiva do Sr. Joberth no MPGO	Manifestação em processo administrativo	Acompanhamento do sr. Joberth, gerente financeiro do IFAG, em oitiva do MPGO.	Geral	22/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-170.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-180	23/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-152.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	23/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-169.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Terraplenagem	GO-178A	24/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-129.1	Parecer	Parecer Técnico Complementação DUP GO-180	GO-180	24/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-155.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	24/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	OF-002.1	Ofício	Ofício solicitando reunião com GEDES.	Geral	24/06/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Parecer sobre Ofício 103/2026 da COPLAN sobre o atraso no cumprimento do cronograma de entregas dos estudos e projetos	Parecer	Parecer sobre o Ofício 103/2026 da COPLAN em resposta a advertência sobre o atraso na entrega dos projetos executivos	GO-461	24/06/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-153.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	25/06/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-154.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	25/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-157.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	25/06/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise da Não Conformidade NC-023-1	Gestão Contratual	Análise e orientação jurídica acerca da Não Conformidade NC-023-1 a fim de subsidiar a condução administrativa da ocorrência e o eventual encerramento da NC-023-1.	GO-461	25/06/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-156.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	26/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-171.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto Geométrico	GO-180	26/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-173.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	26/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-130.1	Parecer	Parecer Técnico Paisagismo GO-147	GO-147	26/06/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-037.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	26/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-038.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	26/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-038.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	26/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-032.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	26/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-172.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-461	29/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-174.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Interferências	GO-461	29/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-175.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-180	29/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-176.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-180	29/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-177.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	29/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-178.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Interferências	GO-178A	29/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-123.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Pavimentação	GO-461	29/06/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-131.1	Parecer	Parecer Técnico - DUP	GO-178A	29/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-128.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade obra	GO-461	29/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-132.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade obra	GO-461	29/06/2026	Em elaboração
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3	Geral	30/06/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Parecer	Carta 012-2026 Carta CAEP aditivo contratual_v1 assinado	Geral	30/06/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	1.4. Fluxo de Manutenir Plataforma de Gestão Integrada (BI)	Geral	30/06/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	TIC - Painel de Gestão Integrada 11.06.26	Geral	30/06/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	TIC - Painel de Gestão Integrada 22.06.26	Geral	30/06/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	TIC - Painel de Gestão Integrada 30.06.26	Geral	30/06/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	TIC - Registros das Publicações e Manutenções de Junho.26	Geral	30/06/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	TIC - Sala de Situação - Manual Descritivo do Painel de Gestão Integrada	Geral	30/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-133.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (dez25)	GO-147	30/06/2026	Em elaboração
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-134.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (jan26)	GO-147	30/06/2026	Em elaboração
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-135.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (fev26)	GO-147	30/06/2026	Em elaboração
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RI-001.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-461	30/06/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	[CAEP. IFAG] Portfólio	Geral	30/06/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	[CAEP] Alocação de Recursos_Programa_Junho26	Geral	30/06/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Outros	05.06.26 - CAEP Avanço Global de Obra	Geral	30/06/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Outros	12.06.26 - CAEP Avanço Global de Obra	Geral	30/06/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Outros	16.06.26 - CAEP Avanço Global de Obra	Geral	30/06/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Outros	22.06.26 - CAEP Avanço Global de Obra	Geral	30/06/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Outros	4.1 - KPIs - Portfolio Painel de Gestão Integrada 11.06.26	Geral	30/06/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Outros	4.1 - KPIs - Portfolio Painel de Gestão Integrada 22.06.26	Geral	30/06/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Outros	4.1 - KPIs - Portfolio Painel de Gestão Integrada 30.06.26	Geral	30/06/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Ata de Reunião	[2026.05] Controle de Reuniões A&M.xlsx	Geral	30/06/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - 06.2026 - Matriz de Riscos - GO-147 - CCB	GO-147	30/06/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - 06.2026 - Matriz de Riscos - GO-178A - CCL	GO-178A	30/06/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - 06.2026 - Matriz de Riscos - GO-180 - Caiapó	GO-180	30/06/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - 06.2026. Matriz de Riscos - GO-461 - COPLAN	GO-461	30/06/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - 06.2026 - Matriz de Riscos - Programa	Geral	30/06/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - Extração Riscos IRIS_CGE_30.06.26	Geral	30/06/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - Painel inicial IRIS 30.06.26	GO-147	30/06/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - Painel IRIS - GO147 30.06.26	GO-147	30/06/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - Painel IRIS - GO178A 30.06.26	GO-178A	30/06/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - Painel IRIS - GO180 30.06.26	GO-180	30/06/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	4.3 - Painel IRIS - GO461 30.06.26	GO-461	30/06/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	4.3 - Painel IRIS - PROGRAMA 30.06.26	Geral	30/06/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Minuta de petição de apresentação de documentos ao MPGO	Manifestação em processo administrativo	Elaboração de minuta de petição de juntada e pasta com documentação objeto de compromisso firmado em oitiva do Sr. Joberth.	Geral	30/06/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Minuta de resposta ao Ofício MPGO nº 2026006689934	Manifestação em processo administrativo	Elaboração de minuta de resposta ao Ofício MPGO nº 2026006689934.	Geral	30/06/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo I - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - controle de recebimento e arquivamento de documentos e informações relevantes para a gestão contratual no período de recorte	Geral	30/06/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo II - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - perguntas aos responsáveis no período de recorte	Geral	30/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-038.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	01/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RI-002.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-178A	01/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-039.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	01/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-039.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	01/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RI-003.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-180	01/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-033.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	01/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RI-004.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-147	02/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-011.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-147	02/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-009.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-461	03/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-010.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-147	03/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-010.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-180	03/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-010.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	03/07/2026	Entregue
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	RL-P3.1-BI008-RGC-001	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Gestão da Certificação	Geral	07/07/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.06 - GO-147	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-147	07/07/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.06 - GO-178A	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-178A	07/07/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.06 - GO-180	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-180	07/07/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.06 - GO-461	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-461	07/07/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Relatório Grupo 1 - Relatório Mensal N°12	Relatório Mensal	Relatório Mensal da Entrega de Produtos de Junho	Geral	08/07/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Timeline de Acompanhamento Macro até junho 2026	Outros	Timeline de Coordenação de Pontos Macros	Geral	08/07/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Dashboard da Análise de Entrega de Produtos - junho	Outros	Dashboard Mensal de Análise de entregas CAEP	Geral	08/07/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Controle de Entrega de Produtos de junho	Outros	Planilha do Gerenciamento de entregas Mensal	Geral	08/07/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de junho	Outros	Planilha com o Quadro Financeiro Mensal	Geral	08/07/2026	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	P1.2 - Controle de Reuniões do mês de junho	Outros	Planilha do Controle de Reuniões	Geral	08/07/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 12	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a junho de 2026	Geral	Sem data	Em elaboração
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	P5.3 - Relatório de Gestão Contratual	Relatório Técnico	Relatório de Gestão Contratual referente às obras em andamento no período de recorte	Geral	Sem data	Entregue
5.4 RELATÓRIO DE CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	Manesco	P5.4 - Relatório Trimestral de Conformidade Legal em ESG	Relatório Técnico	Relatório trimestral de due diligence e conformidade ESG referente todas as obras em andamento	Geral	Sem data	Entregue

- Dashboard Analítico das Entregas Executadas em junho.

O painel analítico de entregas apresenta uma visão consolidada do desempenho do CAEP no mês de junho de 2026, permitindo à Coordenação Geral Executiva acompanhar, de forma sintética e visual, os principais indicadores de produção e o comportamento das frentes de trabalho ao longo do período. A ferramenta reúne informações essenciais para a gestão contratual, como o volume total de produtos emitidos, o percentual de execução, a distribuição por status, a participação das empresas consorciadas e o comparativo entre as frentes técnicas, jurídicas, administrativas e de governança.

No período, foram registrados 190 produtos, dos quais 185 (97%) foram efetivamente entregues e 5 (3%) permaneciam em elaboração, conforme demonstrado no dashboard consolidado. Os indicadores evidenciam a manutenção de um elevado nível de execução das atividades, refletindo a continuidade das ações de acompanhamento técnico, gestão contratual, fiscalização das obras e fortalecimento da governança do Programa.

A distribuição por frentes de atuação indica a predominância da área de Gestão de Engenharia, Meio Ambiente e Desapropriação, responsável por 122 documentos, seguida por Assessoramento e Consultoria Jurídica, com 27 entregas, Gestão de Projetos e Contabilidade, com 22, Coordenação Executiva, com 14, e Certificação de Projetos e Obras, com 5 documentos. Essa configuração reforça o caráter multidisciplinar da atuação do CAEP e demonstra a forte concentração das atividades nas frentes técnicas de engenharia e gerenciamento das obras, sem perder o suporte das áreas jurídicas, administrativas e de governança.

No recorte por empresa, observa-se a liderança da Dynatest, com 128 produtos entregues, seguida pela A&M Infra, com 30, pela Manesco, com 27, e pelo Bureau Veritas, com 5 documentos. A distribuição evidencia a predominância das atividades técnicas conduzidas pela equipe de engenharia, ao mesmo tempo em que confirma a atuação integrada das empresas responsáveis pela gestão estratégica, assessoramento jurídico e certificação independente.

A análise temporal demonstra que a produção esteve distribuída ao longo de todo o mês de junho, com picos de emissão registrados especialmente nos dias 29 e 30, destacando-se este último como o dia de maior volume de entregas do período, com 38 documentos registrados. Esses momentos concentram principalmente a consolidação de relatórios de acompanhamento de obras, notas técnicas, pareceres técnicos, boletins de medição, estudos de gestão de riscos, relatórios gerenciais e demais produtos associados ao fechamento dos ciclos semanais e mensais de acompanhamento.

O dashboard fortalece o papel da Coordenação Geral Executiva ao viabilizar uma visão integrada e transparente das entregas, apoiando a prestação de contas à GOINFRA, à SEINFRA e aos órgãos de controle. A centralização das informações permite monitorar prazos, avaliar o desempenho das frentes de trabalho, identificar tendências operacionais e antecipar pontos de atenção, contribuindo diretamente para a tomada de decisões estratégicas e para a mitigação de riscos.

Assim, apresenta-se o painel atualizado de análise das entregas do CAEP referente ao mês de junho de 2026, elaborado a partir da consolidação dos dados da planilha de controle e dos registros produzidos pelas empresas consorciadas. A visualização evidencia a manutenção de elevado desempenho produtivo no período, reafirmando a capacidade do consórcio de operar com eficiência, rastreabilidade e governança na execução de suas responsabilidades contratuais.

CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Dashboard: Análise de Entregas CAEP


185
Entregues

190
Total

Tipos de Produtos Entregáveis

- ☐ 1.1 COORDENAÇÃO GERAL
- ☐ 1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
- ☐ 1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL
- ☐ 1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES
- ☐ 2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- ☐ 2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO
- ☐ 2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO
- ☐ 3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO
- ☐ 3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
- ☐ 4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO
- ☐ 4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE
- ☐ 5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO
- ☐ 5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL
- ☐ 5.4 RELATÓRIO DE CONFORMIDADE LEGAL EM ESG


Produtos X Entrega

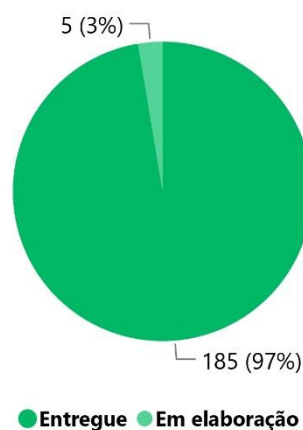


Quantidade de Documentos por Frente

	n°
Gestão de Engenharia, Meio Ambiente e Desapropriação	122
Assessoramento e Consultoria Jurídica	27
Gestão de Projetos e Contabilidade	22
Coordenação Executiva	14
Certificação de Projetos e Obras	5

Produtos por Empresa

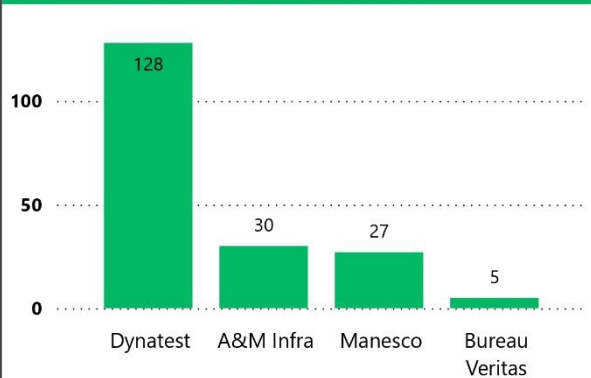

Controle de produtos mensal

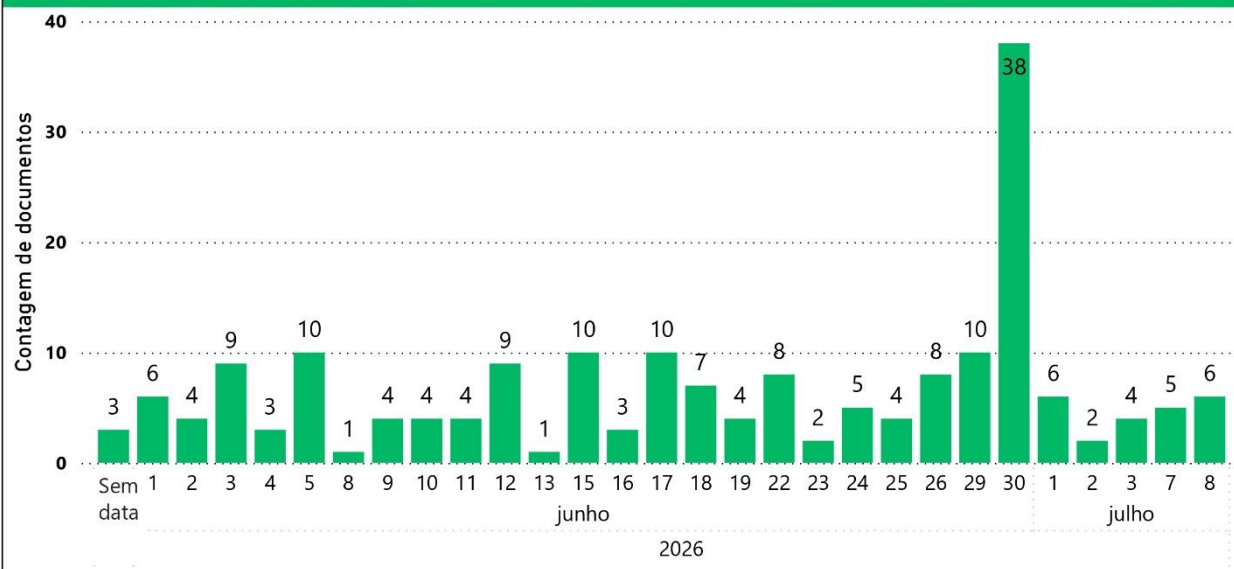

- Linha do Tempo do Progresso das Atividades Executadas em Junho de 2026

O mês de junho de 2026 caracterizou-se pela continuidade das atividades de acompanhamento, monitoramento e controle dos empreendimentos vinculados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA, sob coordenação do Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP). Embora não tenham sido registrados novos marcos relacionados à publicação de empreendimentos, ao recebimento ou julgamento de propostas, ao início de novas frentes executivas ou à emissão de licenças e protocolos ambientais, o período foi marcado por um importante avanço no âmbito da gestão administrativa e da prestação de contas do programa.

Nesse contexto, destaca-se o envio ao IFAG da Prestação de Contas Anual da Estruturadora, referente ao exercício de 2025, realizado em 25 de junho de 2026. A consolidação e encaminhamento dessa documentação representam uma etapa fundamental do processo de governança, reunindo informações técnicas, administrativas, financeiras e operacionais necessárias para demonstrar a correta aplicação dos recursos, a conformidade dos procedimentos executados e o atendimento às obrigações estabelecidas no Termo de Colaboração firmado entre SEINFRA, GOINFRA e IFAG.

As atividades desenvolvidas pelo CAEP concentraram-se na coordenação das ações de monitoramento técnico, administrativo, financeiro, jurídico e socioambiental das obras em andamento, bem como na consolidação das informações que compõem a prestação de contas, na análise documental e no acompanhamento dos processos relacionados à execução contratual e ao desempenho dos empreendimentos.

Esse contexto demonstra que o Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA permanece em uma fase de execução consolidada, na qual, além do acompanhamento contínuo das obras, assume especial relevância o fortalecimento dos mecanismos de transparência, controle e accountability, assegurando que a evolução física e financeira dos contratos esteja devidamente respaldada pelos instrumentos de prestação de contas.

Assim, a linha do tempo de junho de 2026 evidencia um período de estabilidade operacional, tendo como principal marco institucional o encaminhamento da Prestação de Contas Anual da Estruturadora ao IFAG, reforçando o compromisso do CAEP com a governança, a transparência e a regularidade administrativa do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA, além de consolidar seu papel como instância técnica responsável pela integração e acompanhamento das atividades desenvolvidas no âmbito dos empreendimentos estruturantes do Estado de Goiás.




Progresso das atividades executadas [Julho/2025]

Timeline



Progresso das atividades executadas [Agosto/2025]


Timeline

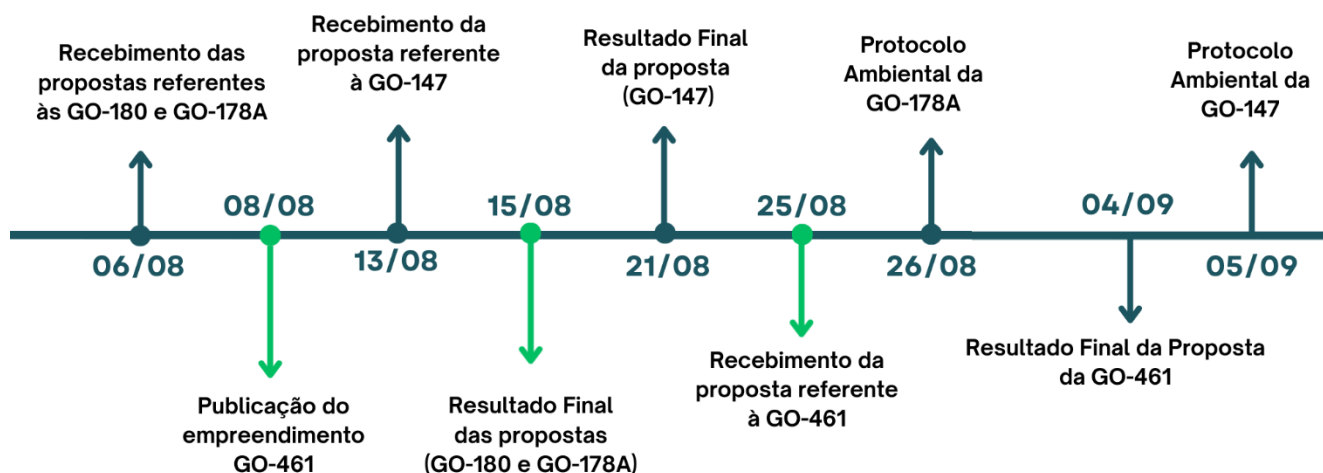




Progresso das atividades executadas [Setembro/2025]

Timeline

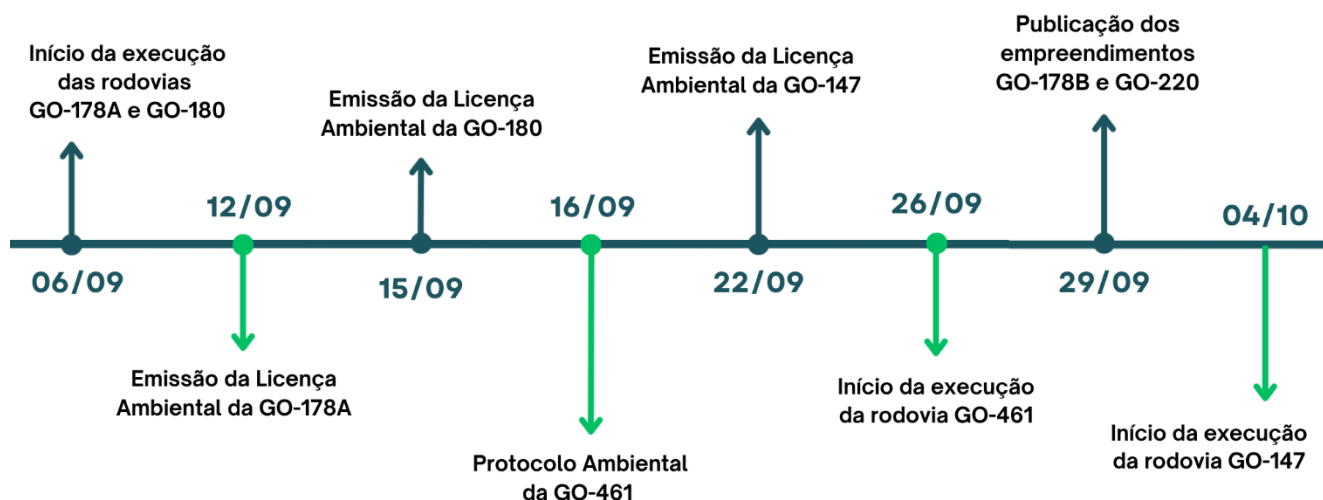

Progresso das atividades executadas [Outubro/2025]

Timeline

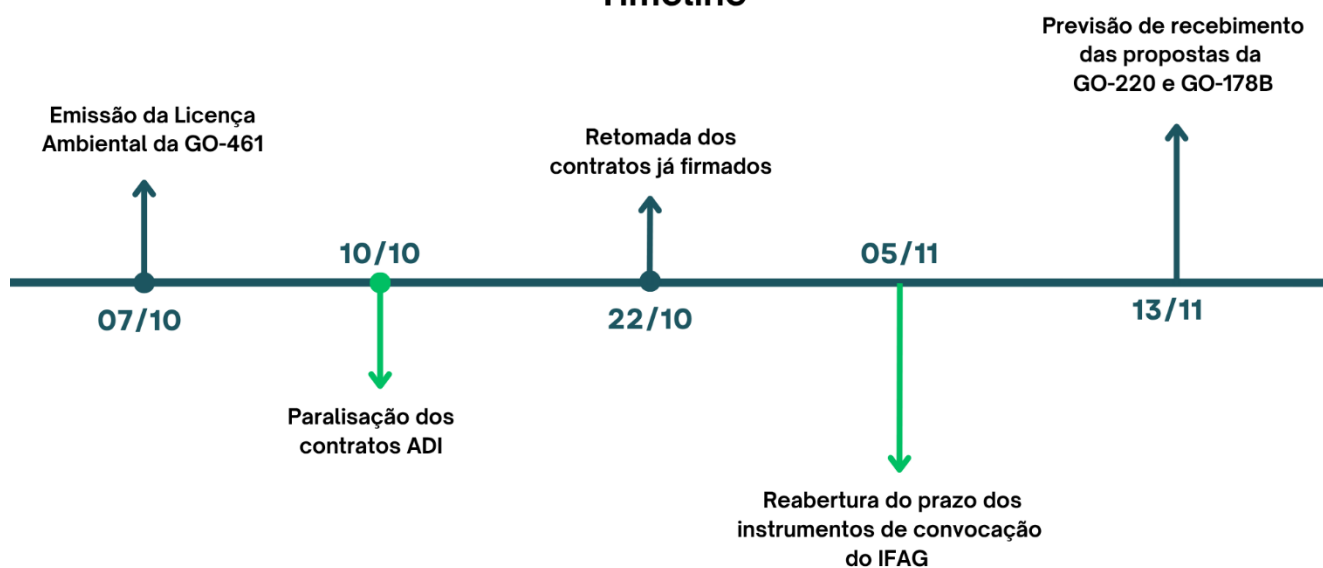




Progresso das atividades executadas [Novembro/2025]

Timeline



Progresso das atividades executadas [Dezembro/2025]

Timeline

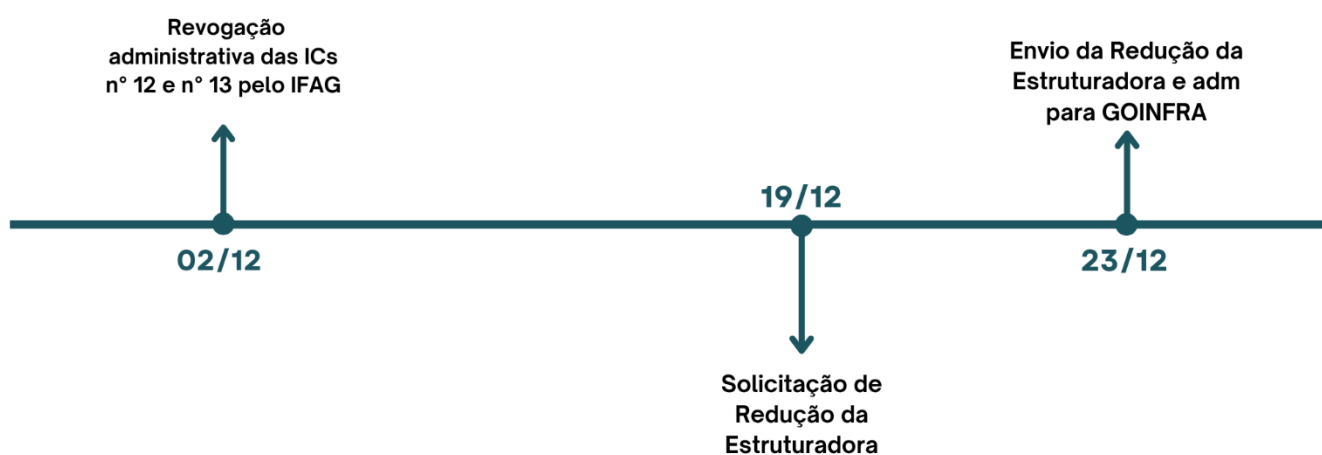




Progresso das atividades executadas [Janeiro/2026]

Timeline



Progresso das atividades executadas [Fevereiro/2026]


Timeline

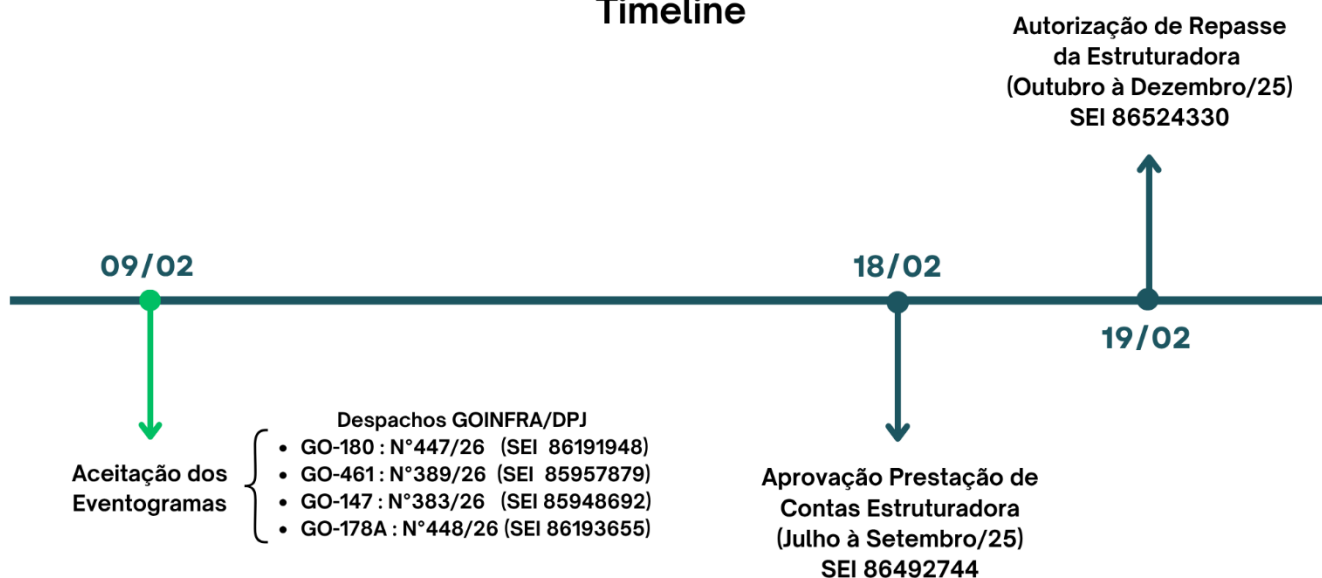




Progresso das atividades executadas [Março/2026]

Timeline

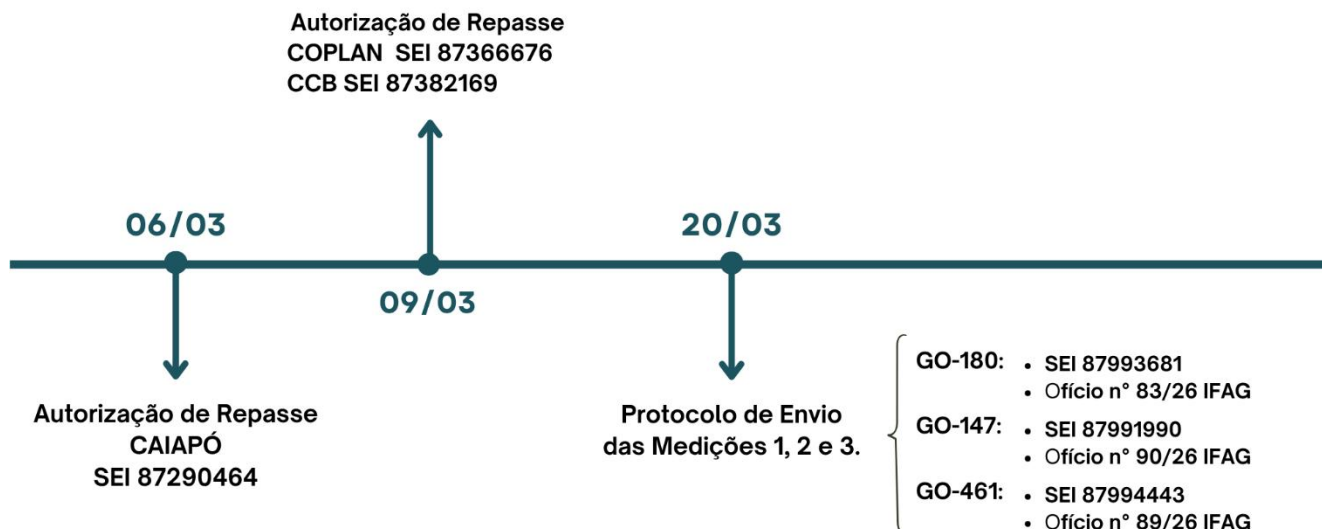

Progresso das atividades executadas [Abril/2026]


Timeline

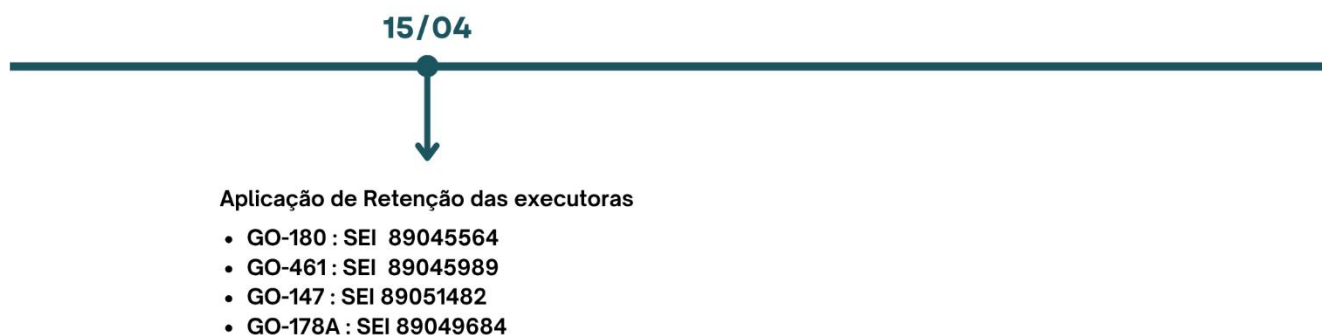




Progresso das atividades executadas [Maio/2026]

Timeline

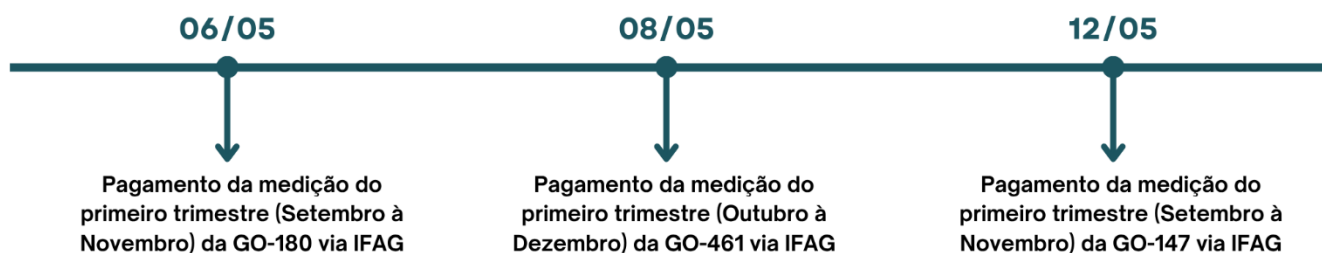

Progresso das atividades executadas [Junho/2026]

Timeline

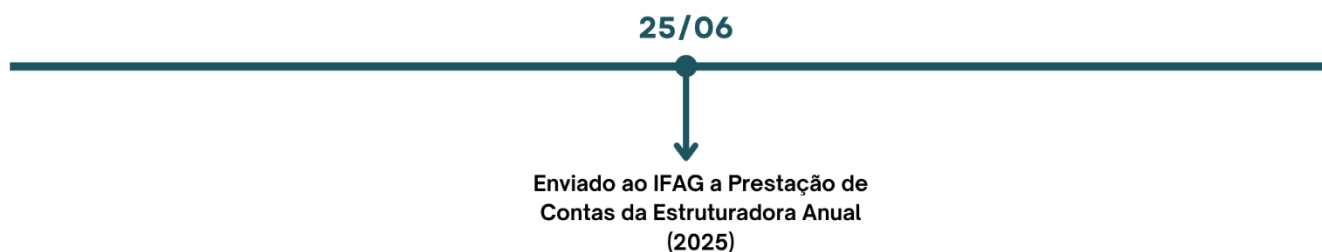

- Reuniões de Governança realizadas durante o mês de junho.

Durante o mês de junho, as reuniões de governança do Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP) concentraram-se na reorganização institucional do consórcio, no acompanhamento da execução contratual e na consolidação dos mecanismos de controle técnico, financeiro e administrativo do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA. A Coordenação Executiva manteve sua atuação como instância integradora entre IFAG, GOINFRA, empresas estruturadoras, certificadoras e assessoramento jurídico, assegurando alinhamento entre as equipes e rastreabilidade das decisões.

As agendas iniciais do mês trataram da revisão de documentos de análise de vantajosidade, com ênfase na necessidade de fundamentação técnica, identificação das fontes utilizadas e manutenção de lastro documental suficiente para responder a eventuais questionamentos administrativos ou jurídicos. Também foram acompanhados o andamento dos projetos por empresa, o avanço das frentes de terraplenagem, drenagem e bueiros, além dos impactos das decisões técnicas sobre prazos, custos e continuidade das obras.

No âmbito da governança interna do CAEP, as reuniões abordaram a nomeação interina da coordenação, a elaboração de proposta de reorganização do consórcio e a revisão da matriz de responsabilidades. Foram discutidas medidas de gestão de crise, definição de pontos focais operacionais, redistribuição de funções e priorização de demandas estratégicas, incluindo a estruturação de painéis one-page por empreendimento, a preparação de apresentações ao Ministério Público e a organização de sala de situação e reuniões de trabalho.

As reuniões conjuntas entre CAEP, IFAG e GOINFRA concentraram-se na análise das prestações de contas, na identificação de documentos incompletos e na necessidade de adoção de checklists para verificação das conformidades técnicas e administrativas. Também foram tratados os procedimentos de reprogramação, a complementação de justificativas, a formalização das comunicações por e-mail ou SEI e a necessidade de ratificação prévia de determinados atos pelos gestores responsáveis.

No campo técnico e contratual, foram avaliadas alterações de soluções de engenharia, incluindo alternativas de pavimentação, intervenções em obras de arte e possíveis impactos em custos e cronogramas. As agendas também aprofundaram o debate sobre a interpretação do limite de variação de 10% dos serviços, seus reflexos nos eventogramas e a necessidade de alinhamento jurídico com a Procuradoria e a Manesco, a fim de assegurar aplicação uniforme das regras contratuais e adequada distribuição dos riscos.

Ao longo do mês, também foram discutidos o fluxo de repasses e pagamentos, a defasagem entre medições e liberações financeiras e a necessidade de antecipar a elaboração das próximas prestações de contas para regularizar o passivo existente. Paralelamente, foram acompanhados os riscos operacionais relacionados a desapropriações, licenciamento ambiental, disponibilidade de recursos, condições climáticas e possibilidade de paralisação ou abandono de frentes de serviço.


Em síntese, junho foi marcado pela reorganização dos fluxos de governança, pelo fortalecimento da articulação entre CAEP, IFAG e GOINFRA e pelo aprofundamento dos controles relacionados à prestação de contas, reprogramação, certificação e gestão de riscos. As reuniões realizadas no período contribuíram para maior clareza na distribuição das responsabilidades, melhoria da qualidade documental e fortalecimento da capacidade de resposta do CAEP diante dos desafios técnicos, contratuais e institucionais do programa.

CAEP Controle de Reuniões			CAEP CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS
Data	Participantes	Assuntos	
03/06/2026	CAEP: Edson, Victor GOINFRA: Alessandra, Rafael IFAG: Eliseu, Sérgio	Reunião de Governança CAEP/IFAG/GOINFRA - pauta: - Revisão de documentos de análise de vantajosidade, com ênfase na necessidade de rastreabilidade técnica, fontes e metodologia lastro documental a questionamentos legais; - Atualização e validação de documentação técnica, incluindo metodologia e links para estudos internos; - Acompanhamento de andamento de projetos por empresa, com apresentação de BI mostrando status de entregas; - Status de execução das obras contratadas, com indicação de avanço de frentes de terraplenagem, drenagem e bueiros; - Análise comparativa de cenários operacionais e impacto de decisões em prazos, custos e continuidade dos serviços; - Coordenação de cronograma de projetos, com indicação de notificações formais para empresas em atraso; - Procedimentos administrativos e formalizações necessárias, incluindo atualizações de memoriais e projetos complementares; - Andamento de execução de obras e alocação de recursos, com menção a possibilidade de reunião com diretores das empreiteiras para maior engajamento nas frentes críticas; - Procedimentos de desapropriação e licenciamento ambiental, com dependência de publicação de decreto para viabilizar DUP.	
11/06/2026	Representantes CAEP: Dynatest, Bureau Veritas, Alvarez & Marsal e Manesco	Reunião de Governança CAEP - pauta: - Nomeação interina e montagem de proposta de reorganização do CAEP; - Prestação de contas, reprogramação e repasse; - Questões de governança e matriz de responsabilidades; - Desconforto inicial com proposta e reação do IFAG; - Gestão de crise; - Preocupações técnicas e risco de tentativa de interferência política; - Repriorização das ações de governança; - Painel de contratos, agendamento de reunião e workshop com TCE; - Necessidade de estratégia contratual clara para certificação; - Benefícios e formato da aproximação interdisciplinar; - Demandas corriqueiras versus estratégicas; - Painel one-page por obra e apresentação ao Ministério Público; - Agendamento de reuniões de trabalho e sala de situação;	
11/06/2026	CAEP: Edson, Victor GOINFRA: Alessandra, Rafael, Reginaldo IFAG: Eliseu	Reunião de Governança CAEP/IFAG/GOINFRA - pauta: - Comunicação junto à Assessoria, necessidade de formalização via SEI ou email; - Discussão da reprogramação, necessidade de complementação de justificativas e racional; - Debate sobre entendimento de aditivos de 10%, consultar entendimento da Procuradoria e da Manesco; - Análise de documentação de prestação de contas; - Acompanhamento de andamento dos projetos e das obras; - Análise de impactos em contratos e cronograma; - Avaliação de riscos operacionais.	
18/06/2026	CAEP: Edson, Victor, Lara GOINFRA: Alessandra, Rafael, Reginaldo IFAG: Eliseu	Reunião de Governança CAEP/IFAG/GOINFRA - pauta: - Análise de documentação de prestação de contas, com indicação de pendências na apresentação de documentos técnicos e conformidades; - Questões de conformidade documental, incluindo identificação de documentos incompletos e necessidade de checklist presencial; - Avaliação de alterações em soluções técnicas, como ponte em obra 180 e alternativas de pavimentação, com análise de impacto técnico-financeiro; - Acompanhamento de andamento das obras contratadas, com status por frente e identificação de atrasos; - Prazos e procedimentos administrativos, incluindo necessidade de ratificação por gestor com sete dias de antecedência; - Consolidação de informações técnicas provenientes de diferentes entidades, com clarificação de responsabilidades e documentação de controle tecnológico; - Análise de impactos em contratos e cronograma decorrentes de alterações de projeto e disponibilidade de recursos; - Atualizações de status por obra, com indicação de avanço físico, financeiro e pontos de atenção específicos; - Avaliação de riscos operacionais, incluindo possibilidade de paralisação por questões de desapropriação ou eventos climáticos.	
18/06/2026	Representantes CAEP: Dynatest, Bureau Veritas, Alvarez & Marsal e Manesco	Reunião de Governança CAEP - pauta: - Consolidação de questões administrativas, financeiras e técnicas do consórcio; - Reprogramação e análise orçamentária, com discussão sobre deficiências em documentação e necessidade de rastreabilidade em complementações; - Fluxo de repasses e pagamentos, com expectativa de liberação de repasses ao IFAC e status de prestações de primeiro trimestre; - Acompanhamento de execução em campo, com indicação de avanço físico e financeiro por obra e identificação de riscos de abandono; - Movimentação e redistribuição de pessoal, com apresentação de nova assessora operacional e ponto focal operacional; - Definição de pontos focais operacionais para respostas rápidas ao cliente e consolidação de informações; - Transição de funções de pessoal com preparação de relatórios e alinhamento de assessoramento; - Processamento de repasses e pagamentos, com análise de defasagem entre medições e repasses; - Análise de variações contratuais conforme matriz de risco, com discussão sobre interpretação de limite de 10% e seu impacto em eventogramas; - Discussão de questões técnicas por obra, incluindo avaliação de soluções e impactos de custo e cronograma.	
25/06/2026	GOINFRA: Reginaldo, Alessandra, Felipe, Rafael IFAG: Sergio, Eliseu CAEP: Edson, Victor, Lara Costa	Reunião de Governança CAEP/IFAG/GOINFRA - pauta: - Acompanhamento de andamento dos projetos e das obras; - Análise de impactos em contratos e cronograma; - Avaliação de riscos operacionais; - Comunicação de assuntos das supervisoras serem por email; - Debate sobre entendimento de variação de serviços limitados a 10%; - Análise de documentação de prestação de contas trimestral e sinalização para alinhamento de elaboração das próximas prestações de forma antecipada para colocar as medições em dia.	

- Análise do processo de medição do mês anterior - junho/2026 - 11ª medição

A medição foi estruturada sob a lógica formal de avaliação por produto, com base em critérios previamente definidos pela fiscalização, os quais consideram, de forma ponderada, a qualidade do atendimento e da equipe técnica, a qualidade da documentação e dos relatórios, bem como a conformidade com os prazos, convertendo o resultado avaliativo em parâmetro de pagamento dos serviços efetivamente comprovados. Tal sistemática reforça a robustez do processo de medição, assegura transparência, uniformidade de critérios e maior segurança institucional quanto à regularidade da despesa.

QUADRO FINANCEIRO CONSOLIDADO — 11ª MEDIÇÃO					
Contrato n.º 01/2025 Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos – CAEP					
Data de Assinatura do Contrato: 10/07/2025		Vigência: 36 meses		Referência: 11ª Medição – Junho/2026	
Valor Total do Contrato	Valor Acumulado Medido	Valor da 11ª Medição	Saldo Contratual	% Acumulado Executado	Valor Inicial do Contrato
R\$ 21.912.482,34	R\$ 8.561.369,01	R\$ 567.544,84	R\$ 13.351.113,34	39,07%	R\$ 36.627.289,54

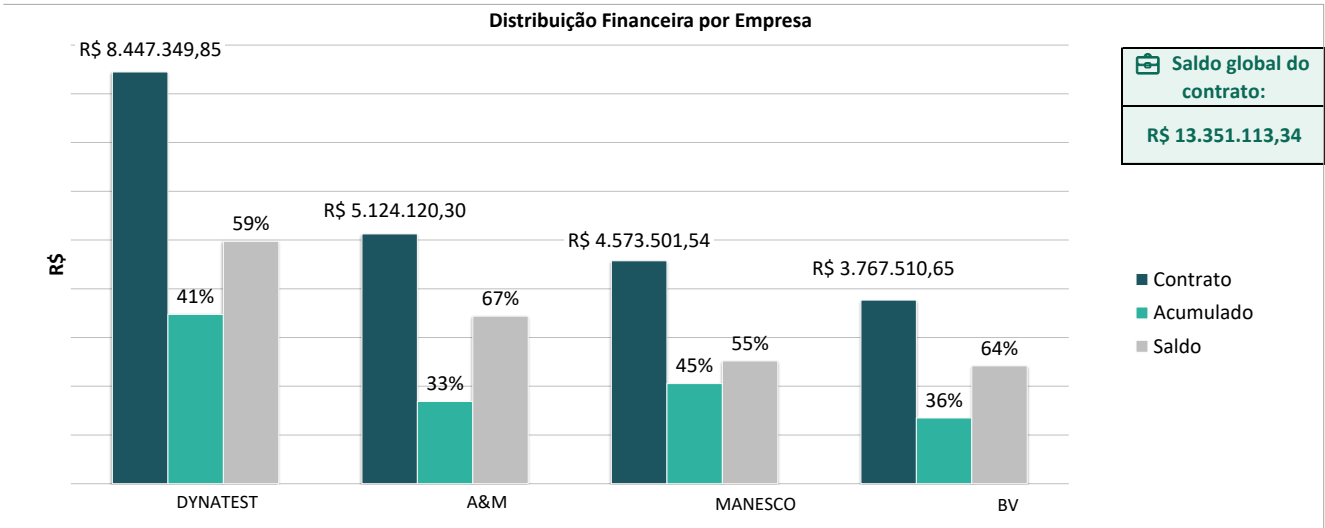

⚠ OBSERVAÇÃO SOBRE ADITIVO CONTRATUAL
Os valores apresentados a partir da 7ª medição consideram a readequação dos preços e quantitativos proposto na minuta do termo aditivo contratual.

RESUMO FINANCEIRO POR EMPRESA — 11ª MEDIÇÃO						
Empresa	Valor Mês	Valor Acumulado	Valor Contrato	% Executado	Saldo	Status
DYNA	R\$ 219.350,49	R\$ 3.472.563,99	R\$ 8.447.349,85	41,11%	R\$ 4.974.785,86	Processado
A&M	R\$ 151.448,70	R\$ 1.686.495,75	R\$ 5.124.120,30	32,91%	R\$ 3.437.624,55	Processado
MANESCO	R\$ 75.479,24	R\$ 2.053.760,55	R\$ 4.573.501,54	44,91%	R\$ 2.519.740,99	Processado
BV	R\$ 121.266,41	R\$ 1.348.548,71	R\$ 3.767.510,65	35,79%	R\$ 2.418.961,94	Processado
TOTAL	R\$ 567.544,84	R\$ 8.561.369,01	R\$ 21.912.482,34	39,07%	R\$ 13.351.113,34	

Sob a perspectiva físico-financeira, a 11ª medição totaliza R\$ 567.544,84, elevando o montante acumulado medido para R\$ 8.561.369,01, frente ao valor global contratual de R\$ 21.912.482,34 , o que corresponde a 39,07% de execução acumulada do contrato. O quadro financeiro demonstra, ainda, que a medição em referência permanece vinculada à readequação econômica decorrente da proposta de supressão relacionada ao termo aditivo em discussão, conforme registrado na própria planilha de medição, a qual consigna que os valores previstos para a competência foram estimados com base na proposta

comercial de supressão, permanecendo necessária a aprovação e validação pela **GOINFRA** para formalização do aditivo e subsequente desembolso financeiro. No mesmo sentido, o painel consolidado evidencia saldo contratual remanescente de **R\$ 13.351.113,34**, reforçando a necessidade de acompanhamento contínuo da execução físico-financeira, da compatibilização dos valores medidos com o escopo efetivamente vigente e da manutenção da prudência administrativa quanto à liberação financeira.

RESUMO FINANCEIRO POR EMPRESA — 11ª MEDIÇÃO				
Contrato n.º 01/2025 CAEP Referência: Junho/2026				
Empresa	Valor Mês	Valor Acumulado	% Executado	Saldo Contratual
DYNA	R\$ 219.350,49	R\$ 3.472.563,99	41,11%	R\$ 4.974.785,86
A&M	R\$ 151.448,70	R\$ 1.686.495,75	32,91%	R\$ 3.437.624,55
MANESCO	R\$ 75.479,24	R\$ 2.053.760,55	44,91%	R\$ 2.519.740,99
BV	R\$ 121.266,41	R\$ 1.348.548,71	35,79%	R\$ 2.418.961,94
TOTAL	R\$ 567.544,84	R\$ 8.561.369,01	39,07%	R\$ 13.351.113,34

No que se refere ao desempenho técnico das entregas reconhecidas na competência, verifica-se que os produtos efetivamente medidos foram, em sua maior parte, recebidos com avaliação satisfatória para fins de pagamento, havendo, contudo, ocorrência pontual de redutor financeiro nos itens cuja **nota avaliativa** foi fixada em **75,00%**. Os produtos medidos no período com **nota avaliativa de 100,00%** compreendem os Produtos **1.1, 2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 4.3 e 5.3**, ao passo que os Produtos **1.2, 1.4, 4.1, 4.2 e 5.1** foram reconhecidos com **nota avaliativa de 75,00%**, repercutindo proporcionalmente nos respectivos valores finais medidos. Registra-se, ainda, que o **Produto 1.3 – Comunicação Social** permaneceu sem medição, em consonância com a lógica de supressão já refletida na planilha financeira, ao passo que outros produtos sem fato gerador ou sem materialidade de medição no período também não repercutiram financeiramente. Do ponto de vista financeiro e de governança da medição, o conjunto dos itens reconhecidos demonstra continuidade da execução contratual, ainda que com apontamentos avaliativos específicos que impactaram parcialmente os valores medidos na competência.

BASE TÉCNICA - PLANILHA DE MEDIÇÃO IFAG (11ª MEDIÇÃO)									
ID	Produto	Unidade	Valor Unit.	Valor Contrato	% Acum.	Qntd.	Valor Final	Valor Acum.	Empresa
1.1	COORDENAÇÃO GERAL	MENSAL	R\$ 59.212,49	R\$ 2.095.854,28	38,00%	1,00	R\$ 59.212,49	R\$ 733.967,04	DYNA
1.2	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	MENSAL	R\$ 8.503,60	R\$ 615.391,05	76,08%	1,00	R\$ 6.377,70	R\$ 417.682,35	DYNA
1.3	COMUNICAÇÃO SOCIAL	MENSAL	R\$ 28.778,99	R\$ 180.720,54	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 180.720,54	A&M
1.4	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	MENSAL	R\$ 23.940,25	R\$ 872.086,22	39,27%	1,00	R\$ 17.955,19	R\$ 315.475,41	A&M
2.1	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	MENSAL	R\$ 58.407,02	R\$ 2.001.747,91	35,51%	1,00	R\$ 58.407,02	R\$ 658.386,53	DYNA
2.2	ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	POR OBRA	R\$ 116.110,78	R\$ 851.091,98	36,15%		R\$ 0,00	R\$ 307.693,53	DYNA
2.3	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LIC	POR OBRA		R\$ 109.380,60	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 109.380,60	DYNA
2.4	GERENCIAMENTO TÉCNICO	OBRA x MÊS	R\$ 23.838,32	R\$ 2.288.478,72	37,93%	4,00	R\$ 95.353,28	R\$ 797.429,95	DYNA
2.5	RECEBIMENTO DE OBRA	POR OBRA	R\$ 9.345,33	R\$ 37.381,32	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	DYNA
2.6	LICENÇA AMBIENTAL	POR OBRA		R\$ 448.023,99	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 448.023,99	DYNA
3.1	RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	MENSAL	R\$ 47.233,29	R\$ 1.775.628,33	42,46%	1,00	R\$ 47.233,29	R\$ 689.262,55	BV
3.2	PLANOS DE INSPEÇÃO	POR OBRA		R\$ 159.562,60	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 159.562,60	BV
3.3	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	OBRA x MÊS	R\$ 18.508,28	R\$ 1.832.319,72	28,50%	4,00	R\$ 74.033,12	R\$ 499.723,56	BV
4.1	REPORTE DO PORTFÓLIO	MENSAL	R\$ 73.357,00	R\$ 2.630.004,74	38,08%	1,00	R\$ 55.017,75	R\$ 924.454,49	A&M
4.2	CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	OBRA x MÊS	R\$ 9.418,33	R\$ 866.486,36	7,34%	9	R\$ 63.573,73	R\$ 63.573,73	A&M
4.3	GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	MENSAL	R\$ 14.902,03	R\$ 574.822,43	38,15%	1,00	R\$ 14.902,03	R\$ 202.271,58	A&M
5.1	ASSESSORIA JURÍDICA CONTÍNUA	MENSAL	R\$ 30.672,92	R\$ 1.141.600,88	40,85%	1,00	R\$ 23.004,69	R\$ 428.455,49	MANESCO
5.2	ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	POR OBRA		R\$ 557.270,70	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 557.270,70	MANESCO
5.3	RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	MENSAL	R\$ 52.474,55	R\$ 1.953.025,63	41,74%	1,00	R\$ 52.474,55	R\$ 746.110,98	MANESCO
5.4	CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	MENSAL	R\$ 66.631,22	R\$ 921.604,33	37,70%		R\$ 0,00	R\$ 321.923,38	MANESCO

Nesse sentido, registra-se que, no universo dos produtos avaliados na **11ª medição**, houve apontamentos pontuais refletidos nas notas parciais atribuídas a determinados produtos, com correspondente repercussão financeira sobre a medição do período. Ainda assim, observa-se a preservação da regularidade do fluxo contratual e da continuidade da execução nos ciclos subsequentes, devendo os aspectos avaliativos registrados ser acompanhados no âmbito ordinário da fiscalização e da gestão contratual.

Por fim, apresenta-se o acompanhamento financeiro das medições do **CAEP** até o mês anterior:

LINHA DO TEMPO DE MEDIÇÕES — STATUS FINANCEIRO						
Contrato n.º 01/2025 CAEP Medições 1 a 11						
● Pago	● Processado	● Em análise				
Empresa	MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO 2	MEDIÇÃO 3	MEDIÇÃO 4	MEDIÇÃO 5	MEDIÇÃO 6
Empresa	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago
DYNA	R\$ 312.192,07	R\$ 389.743,01	R\$ 739.212,32	R\$ 270.833,58	R\$ 373.090,29	R\$ 319.147,94
A&M	R\$ 133.535,85	R\$ 200.293,76	R\$ 200.293,76	R\$ 122.760,04	R\$ 200.293,75	R\$ 200.293,76
MANESCO	R\$ 274.536,70	R\$ 285.876,79	R\$ 406.518,01	R\$ 114.510,63	R\$ 224.791,05	R\$ 272.827,03
BV	R\$ 58.320,94	R\$ 127.367,69	R\$ 118.619,99	R\$ 93.505,33	R\$ 182.892,53	R\$ 161.510,16
TOTAL	R\$ 778.585,56	R\$ 1.003.281,25	R\$ 1.464.644,08	R\$ 601.609,58	R\$ 981.067,62	R\$ 953.778,89

LINHA DO TEMPO DE MEDIÇÕES — STATUS FINANCEIRO					
Contrato n.º 01/2025 CAEP Medições 1 a 11					
● Pago	● Processado	● Em análise			
Empresa	MEDIÇÃO 7	MEDIÇÃO 8	MEDIÇÃO 9	MEDIÇÃO 10	MEDIÇÃO 11
Empresa	Pago	Pago	Pago	Pago	Processado
DYNA	R\$ 184.565,14	R\$ 221.476,39	R\$ 221.476,39	R\$ 221.476,39	R\$ 219.350,49
A&M	R\$ 140.978,27	R\$ 112.199,28	R\$ 112.199,28	R\$ 112.199,28	R\$ 151.448,70
MANESCO	R\$ 83.147,47	R\$ 83.147,47	R\$ 149.778,69	R\$ 83.147,47	R\$ 75.479,24
BV	R\$ 121.266,41	R\$ 121.266,41	R\$ 121.266,41	R\$ 121.266,41	R\$ 121.266,41
TOTAL	R\$ 529.957,29	R\$ 538.089,55	R\$ 604.720,77	R\$ 538.089,55	R\$ 567.544,84

2.2 Produto 1.2 – Relatório de Relações Institucionais

2.2.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.2, referente ao Relatório de Relações Institucionais, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório detalhado que descreve atividades realizadas no período em atendimento às diversas interrelações institucionais necessárias à boa execução do portfólio. Deverá contemplar no mínimo:

- *Relatório de Relacionamento Institucional: relatório que descreve a interação entre as diversas áreas do projeto, garantindo que o trabalho de cada setor (engenharia, certificação, contabilidade e jurídico) esteja alinhado e coordenado. Este relatório monitorará a integração dos processos e identificará oportunidades de integração entre as atividades.”*

2.2.2 Produtos desenvolvidos no período

- Integração Institucional e Consolidação de Processos executados em junho

Durante o mês de junho, o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP) manteve agenda contínua de reuniões técnicas e de alinhamento operacional voltadas ao acompanhamento da execução das obras, à análise de projetos, medições, certificações e não conformidades, bem como ao fortalecimento dos instrumentos de governança e controle do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA. As agendas envolveram representantes do próprio CAEP, das equipes técnicas da Dynatest, da Alvarez & Marsal, da Bureau Veritas, da Manesco, do Instituto para Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (IFAG) e da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).

As pautas desenvolvidas ao longo do mês concentraram-se na padronização dos processos internos, na revisão da estrutura de governança e no fortalecimento do PMO de execução. Foram discutidas a criação e revisão de instruções técnicas, identificadores e procedimentos operacionais, a estruturação de fluxogramas para os principais processos e a consolidação de critérios de comunicação e responsabilidade entre as equipes. Também foram reforçados o papel contratual do eventograma, a regra de avanço físico de até 50% sem projeto executivo completo e o limite de variação contratual de 10%, considerados parâmetros essenciais para o acompanhamento das obras e a avaliação de impactos financeiros.

As reuniões de alinhamento com a Dynatest concentraram-se no acompanhamento das frentes de obra e das entregas de projetos, com destaque para pendências nas disciplinas de geotecnia, drenagem, geometria, desapropriação, pavimentação e licenciamento ambiental. Foram discutidos atrasos de construtoras, substituição de equipes, inconsistências entre o executado e o anteprojeto e riscos decorrentes da realização de serviços sem documentação técnica suficientemente aprovada. Também foram acompanhados os avanços das rodovias GO-180, GO-147, GO-178 e GO-461, incluindo paralisações, liberações locais de execução e necessidade de revisão de soluções técnicas.

No âmbito das medições e da certificação, foram debatidas a harmonização entre as planilhas apresentadas pelas executoras e os controles internos do CAEP, a necessidade de documentação completa por competência e a consolidação de diários de obra, fichas, registros fotográficos, notas técnicas e controles tecnológicos. As agendas evidenciaram que pendências documentais, ausência de evidências e elevado número de não conformidades em aberto continuam impactando a aprovação das medições, a certificação dos serviços e a regularidade dos repasses financeiros.

As discussões técnicas também abrangeram não conformidades em obras de drenagem, bueiros e juntas de aduelas, com necessidade de compatibilização entre anteprojeto, projeto executivo, normas técnicas e serviços realizados em campo. Foram avaliadas soluções como elementos moldados in loco e pré-moldados, uso de manta geotêxtil e selamento com argamassa, substituição de peças danificadas e necessidade de evidências fotográficas para assegurar rastreabilidade. Em paralelo, foram analisados riscos contratuais associados à alteração de materiais, pedreiras, soluções de pavimentação e demais mudanças com potencial impacto no limite financeiro previsto contratualmente.

As reuniões integradas entre CAEP, Manesco, Bureau Veritas e Alvarez & Marsal concentraram-se na reorganização operacional do consórcio, na definição de pontos focais e na diferenciação entre o PMO de execução e a gestão institucional. Também foram tratados o fluxo de faturamento e emissão de notas, os procedimentos de certificação e acreditação, a necessidade de maior presença institucional em campo e a preparação de materiais para apresentação à diretoria do IFAG. Nesse contexto, foram propostas reuniões mais decisórias, maior participação das lideranças e adoção de estratégias coordenadas para enfrentamento de riscos financeiros, operacionais e institucionais.

Em síntese, junho foi marcado pela consolidação de um modelo de governança mais estruturado, pelo fortalecimento dos controles técnicos e documentais e pela intensificação do acompanhamento das medições, projetos e não conformidades. As atividades realizadas ampliaram a integração entre as empresas consorciadas e os órgãos envolvidos, contribuíram para maior clareza na distribuição das responsabilidades e reforçaram a rastreabilidade dos processos administrativos, técnicos e financeiros associados aos empreendimentos do FUNDEINFRA.

Destaca-se, adicionalmente, que, embora tenha sido apontada, no âmbito da análise da 2ª prestação de contas, a necessidade de inclusão das atas completas das reuniões realizadas, optou-se, neste produto, pela apresentação consolidada das informações em formato de síntese técnica. Tal diretriz decorre da necessidade de assegurar maior confiabilidade na consolidação dos temas tratados, compatibilização entre os diversos stakeholders envolvidos e padronização das informações apresentadas. Ressalta-se que a apresentação estruturada em planilha, contendo datas, participantes e assuntos, permite adequada rastreabilidade das atividades executadas, bem como melhor visualização da evolução temporal das ações, garantindo transparência, objetividade e aderência às diretrizes de governança do programa.

Data	Participantes	Assuntos
02/06/2026	Dynatest: Guilherme Soares, Luiz Henrique Costa, Josiley Prado, Victor Castro, Alvaro Laquis, Emine Lauara, Lara Cristina CAEP: Edson Shimizu	Reunião de Alinhamento CAEP/Dynatest - resumo ata: A reunião integrou acompanhamento de projetos e obras visando alinhamento entre campo e escritório, com foco em prazos de entrega, certificação de projetos, riscos contratuais e tratamento de não conformidades. - Projetos: foi reiterado que os principais projetos devem ser entregues até sexta-feira, enquanto demais seguem prazos regulares. A equipe de projetos (destaque para Álvaro e Lara) pediu comparativos anteprojeto vs. executivo para aferir impactos orçamentários; certificação de projetos permanece escopo dos executores e disciplinas geometrias, drenagem, bueiros e pavimentação têm prioridade. - Prazos e orçamento: entregas de CCL foram postergadas, com risco de migração de prazos para final de junho. A Goinfra prepara notificações com teor de multa para empresas em atraso; adotou-se abordagem em dois níveis para alterações (validação técnica e análise de impacto financeiro) e ficou claro o limite contratual de variação de $\pm 10\%$ segundo TCE/Goinfra, sem cumulatividade que exceda o teto. - Não conformidades e fiscalização: Preocupação com decisões de obra “à revelia” (descarregamentos com ensaios fora de especificação) e necessidade de cronograma executivo semanal detalhado para subsidiar certificação e evitar retenção de recursos. Coplan e Caiapó receberão advertência sem multa; CCB receberá advertência com multa. - Medição e documentação processual: A equipe estrutura a Instrução Técnica Interna (IT4) com fluxogramas de processos principais e circulá-la-á quando finalizada. - Relações contratuais e ambientais: tratou-se formalização do Manual de Contratação Integrada; a gerência ambiental avaliou possibilidade de doação de cascalho por terceiros e procedimentos de supressão vegetal e limpeza foram alinhados para identificar trechos sem supressão.
09/06/2026	Dynatest: Guilherme Soares, Luiz Henrique Costa, Josiley Prado, Victor Castro, Alvaro Laquis, Emine Lauara, Lara Cristina CAEP: Edson Shimizu	Reunião de Alinhamento CAEP/Dynatest - resumo ata: A reunião consolidou diretrizes de governança, fiscalização técnica, processos de medição e status das frentes de obra do contrato CAEP, com foco no fortalecimento do PMO interno, padronização dos processos e integração com a Álvares para apoio à execução contratual. - Governança e PMO: Apresentada a estrutura de governança do Grupo 2/Dynatest no CAEP, com inclusão da Álvares para ampliar a visão de execução. Reforçada a revisão/criação de IT004, IDs e POPs para padronização e proteção do programa. - Regras contratuais: Eventograma definido como base contratual obrigatória da executora. Reforçadas a regra dos 50% de avanço físico sem projeto executivo completo e a variação contratual macro de $+10\%/-10\%$, não compensável entre si. - Medição e certificação: Discutida a harmonização entre planilhas da executora e internas, validação por formulário, exigência de relatório de atendimento às não conformidades e consolidação de diários, fichas, fotos e notas técnicas de medição. - Fiscalização e compliance: Relatadas inconsistências na atuação da supervisora, conflitos de autoridade e pendência de formalização em aditivo ao TAG. Também foi apontada ausência de profissionais SST/ambiental em algumas frentes. - Status das frentes: Caiapó parado por pendências documentais; CCL com pendências de drenagem e eventograma; Coplan com atrasos em desapropriação, relatório ambiental, paisagismo e iluminação. - Frentes 180 e 147: GO-180 com avanço em terraplenagem; GO-147 com geométrico não liberado por pendências de rampas e bueiros. Também houve debate sobre trabalho estendido e responsabilidade por horas extras. - Riscos e não conformidades: Destacado risco crítico na atualização da licença ambiental do trecho 14, podendo travar a obra. Também foi apontado alto volume de não conformidades em aberto, especialmente na CCL, com proposta de novo fluxo de gestão.
16/06/2026	Dynatest: Álvaro, Lara, Victor, Eloisa, Luiz Henrique, Guilherme CAEP: Edson	Reunião de Alinhamento CAEP/Dynatest - resumo ata: - Consolidação de status técnico e contratual, integrando informações de projetos, conformidades e execução; - Acompanhamento de execução das frentes, com indicação de andamento por obra e identificação de frentes com maior e menor ritmo; - Questões técnicas em aberto, incluindo não conformidades críticas entre anteprojeto e executado, especialmente em drenagem e juntas de aduelas; - Cronograma e timing de respostas de construtoras, com menção a atrasos e morosidade em posicionamentos técnicos; - Andamento e entregas de projetos com pendências identificadas por disciplina e empresa responsável; - Processamento de medições e repasses, com consolidação de status de medições finalizadas, em andamento e com pendências; - Análise de variações contratuais, incluindo debate sobre aplicação da regra dos 10% e impactos financeiros de decisões de projeto; - Questões administrativas e ambientais, como atualização de licenças, necessidade de decreto para desapropriações e documentação de lindeiros; - Organização e controle de documentação técnica, com proposta de novo fluxo para gestão de não conformidades e uso de BI para rastreamento.

CAEP Controle de Reuniões			CAEP
Data	Participantes	Assuntos	
18/06/2026	Dynatest: Guilherme Soares, Luiz Henrique Costa, Josiley Prado, Victor Castro, Alvaro Laquis, Emine Lauara, Lara Cristina CAEP: Edson Shimizu	Reunião de Alinhamento CAEP/Dynatest - resumo ata: Houve preocupação recorrente com a morosidade das decisões da construtora Coplan, que retarda posicionamento sobre aditivos e mudança de solução, gerando risco financeiro. Atrasos de resposta e substituição de equipes foram relatados; faltas explicadas por vencimento de licenças, não por pagamento. Em projetos, várias frentes têm pendências: Caiapó adotando solução moldada in loco e aguardando estudo comparativo para pré-moldado; CCB entregou somente projeto de drenagem com falhas em aduelas; CCL em análise; GO- 461 com entregas parciais (1,9 km limpeza em 5,2 km atacados). Chegaram documentos de terraplenagem da Caiapó e houve liberação de execução local; drenagem da GO-180 ainda requer revisão. Foram recebidas três cargas de tubos e a maior parte das aduelas danificadas foi substituída, restando uma peça pendente. Foram debatidas não conformidades críticas entre executado e anteprojeto, especialmente em drenagem e juntas de aduelas. A manta-bidim e o selamento com argamassa foram esclarecidos como complementares e normatizados (filtragem de finos versus vedação mecânica); constataram-se práticas divergentes em campo e necessidade de evidência fotográfica para rastreabilidade e prestações. Medições e repasses foram tema central: GO-180 dependente de documentos de controle tecnológico; GO-461 e relatórios em finalização; GO-178 com pendência de drenagem que afeta eventograma. Debate jurídico/operacional sobre a regra dos 10% para alterações contratuais. Questões administrativas e ambientais: atualização de licença da GO-147 em trâmite com GEAMB/SEMA/SEMA, necessidade de decreto para desapropriações e documentação de lindeiros, e ofícios pendentes (RCA, licenças de canteiros). Foram relatadas reclamações de consumidores em várias frentes, problema de controle de poeira em trecho urbano e ocorrência de subtração de material lenhoso no contrato GO-461. Foram também alinhadas ações de governança documental: reorganização de pastas, novo fluxo para tratativa de não conformidades, uso de BI para mapear pendências e cobrança de evidências das executoras.	
18/06/2026	Manesco: Antônio Gonçalves e Daniel Esteves Dynatest: Victor Castro CAEP: Alex Pineli e Edson Shimizu	Reunião de Alinhamento CAEP/Dynatest/Manesco - resumo ata: A reunião tratou da verificação da medição referente à GO-147, com foco na execução de bueiros sem armação e nas implicações contratuais e técnicas dessa situação, além de discutir a publicação do TAG e a redação sobre as alterações de até 10%.	
24/06/2026	CAEP: Edson A&M: Walter, Tiago Manesco: Ludmilla, Daniel BV: Vinicius Dynatest: Peter	Reunião de Alinhamento CAEP - resumo ata: - Análise de questões financeiras em medições, com discussão sobre impacto institucional e operacional; - Efeitos de questões levantadas na continuidade das atividades e necessidade de ações para recuperação; - Estratégias de governança e ações corretivas, incluindo proposta de ação combinada institucional e operacional; - Discussão sobre questões identificadas e suas causas, com indicação de responsabilidades e opções de resposta; - Definição de ações operacionais, incluindo reforço de times locais com pontos focais táticos e criação de ponto focal diário; - Análise de complexidade contratual e limitações estruturais; - Governança interna e periodicidade de reuniões, com proposta de maior envolvimento de liderança sênior e definição de formatos mais decisórios.	
29/06/2026	Dynatest: Lara Manesco: Ludmilla BV: Vinicius A&M: Tiago Dynatest: Edson	Reunião de Alinhamento CAEP - resumo ata: - Planejamento de reestruturação operacional do consórcio, com foco em sustentabilidade e alinhamento institucional; - Fluxo de faturamento e emissão de notas, com definição de cronograma e responsabilidades por empresa; - Procedimentos de certificação e acreditação, com discussão sobre requisitos e alternativas de validação técnica; - Estratégia de presença em campo com avaliação de incremento institucional em Goiânia; - Relação institucional e comunicação estratégica, com proposta de reuniões top-down para realinhamento e consolidação de discurso; - Plano de ações para questões identificadas, combinando respostas pontuais com agenda proativa de reafirmação de compromissos; - Definição de papéis entre estruturas de governança, incluindo diferenciação entre PMO de execução e gestão institucional; - Preparação de apresentação e documentação para apresentação em reunião de diretoria com IFAG.	
29/06/2026	Dynatest: Lara, Victor, Antonio, Emmily Manesco: Marcos CAEP: Edson	Reunião de Alinhamento CAEP/Dynatest/Manesco - resumo ata: - Documentação interna de questões operacionais do CAEP; - Registro de eventos e análises de prestações de contas, com criação de histórico com exemplos de questões e tratativas; - Padronização de fluxos administrativos para prestação de contas, incluindo definição de prazos, responsáveis e documentação necessária; - Estrutura de histórico documental, com proposta de checklist para validação mensal e trimestral com prazos e responsabilidades; - Checklist e instruções técnicas internas para padronizar processos e reduzir retrabalho entre consórcio e construtoras; - Integração de pessoal e rotinas operacionais para medições e consolidação de dados técnicos; - Verificação de índices e aplicações contratuais, com confirmação de índices aplicáveis antes de incorporação nas medições; - Fluxo de comunicação e responsabilidades, com definição clara de quem responde a quais itens; - Gestão de projetos, com priorização e estratégia de comunicação conforme maturidade de cada frente; - Procedimentos administrativos de desapropriação, com definição de responsabilidades e modelos de documentação.	

- Relatório de Relacionamento Institucional do mês de junho de 2026

O Relatório de Relacionamento Institucional descreve a interação entre as diversas áreas do projeto, assegurando que as frentes de engenharia, certificação, gestão/contabilidade e jurídico atuem de forma alinhada e coordenada. O documento monitora a integração dos processos, registra as tratativas institucionais, técnicas e contratuais realizadas no período e identifica oportunidades de aprimoramento na comunicação, na definição de responsabilidades e na condução das atividades do Programa.

No mês de junho de 2026, o CAEP manteve agenda contínua de reuniões técnicas, operacionais e institucionais com a Dynatest, Alvarez & Marsal, Bureau Veritas, Manesco, IFAG e GOINFRA, voltadas ao acompanhamento das obras, à análise de projetos, medições, certificações, não conformidades e riscos contratuais. As tratativas evidenciaram a intensificação da integração entre as empresas consorciadas e os órgãos envolvidos, com foco no fortalecimento dos controles internos e na melhoria da rastreabilidade das decisões e dos encaminhamentos.

No âmbito da governança e da gestão integrada, as reuniões concentraram-se na revisão da estrutura organizacional do CAEP, na definição de pontos focais e na diferenciação entre o PMO de execução e a gestão institucional. Também foram discutidas a criação e revisão da Instrução Técnica IT004, de identificadores e de procedimentos operacionais padrão, além da estruturação de fluxogramas para os principais processos do contrato. Nesse contexto, o eventograma foi reafirmado como instrumento central de controle contratual, juntamente com a regra de limitação do avanço físico a 50% na ausência de projeto executivo completo e o limite macro de variação contratual de +10% e -10%, sem compensação entre os percentuais.

No âmbito da engenharia, as reuniões realizadas com a Dynatest trataram do acompanhamento das frentes de obra e das entregas de projetos das rodovias GO-180, GO-147, GO-178A e GO-461. Foram analisadas pendências nas disciplinas de geotecnia, drenagem, geometria, desapropriação, pavimentação e licenciamento ambiental, bem como atrasos das construtoras, substituição de equipes, paralisações, liberações locais de execução e inconsistências entre os serviços executados e os anteprojetos. As discussões também abrangeram não conformidades críticas em drenagem, bueiros e juntas de aduelas, incluindo a avaliação de soluções moldadas in loco e pré-moldadas, utilização de manta geotêxtil, selamento com argamassa, substituição de peças danificadas e necessidade de registros fotográficos que assegurassem a rastreabilidade das intervenções.

No âmbito das medições e da certificação, as tratativas envolveram a harmonização entre as planilhas apresentadas pelas executoras e os controles internos do CAEP, a validação das informações por formulários e a exigência de documentação completa por competência. Foram reforçadas a necessidade de consolidação dos diários de obra, fichas de controle, registros fotográficos, notas técnicas e controles tecnológicos, bem como a elaboração de relatórios de atendimento às não conformidades. As reuniões evidenciaram que a ausência de evidências, as pendências documentais e o elevado volume de não conformidades em aberto continuam impactando a aprovação das medições, a certificação dos serviços e a regularidade dos repasses financeiros.

No âmbito da gestão, contabilidade e organização administrativa, as reuniões com a Alvarez & Marsal, Manesco e demais integrantes do CAEP trataram dos impactos financeiros e institucionais associados às medições, do fluxo de faturamento e emissão de notas fiscais, da definição de cronogramas e responsabilidades por empresa e da padronização dos procedimentos de prestação de contas. Também foram discutidos a criação de históricos de eventos e tratativas, checklists de validação mensal e trimestral, instruções técnicas internas, conferência de índices contratuais e organização da documentação necessária à comprovação das atividades. Essas medidas visam reduzir retrabalho, aprimorar a integração

dos dados técnicos e financeiros e conferir maior previsibilidade aos processos administrativos do consórcio.

No âmbito jurídico e contratual, as reuniões com a Manesco abordaram as implicações decorrentes da execução de bueiros sem armação na GO-147, a publicação do TAG, a redação aplicável às alterações contratuais de até 10%, as responsabilidades por atrasos e as consequências de modificações de soluções técnicas e materiais. Também foram analisados riscos associados às alterações de projetos, às paralisações, às desapropriações, às licenças ambientais e à necessidade de formalização documental dos encaminhamentos. A atuação jurídica ocorreu de forma integrada às áreas de engenharia, certificação e gestão, contribuindo para a avaliação dos efeitos técnicos, financeiros e contratuais das decisões adotadas.

De forma integrada, as reuniões realizadas em junho de 2026 demonstram que o relacionamento institucional do CAEP constitui instrumento permanente de coordenação, controle e apoio à tomada de decisão. As interações permitiram consolidar responsabilidades, organizar fluxos, acompanhar pendências das obras, fortalecer o PMO de execução, estruturar respostas aos riscos e aprimorar a comunicação entre as empresas consorciadas e os demais agentes do Programa. Destaca-se, ainda, a preparação de materiais e estratégias para apresentação à diretoria do IFAG, bem como a proposta de reuniões mais decisórias, com maior participação das lideranças e presença institucional em campo.

2.3 Produto 1.3 – Relatório de Comunicação Integrada

2.3.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.3, referente ao Relatório de Comunicação Integrada, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório com o objetivo de garantir que as informações sobre o andamento dos projetos e obras de infraestrutura sejam comunicadas de forma transparente e acessível às partes interessadas, incluindo as comunidades locais, órgãos governamentais, parceiros privados e o público em geral. Deverá contemplar no mínimo:

- *Este relatório abordará estratégias e atividades desenvolvidas, em andamento e planejadas, que tem como objetivo transparência do relacionamento proativo, minimizando o impacto da elaboração de projeto e execução da obra e assegurar a adesão das comunidades aos projetos de infraestrutura.”*

2.3.1.1 Suspensão dos Serviços de Comunicação Integrada

Em virtude da supressão do Produto 1.3 (Comunicação Social) no âmbito do Contrato nº 01/2025 (CAEP–IFAG), devidamente formalizada mediante aditivo contratual, os serviços vinculados a este item foram encerrados. O IFAG adotou as medidas cabíveis para garantir a regularidade do processo, preservando o erário e assegurando a conformidade contratual. O e-mail de registro do tema, segue abaixo para fins de comprovação. O email se encontra em anexo a esse relatório.




Figura 2 – Evidência da supressão do Produto 1.3.

2.3.1.2 Retomada do produto 1.3 a partir da Reprogramação do Contrato nº 01/2025

Na proposta encaminhada pelo CAEP em 23/12/2025, após solicitação de redução do valor contratual no patamar de 47,8% em razão da supressão de três obras das sete iniciais, ficou definida a exclusão do Produto 1.3, dado que a atividade ficaria insustentável com a aplicação do referido desconto.

Entretanto, após solicitação da GOINFRA em reunião realizada em 25/05/2026, decidiu-se pela reintrodução do Produto 1.3 com a aplicação do valor original previsto no Contrato nº 01/2025. A mobilização será a partir da assinatura da Reprogramação do Contrato, bem como, a emissão da Ordem de Serviço por parte da CONTRATANTE (IFAG).

2.3.2 Produtos desenvolvidos no período

CAEP Controle de Produtos									
ID	Produto	Empresa Responsável	Document	Tipo	Descrição	Empreendedor	Data de Início	Data da entrega	Status Entr
1	1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3	Geral	01/06/2026	30/06/2026	Entregue
2	1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Parecer	Carta 012-2026 Carta CAEP aditivo contratual_v1assinado	Geral	01/05/2026	30/06/2026	Entregue

2.4 Produto 1.4 – Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC)

2.4.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.4, referente ao Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC), é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:


“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório de todas as atividades de manutenção e desenvolvimento de plataforma integrada de gestão no âmbito do programa de gestão dos produtos, que consolida as atividades prestadas e apuração dos indicadores de apuração e desempenho.”

2.4.1.1 Acesso à Plataforma de Gestão Integrada no Site do IFAG

A Plataforma de Gestão Integrada se encontra disponibilizada na primeira página do IFAG, <https://ifag.org.br/>, no botão “Gestão de Recursos do FUNDEINFRA”.



2.4.1.2 Atualização dos Processos e Rotinas das Publicações da Plataforma de Gestão Integrada

Conforme estabelecido em conjunto com o IFAG, as rotinas da Plataforma de Gestão Integrada foram adaptadas para atender o momento de forte reaceleração das obras e que serão plenamente adaptadas na competência de Julho de 2026.

Rotinas semanais: Publicação do Avanço Físico/Unifilar a partir do recebimento do relatórios de acompanhamento de campo.

Rotinas quinzenais: Publicação do Avanço Visual (Fotos) e Atualização do Portfólio.

Rotina Mensal: Publicação do Ciclo Financeiro das Obras, após o pagamento de impostos. Por volta do 22º dia útil do mês.

Rotina Sob demanda: Solicitações e Liberações de Repasse serão atualizadas ao final da semana a qual a demanda surgir para garantir a celeridade na prestação de contas do programa.

Os fluxogramas desenvolvidos estarão como anexos desse relatório.

2.4.1.3 Publicação Rotineira do Painel de Plataforma de Gestão Integrada no Site do IFAG

No período de referência, as publicações do Plataforma de Gestão Integrada ocorreram nas datas 16/06/2026, 23/06/2026 e 30/06/2026.

Em cada ciclo de atualização, o BI é inicialmente publicado em ambiente preliminar para avaliação e aprovação do IFAG, essas ocorreram nos dias 11/06.2026 e 22/06/2026. Um e-mail é encaminhado ao IFAG solicitando a aprovação formal e, após a manifestação favorável do órgão — formalizada via e-mail —, o painel é publicado no site do IFAG. Segue abaixo evidências das publicações, manutenções da Sala de Situação e aprovações do IFAG.

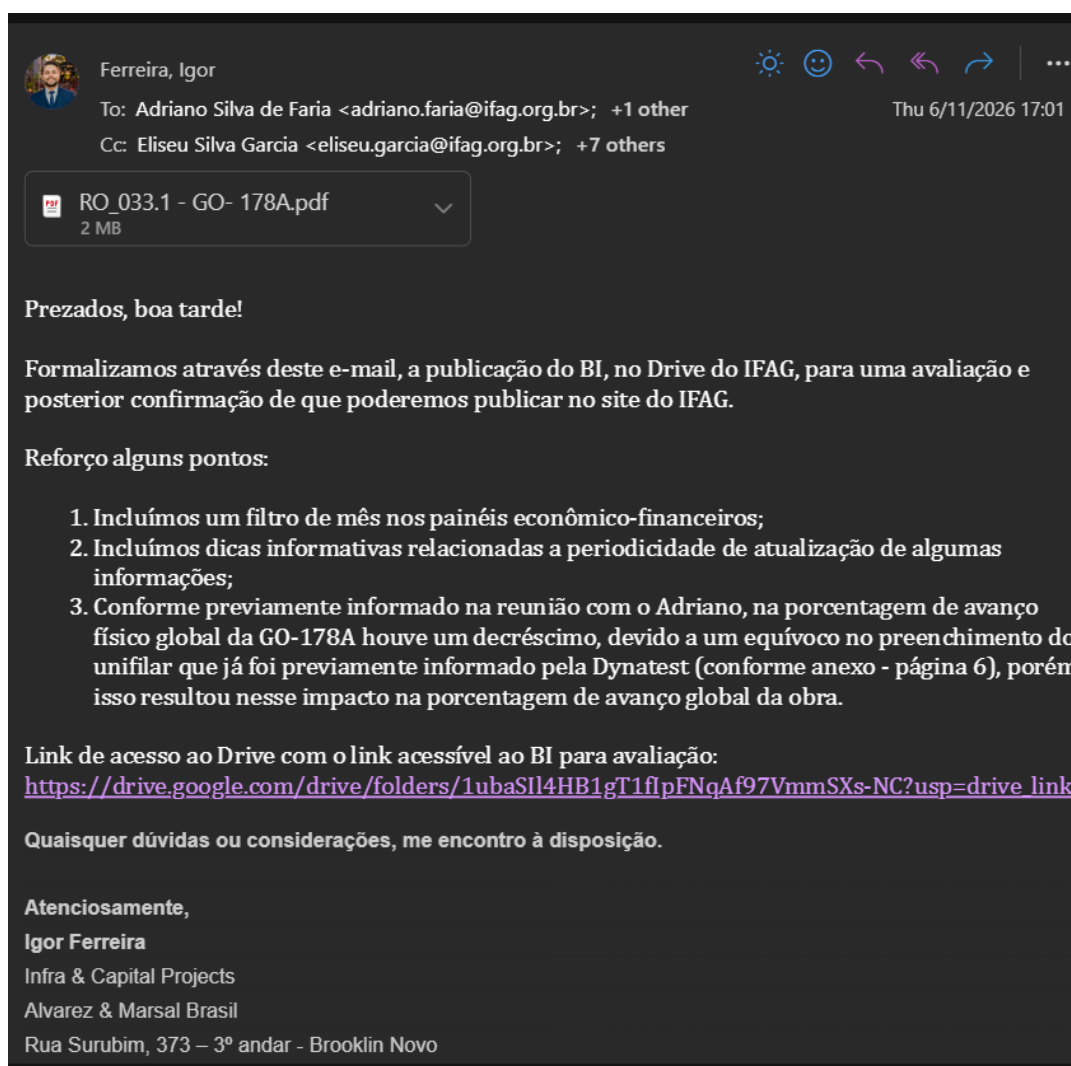


Figura 3 – Formalização da publicação e manutenção do Plataforma de Gestão Integrada.




Figura 4 – Formalização da publicação e manutenção do Plataforma de Gestão Integrada.




Figura 5 – Formalização da publicação e manutenção do Plataforma de Gestão Integrada.




Figura 6 – Formalização da publicação e manutenção do Plataforma de Gestão Integrada.




Figura 7 – Formalização da publicação e manutenção do Plataforma de Gestão Integrada.




Figura 8 – Formalização da publicação e manutenção do Plataforma de Gestão Integrada.




Figura 9 – Formalização da publicação e manutenção do Plataforma de Gestão Integrada.

2.4.1.4 Manutenção e Desenvolvimento do Painel Resumo Executivo

No mês de Junho de 2026 foi incluído os indicadores de desempenho KPIs financeiros das obras, com o processamento das medições no mês de Maio. No Painel Executivo, encontram-se ambos os indicadores de desempenho (KPIs) de avanço físico e financeiro das obras.

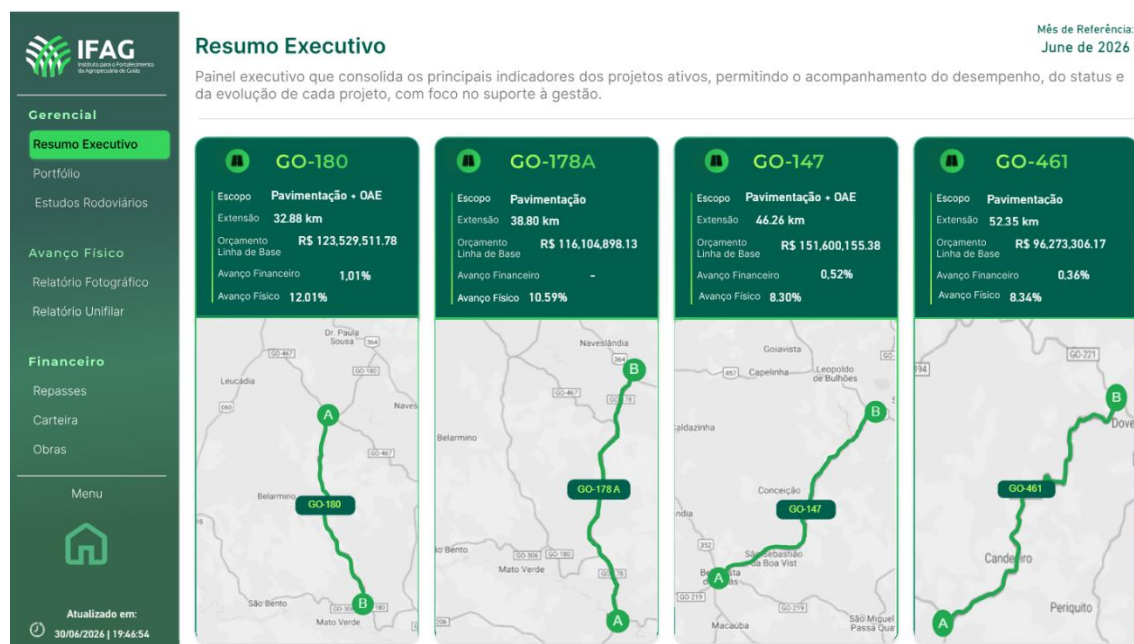


Figura 10 – Imagem ilustrativa da página de Resumo Executivo.

2.4.1.5 Manutenção e Desenvolvimento do Painei Portfólio

- **Portfólio:** No âmbito do Produto 4.1 — Gestão de Portfólio de Projetos (PMO) —, foram realizadas reuniões de PMO com o CAEP e com o IFAG para acompanhamento, revisão e consolidação das informações relacionadas às etapas e fases dos projetos que compõem o portfólio de empreendimentos monitorados. As atualizações realizadas permitiram refletir o status atual de cada iniciativa, em conformidade com as práticas e nomenclaturas adotadas na gestão de projetos, proporcionando uma visão consolidada do andamento do portfólio. No período em questão, houve as seguintes atualizações:

No Painei de Portfólio foi atualizado alterando para a GO-147 o status do Projetos de Obras de Arte Especiais de “Não Inciado” “Em curso”.

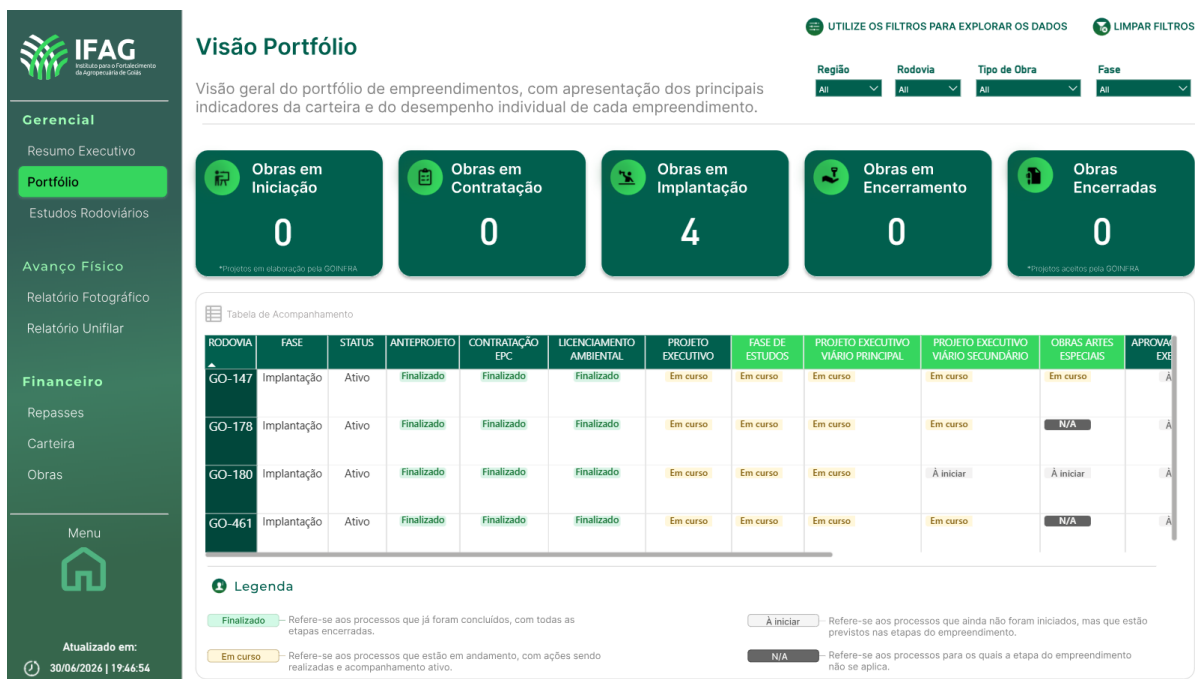


Figura 11 – Imagem ilustrativa da página de Portfólio.

2.4.1.6 Manutenção e Desenvolvimento do Painei Estudos Rodoviários

O Painei foi atualizado trazendo as diretrizes das páginas e apresentações contidas no Portal da Gestão Integrada (Sala de Situação), para o atendimento do Manual de Identidade Visual e Condutas para as Eleições de 2026, retirando logos e menções diretas à arrecadação do FUNDENFRA.

Estudos Rodoviários

Este painel reúne informações e materiais dos estudos rodoviários das obras em execução, evidenciando os impactos positivos dos projetos no desenvolvimento regional, na mobilidade e na segurança viária.

Projeto	Descrição	Acesso o link
GO-180	A rodovia GO-180, no trecho entre a BR-467 e a GO-306, será pavimentada em uma extensão de 32,88 km. A proposta nº 049/2024 prevê um investimento de R\$ 138.570.338,86 para a obra. Serão beneficiados os municípios de Itarumã, Caçu, Serranópolis e Jataí, ampliando a conectividade e o escoamento da produção local.	Acesse o link
GO-178A	A rodovia GO-178A, no trecho entre a BR-364 e a GO-306, será pavimentada em uma extensão de 38,8 km. A proposta nº 017/2023 prevê um investimento de R\$ 142.035.397,96 para a obra. Serão beneficiados os municípios de Itarumã, Caçu, Serranópolis, Aparecida do Rio Doce e Jataí, melhorando o acesso e facilitando o transporte na região.	Acesse o link
GO-147	A rodovia GO-147, no trecho entre a GO-010 e Bela Vista de Goiás, será pavimentada em uma extensão de aproximadamente 46,3 km. A proposta nº 050/2024 prevê um investimento de R\$ 151.792.532,85 para a execução da obra. Serão beneficiados os municípios de Hidrolândia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Vianópolis, Silvânia, Bela Vista de Goiás, Leopoldo de Bulhões, Piracanjuba, Caldazinha e São Miguel do Passa Quatro, promovendo melhorias na infraestrutura viária da região.	Acesse o link
GO-461	A rodovia GO-461, no trecho entre a GO-194 e a GO-221, será pavimentada em uma extensão de 52,35 km. A proposta nº 010/2023 prevê um investimento de R\$ 108.089.940,82 para a obra. Serão beneficiados os municípios de Doverlândia, Mineiros, Baliza e Caiapônia, aprimorando o tráfego e a conexão entre essas regiões.	Acesse o link

Atualizado em: 30/06/2026 | 19:46:54

Figura 12 – Imagem ilustrativa da página de Estudos Rodoviários.

2.4.1.7 Manutenção e Desenvolvimento dos Painéis Avanço Físico

- **Acompanhamento Visual:** No período de referência, o Painel de Acompanhamento Fotográfico passou por atualizações em diferentes momentos ao longo de maio, seguindo a dinâmica de publicações quinzenais. A divulgação oficial no site ocorreu nos dias 11/06/2026 e 23/06/2026.

As informações utilizadas têm como base os relatórios semanais de acompanhamento de obras, sendo consolidadas e disponibilizadas pelo CAEP, com atualização quinzenal e validação realizada pelo IFAG, assegurando a consistência, a confiabilidade e a rastreabilidade dos registros apresentados no painel.

- **Indicador de Avanço Físico da Obra (KPI e Unifilar):** Como estruturação de processos, e vinculado ao Produto 4.1 Gestão de Portfólio de Projetos, foram realizadas reuniões com o consórcio (CAEP) para definição dos pesos de ponderação do indicador de avanço físico global de cada obra. Com a aprovação dos eventogramas e a consolidação dessa metodologia, tornou-se possível estruturar um cálculo padronizado e consistente do avanço global por empreendimento, que vem sendo acompanhado mensalmente, através do monitoramento das atualizações dos unifilares e aprovações das medições. A divulgação oficial no site ocorreu nos dias 11/06/2026 e 23/06/2026.

Como resultado direto desse trabalho, e no âmbito do Produto 1.4, foi disponibilizado o painel de acompanhamento unifilar publicado no BI, atualizado semanalmente, que traduz de forma visual a evolução semanal das obras e a porcentagem de evolução global mensal, além de representar o KPI de Avanço Físico, conforme representado no painel abaixo.

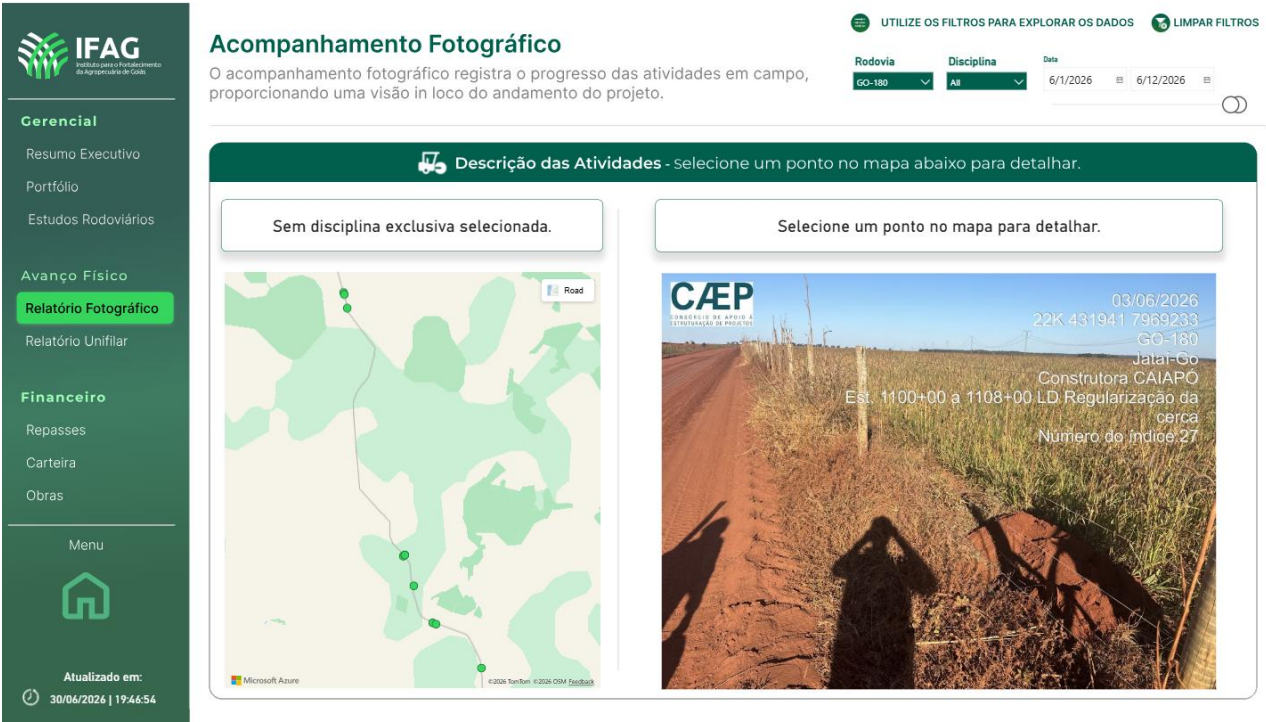


Figura 13 – Imagem ilustrativa da página Acompanhamento Fotográfico.

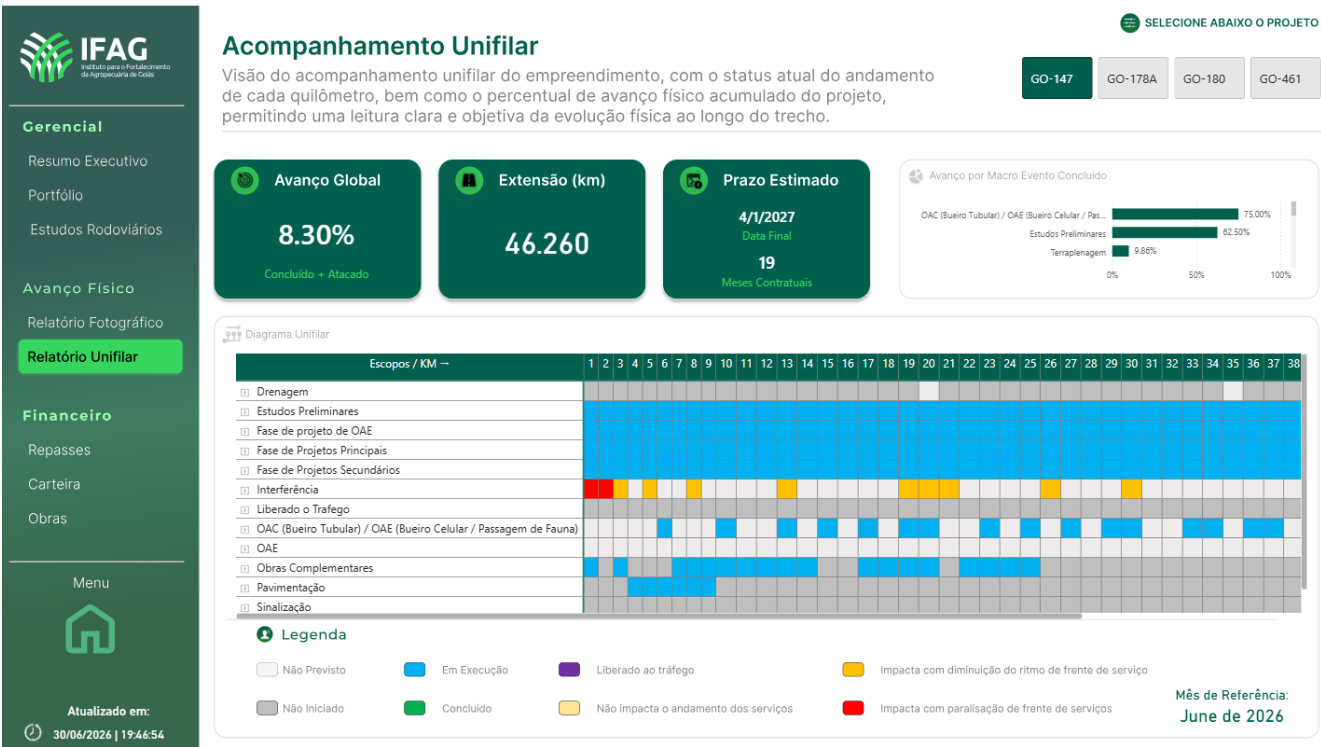


Figura 14 – Imagem ilustrativa da página Acompanhamento Físico/Unifilar

2.4.1.8 Manutenção e Desenvolvimento dos Painéis Financeiros

As principais atividades de manutenção foi a inclusão da seleção por mês nos painéis econômico-financeiro. Foi incluído um filtro de mês nos painéis financeiros “Carteira” e “Obras” para melhorar a visualização e análise das informações financeiras devido ao descompasso temporal pela aprovação das medições das obras.

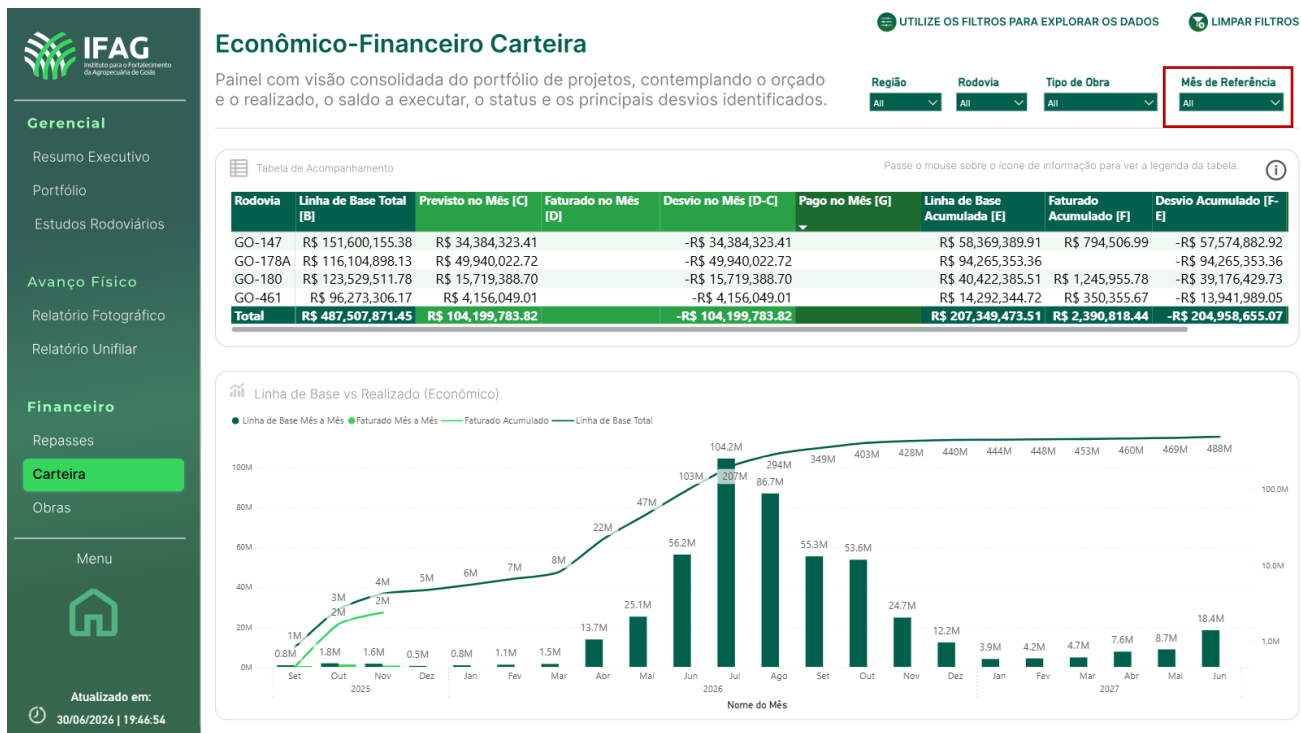


Figura 15 – Formalização da publicação e manutenção do Financeiro-Carteira.

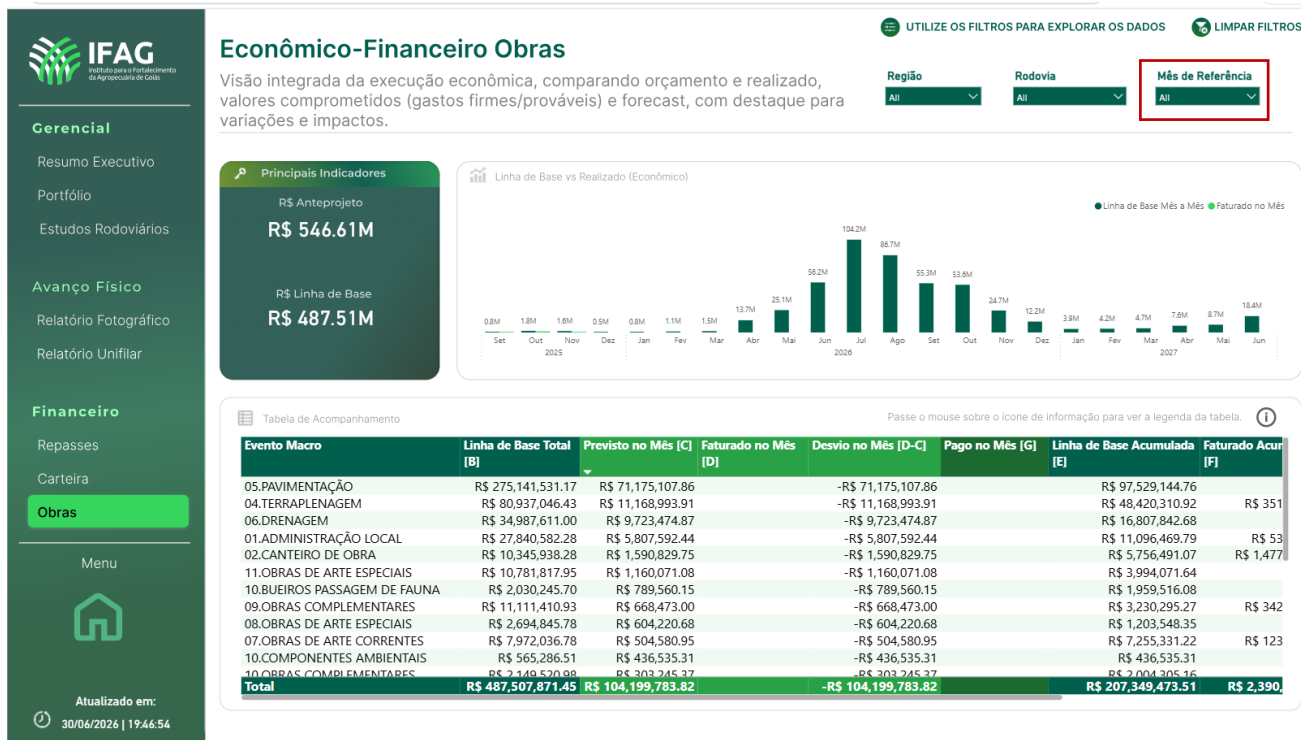


Figura 16 – Imagem ilustrativa da página Financeiro-Obras

2.4.2 Produtos desenvolvidos no período

CAEP Controle de Produtos									
									
ID	Produto	Empresa Responsável	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data de Início	Data de entrega	Status Entrega
3	1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	1.4. Fluxo de Manutenir Plataforma de Gestão Integrada (BI)	Geral	01/06/2026	30/06/2026	Entregue
4	1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	TIC - Painel de Gestão Integrada 11.06.26	Geral	01/06/2026	30/06/2026	Entregue
5	1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	TIC - Painel de Gestão Integrada 22.06.26	Geral	01/06/2026	30/06/2026	Entregue
6	1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	TIC - Painel de Gestão Integrada 30.06.26	Geral	01/06/2026	30/06/2026	Entregue
7	1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	TIC - Registros das Publicações e Manutenções de Junho.26	Geral	01/06/2026	30/06/2026	Entregue
8	1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	TIC - Sala de Situação - Manual Descritivo do Painel de Gestão Integrada	Geral	01/06/2026	30/06/2026	Entregue

ENCERRAMENTO

O **Relatório Mensal N° 12**, referente à consolidação e à apresentação das atividades desenvolvidas durante o mês de referente ao período **01 de Julho/2026 até 30 de Julho/2026**, em conformidade ao Contrato N° 01/2025-IFAG.

Goiânia, 08 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente
 **ALEX DE VASCONCELOS PINELI ALVES**
Data: 14/07/2026 10:48:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alex de V. Pineli Alves

CAEP – Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos
Produto P1.1 e P1.2 – Relatório mensal – Grupo 1



Vinicius Daher

CAEP – Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos
Produto P1.3 e P1.4 – Relatório mensal – Grupo 1

ANEXOS

LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS	
REF.	DESCRIÇÃO
Anexo I	P1.1 - Controle de Entrega de Produtos de junho.xlsx
Anexo II	P1.1 - Dashboard da Análise de Entrega de Produtos - junho.pdf
Anexo III	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de junho.xlsx
Anexo IV	P1.1 - Timeline de Acompanhamento Macro até junho 2026.pdf
Anexo V	P1.2 - Controle de Reuniões do mês de junho.xlsx
Anexo VI	1.3 - Carta 012-2026 Carta CAEP aditivo contratual_v1assinado
Anexo VII	1.3 - Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3
Anexo VIII	1.4 - TIC - Painel de Gestão Integrada 11.06.26 - - Rastreabilidade de Manutenção e Desenvolvimento de Versões.pdf
Anexo IX	1.4 - TIC - Painel de Gestão Integrada 22.06.26 - - Rastreabilidade de Manutenção e Desenvolvimento de Versões.pdf
Anexo X	1.4 - TIC - Painel de Gestão Integrada 30.06.26 - Rastreabilidade de Manutenção e Desenvolvimento de Versões.pdf
Anexo XI	1.4 - TIC - Registros das Publicações e Manutenções de Junho.26.pdf
Anexo XII	1.4 - TIC - Sala de Situação - Manual Descritivo do Portal de Acompanhamento.pdf
Anexo XIII	1.4 - Fluxo de Apurar Indicadores e Manutenir Plataforma de Gestão Integrada.png
