

CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

 **Dynatest**[®]

MANESCO

 **INFRA**
& CAPITAL PROJECTS
BY ALVAREZ & MARSAL



RELATÓRIO CAEP

Grupo 1 - Coordenação Geral Executiva

Relatório Mensal N° 09

Referente ao período de execução de 01.03.26 até 31.03.26

09 de Abril de 2026

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	3
2 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA.....	4
2.1 Produto 1.1 – Relatório de Coordenação Geral	5
2.1.1 Descrição das atividades atribuídas	5
2.1.2 Produtos desenvolvidos no período	5
2.2 Produto 1.2 – Relatório de Relações Institucionais	29
2.2.1 Descrição das atividades atribuídas	29
2.2.2 Produtos desenvolvidos no período	29
2.3 Produto 1.3 – Relatório de Comunicação Integrada	32
2.3.1 Descrição das atividades atribuídas	32
2.4 Produto 1.4 – Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC)	33
2.4.1 Descrição das atividades atribuídas	33
2.4.2 Produtos desenvolvidos no período	37
ENCERRAMENTO.....	38
ANEXOS	39

1 APRESENTAÇÃO

A seleção da empresa Estruturadora pelo Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG - ocorreu por meio do Instrumento de Convocação nº 01/2025 para empresas ou consórcio estruturador, qualificados junto à SEINFRA, conforme o Chamamento Público para pré-qualificação nº 001/2024 da SEINFRA. Consagrado vencedor, o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos - CAEP – desenvolverá, ao longo do contrato, atividades especializadas em gestão de infraestrutura, divididas conformes os grupos:



**Coordenação Geral
Executiva**



**Gestão de Engenharia
e Socioambiental**



**Certificação de
Projetos e
Obras**



**Gestão de Processos
Administrativos e
Contábeis**



**Assessoramento e
Consultoria Jurídica**

O CAEP é formado pelas empresas Dynatest Engenharia LTDA, Bureau Veritas do Brasil Sociedade Classificadora e Certificadora LTDA., Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA e Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados.

O Consórcio Estruturador apresenta ao IFAG o **Relatório Mensal N° 09**, referente ao período de **01 de Março/2026 até 31 de Março/2026**, em conformidade ao Contrato N° 01/2025-IFAG.

O presente Relatório Mensal apresenta os elementos do objeto contratual descrito no Termo de Referência como “Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA”.

2 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

A Coordenação Geral Executiva atua como agente de interface entre todos os envolvidos, isto é, IFAG, SEINFRA, GOINFRA, empresas projetistas, empresas executoras e empresas supervisoras, garantindo que o objetivo seja executado de forma eficaz, transparente e coordenada. A função central desta coordenação é manter a coesão entre as diversas áreas envolvidas (gerenciamento de obras, projetos, governança, contábil, legal, dentre outras) e assegurar que todas as atividades sejam realizadas de acordo com os padrões técnicos, legais e de governança definidos pela SEINFRA, GOINFRA, FUNDEINFRA e IFAG.

Principais atividades:

- Gestão centralizada;
- Integração das atividades;
- Interlocução com partes interessadas (stakeholders);
- Comunicação integrada;
- Acompanhamento de cronogramas e alocação de recursos;
- Gestão integrada de riscos;
- Acompanhamento de processos e prestação de contas;
- Desenvolvimento e manutenção de sistemas e painéis do tipo sala de situação.

2.1 Produto 1.1 – Relatório de Coordenação Geral

2.1.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.1, referente ao Relatório de Coordenação Geral, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório detalhado que descreve a estrutura da Coordenação Central, responsável pela gestão centralizada de todas as (macro)atividades e seus produtos, no âmbito de suas atribuições e responsabilidades. Deverá contemplar no mínimo:

- Progresso e Prestação de Contas das Atividades: relatório que consolida o progresso de todas as atividades executadas, em execução e planejadas, indicando as fases atuais de atendimento (status), a fim de assegurar a prestação de contas à Associação, SEINFRA, órgãos de controle, e demais partes interessadas além de oferecer transparência aos demais stakeholders quanto às suas atividades. Esses relatórios incluirão indicadores de desempenho globais e parciais, cumprimento de prazos, resultados financeiros e alinhamento às normas técnicas e legais.*
- Plano de Gestão Integrada de Riscos: documento que consolida a gestão de riscos de todas as áreas do projeto, garantindo que a visão abrangente e atualizada dos riscos envolvidos (financeiros, operacionais, ambientais, jurídicos, ou outros inerentes ao objetivo do projeto). O plano estabelecerá as medidas de mitigação e contingência, indicando os responsáveis por cada ação, além de promover a coordenação entre os setores para garantir uma resposta integrada.”*

2.1.2 Produtos desenvolvidos no período

- Planilha de Controle de Produtos referente ao mês de março.

Durante o mês de março de 2026, o CAEP manteve elevado nível de produção técnica e institucional, com a emissão de amplo conjunto de documentos vinculados ao acompanhamento das obras, à análise de projetos executivos, à gestão contratual e ao suporte à governança do Programa. O período foi marcado por intensa produção documental, com destaque para notas técnicas de análise e aceitação de projetos, pareceres técnicos e ambientais, relatórios de acompanhamento de obras, atas de reuniões técnicas, notificações de não conformidade, além de instrumentos jurídicos e gerenciais associados à condução dos contratos.

O conjunto de entregas evidencia a atuação integrada das empresas consorciadas Dynatest, A&M Infra, Bureau Veritas e Manesco, que atuaram de forma complementar nas frentes de engenharia, gestão contratual, certificação, planejamento financeiro e assessoramento jurídico. Observou-se, novamente,

predominância das atividades vinculadas às frentes de Gerenciamento Técnico e Análise de Projeto e RPFO, responsáveis por elevado volume de notas técnicas, relatórios de acompanhamento semanal, pareceres técnicos e registros de reuniões de alinhamento das obras.

No âmbito técnico-operacional, destacou-se a emissão expressiva de Notas Técnicas de análise de projetos executivos, contemplando estudos geotécnicos, hidrológicos, geológicos, de tráfego, drenagem e componentes ambientais, além de documentos de aceitação técnica. Também foram elaborados pareceres técnicos voltados à avaliação de conformidade ambiental, interferências, respostas a órgãos e análises de relatórios ambientais, bem como relatórios semanais de acompanhamento de obras e boletins de medição, reforçando o monitoramento contínuo da execução dos empreendimentos.

As atividades do mês abrangeram os empreendimentos GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461, que concentraram análises técnicas especializadas, inspeções, pareceres ambientais, relatórios de acompanhamento e reuniões de alinhamento técnico. A recorrência dessas entregas demonstra a continuidade das ações de monitoramento, controle técnico e validação documental associadas ao avanço das obras rodoviárias acompanhadas pelo consórcio.

No campo da gestão contratual e assessoramento jurídico, a Manesco manteve atuação relevante por meio da elaboração de pareceres, respostas a ofícios, minutas de notificações, instrumentos de advertência contratual, relatórios mensais jurídicos e participação em reuniões semanais de alinhamento com o IFAG. Destacam-se ainda os documentos voltados à formalização de procedimentos de descumprimento contratual, análise de pagamentos e elaboração de instrumentos de comunicação institucional com órgãos externos, como ALEGO, SEINFRA e MPOG.

As áreas de Gestão de Projetos, Controle Financeiro, Portfólio e Compliance, sob responsabilidade da A&M Infra, contribuíram com relatórios mensais de portfólio, prestação de contas, acompanhamento financeiro por empreendimento, dashboards gerenciais e estudos técnicos relacionados à matriz de riscos e ao sistema IRIS, fortalecendo os mecanismos de governança, transparência e suporte à tomada de decisão estratégica.

No campo da certificação, o Bureau Veritas manteve as atividades de verificação independente, com a emissão de relatórios de gestão da certificação e relatórios de inspeção em campo, incluindo visitas técnicas, análise de completeza e acompanhamento de canteiros de obras, contribuindo para o fortalecimento dos mecanismos de controle externo e da conformidade técnica dos empreendimentos.

Além das entregas concluídas, o mês de março registrou produtos em elaboração, com destaque para boletins de medição de diferentes períodos e relatórios jurídicos mensais, evidenciando a continuidade dos processos técnicos e administrativos em andamento, que serão consolidados nos ciclos subsequentes.

Dessa forma, o controle de produtos referente ao mês de março de 2026 apresenta um panorama abrangente, consistente e atualizado da atuação do CAEP no período, assegurando rastreabilidade documental, transparência na execução das atividades e aderência às responsabilidades previstas no escopo contratual. O conjunto de registros subsidia diretamente a elaboração do Relatório de Coordenação Geral Mensal, constituindo instrumento essencial para o monitoramento das frentes de trabalho, a avaliação de desempenho e a prestação de contas às instâncias de governança.

Apresenta-se, portanto, a seguir, a planilha consolidada das entregas de março de 2026, contendo a identificação do produto, a empresa responsável, o tipo de documento, a descrição, o empreendimento correspondente, a data de entrega e o status atualizado, permanecendo como ferramenta fundamental para o acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas pelo consórcio.

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Formulário de Descumprimentos e Sanções	Gestão Contratual	Elaboração de formulário para apuração de descumprimentos e	Geral	02/03/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Formulário de Expectativa de Sinistro	Gestão Contratual	Elaboração de formulário para reunião de elementos para a comunicação	Geral	02/03/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de comunicação de advertência	Gestão Contratual	Elaboração de minuta para comunicação de advertência com base na subcláusula 12.2.1	Geral	02/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-070.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos	GO-178A	02/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-012.1	Notificação de não	Notificação de Natureza Obra	GO-461	03/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-071.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	04/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-072.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos	GO-178A	04/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-073.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos de Tráfego	GO-178A	04/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-074.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Hidrológicos	GO-461	04/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-075.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos	GO-180	04/03/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 08	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a	Geral	05/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-049.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	05/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-076.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-180	05/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-077.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-461	05/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-078.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	05/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-024.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação do Protocolo de Interferências	GO-178A	06/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-048.1	Ata de Reunião	Alinhamento de projetos	GO-147	06/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-050.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	06/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-079.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP e Estudos de Tráfego	GO-180	06/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-080.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DAP	GO-461	06/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-025.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de realocação de passagem de fauna	GO-461	08/03/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Minuta de Resposta o Ofício nº 73/2026 ALEGO	Ofício	Elaboração de minuta de resposta ao Ofício nº 73/2026/SITC/ALEGO	Geral	10/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-026.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-180	10/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-006.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-178A	10/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-013.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Segurança do Trabalho	GO-461	10/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-062.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	11/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-063.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - RAP	GO-147	11/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-017.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	11/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-022.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	11/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-023.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	11/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-023.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	11/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-051.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	11/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-081.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos e Estudos Hidrológicos	GO-180	11/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-007.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-180	12/03/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-052.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	12/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-082.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	12/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-083.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - RAP	GO-147	12/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-084.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	12/03/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-085.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DAP e Estudos de Tráfego	GO-147	12/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-086.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos	GO-461	12/03/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	13/03/2026	Entregue
5.4 RELATÓRIO DE CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	Manesco	Formulário de Conformidade aos Parâmetros ESG	Outros	Revisão do Formulário de Conformidade aos Parâmetros ESG, documento de apoio à elaboração do Produto 5.4	GO-180	13/03/2026	Entregue
5.4 RELATÓRIO DE CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	Manesco	Formulário de Conformidade aos Parâmetros ESG	Outros	Revisão do Formulário de Conformidade aos Parâmetros ESG, documento de apoio à elaboração do Produto 5.4	GO-178A	13/03/2026	Entregue
5.4 RELATÓRIO DE CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	Manesco	Formulário de Conformidade aos Parâmetros ESG	Outros	Revisão do Formulário de Conformidade aos Parâmetros ESG, documento de apoio à elaboração do Produto 5.4	GO-147	13/03/2026	Entregue
5.4 RELATÓRIO DE CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	Manesco	Formulário de Conformidade aos Parâmetros ESG	Outros	Revisão do Formulário de Conformidade aos Parâmetros ESG, documento de apoio à elaboração do Produto 5.4	GO-461	13/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-027.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	13/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-028.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	13/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-029.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	13/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-025.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	13/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-053.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	13/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-054.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	13/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-055.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	13/03/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-056.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	13/03/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-057.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	13/03/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-058.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	13/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-007.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-147	13/03/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Minuta de Resposta o Ofício nº 74/2026 ALEGO	Ofício	Revisão da minuta de resposta ao Ofício nº 74/2026 decorrente do	Geral	17/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-030.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de resposta ao Relatório 24-2025 GOINFRA OR-	GO-178A	17/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-024.1	Relatório Semanal de	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	17/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-024.1	Relatório Semanal de	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	17/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-023.1	Relatório Semanal de	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	17/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-018.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	17/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-087.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	17/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-088.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-180	17/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-089.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-461	17/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-090.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Hidrológicos	GO-461	17/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-091.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Drenagem	GO-178A	17/03/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Advertência - Subcláusula 12.2.1 - Atraso no Cronograma de Projetos	Gestão Contratual	Elaboração de minuta de notificação de advertência com fundamento na subcláusula 12.2.1, a fim de advertir a empresa sobre o atraso nas	GO-147	18/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-031.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	18/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-032.1	Parecer	Parecer Técnico de Encaminhamento Técnico à GOINFRA referente ao	GO-461	18/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-062.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	18/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-093.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos	GO-147	18/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-094.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	18/03/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-095.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos	GO-178A	18/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Setembro/2025	GO-180	18/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-002.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-180	18/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-003.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Novembro/2025	GO-180	18/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-033.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental OFÍCIO Nº	GO-147	19/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-060.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	19/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-061.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	19/03/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-065.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	19/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-096.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-461	19/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-098.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-180	19/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-099.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos de Tráfego	GO-178A	19/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-100.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos de Tráfego	GO-180	19/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-101.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos	GO-461	19/03/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-066.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	19/03/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	20/03/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Parecer sobre pagamento das executoras com saldo remanescente	Parecer	Parecer jurídico sobre os pagamentos das executoras nas hipóteses de disponibilidade de saldo remanescente das medições trimestrais	Geral	20/03/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Advertência - Subcláusula 12.2.1 - Atraso no Cronograma de Projetos	Gestão Contratual	Elaboração de minuta de notificação de advertência com fundamento na subcláusula 12.2.1, a fim de advertir a empresa sobre o atraso nas	GO-461	20/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Setembro/2025	GO-147	20/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-002.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-147	20/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-003.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Novembro/2025	GO-147	20/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-461	20/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-097.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	20/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-102.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos de Tráfego	GO-147	20/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-002.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Novembro/2025	GO-461	20/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-003.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Dezembro/2025	GO-461	20/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-107.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DAP e Estudos	GO-180	20/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-014.1	Notificação de não	Notificação de Natureza Contratual	GO-461	20/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-059.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	20/03/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-067.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	20/03/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-068.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	20/03/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Minuta de Resposta ao Ofício nº 2026002609876	Manifestação em processo	Elaboração de minuta de resposta ao Ofício nº 2026002609876 do MPGO	Geral	23/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-034.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	23/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-108.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Hidrológicos	GO-147	23/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-109.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-180	23/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-110.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos	GO-180	23/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-111.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Topográficos	GO-180	23/03/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta ao Ofício nº 512/2026 da SEINFRA	Comunicação escrita	Orientação para resposta ao Ofício nº 512/2026 da SEINFRA no âmbito do Requerimento nº 246/2026 da ALEGO entregue por comunicação escrita	Geral	24/03/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Advertência - Subcláusula 12.2.1 - Permanência	Gestão Contratual	Elaboração de minuta de notificação de advertência com fundamento na	GO-178A	24/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-019.1	Relatório Semanal de	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	24/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-025.1	Relatório Semanal de	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	24/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-025.1	Relatório Semanal de	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	24/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-024.1	Relatório Semanal de	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	24/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NT-103.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Condicionantes Ambientais	GO-180	24/03/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NT-104.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Condicionantes Ambientais	GO-178A	24/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NT-105.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Condicionantes Ambientais	GO-147	24/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NT-106.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Condicionantes Ambientais	GO-461	24/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-111.2	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Topográficos	GO-180	24/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-006.2	Análise do relatório de controle	Análise do relatório de controle ambiental	GO-178A	25/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-064.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	25/03/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	26/03/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Minuta de Manifestação ao Ofício nº 2405/2026 GOINFRA	Ofício	Elaboração de manifestação jurídica sobre o Ofício nº 2405/2026 GOINFRA que encaminha o Despacho Decisório nº 7/2026 sobre a análise da	Geral	26/03/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de Ofício de Encaminhamento da Resposta à Notificação SEI nº 88156911	Gestão Contratual	Elaboração de ofício de encaminhamento para resposta técnica a notificação da GOINFRA	GO-461	26/03/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de Ofício de Encaminhamento da	Gestão Contratual	Elaboração de ofício de encaminhamento para resposta técnica a	GO-147	26/03/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-069.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	26/03/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-070.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	26/03/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Revisão de Minuta de Resposta Técnica à	Gestão Contratual	Revisão de Minuta de resposta técnica à Notificação Extrajudicial SEI nº	GO-461	27/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-112.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	27/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-113.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos de Tráfego e	GO-147	27/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-114.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	27/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-115.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos de Tráfego,	GO-178A	27/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-035.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	27/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-036.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-180	27/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-116.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-461	27/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-117.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos	GO-461	27/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-063.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	27/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-008.1	Notificação de não	Notificação de Natureza Obra	GO-147	27/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-071.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	27/03/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-071.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	27/03/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-072.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	27/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-015.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	30/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-119.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	30/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-120.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP e Projeto de	GO-178A	30/03/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3	Geral	31/03/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	Geral	31/03/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°09 - 01.03.26 31.03.26	Geral	31/03/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	[CAEP,IFAG] Portfólio	Geral	31/03/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Prestação de Contas Mensais - Obras	Geral	31/03/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-147	Geral	31/03/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-178A	Geral	31/03/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-180	Geral	31/03/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-461	Geral	31/03/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - Interno IFAG	Geral	31/03/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO178A	Geral	31/03/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO147	Geral	31/03/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO180	Geral	31/03/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO461	Geral	31/03/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - Programa	Geral	31/03/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO178A	Geral	31/03/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO147	Geral	31/03/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO180	Geral	31/03/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO461	Geral	31/03/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - Programa	Geral	31/03/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo I - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - controle de recebimento e arquivamento de documentos e	Geral	31/03/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo II - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - perguntas aos responsáveis no período de recorte	Geral	31/03/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Relação de Minutas de Notificação elaboradas	Gestão Contratual	Encaminhamento de relação das minutas de notificação elaboradas para	Geral	31/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-118.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-180	31/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-121.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Hidrológicos	GO-180	31/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-025.1	Relatório Semanal de	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	31/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-026.1	Relatório Semanal de	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	31/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-026.1	Relatório Semanal de	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	31/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-020.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	31/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-122.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Componente Ambiental	GO-178A	31/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-123.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	31/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-124.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Hidrológicos	GO-147	31/03/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-125.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos	GO-461	31/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-013.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	02/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-006.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-461	06/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-007.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	06/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-007.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-180	06/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-007.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-147	06/04/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Relatório Grupo 1 - Relatório Mensal N°09	Relatório Mensal	Relatório Mensal da Entrega de Produtos de Março	Geral	06/04/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Timeline de Acompanhamento Macro até	Outros	Timeline de Coordenação de Pontos Macros	Geral	06/04/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Dashboard da Análise de Entrega de Produtos - março	Outros	Dashboard Mensal de Análise de entregas CAEP	Geral	06/04/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Dashboard de Não-Conformidade	Outros	Dashboard do Controle de Não-Conformidades	Geral	06/04/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Dashboard de Acompanhamento Ambiental	Outros	Dashboard do Controle Ambiental	Geral	06/04/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Controle de Entrega de Produtos de março	Outros	Planilha do Gerenciamento de entregas Mensal	Geral	06/04/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de março	Outros	Planilha com o Quadro Financeiro Mensal	Geral	06/04/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Planilha de gerenciamento de Não-Conformidade	Outros	Planilha de Não Conformidades	Geral	06/04/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Planilha de Acompanhamento Ambiental	Outros	Planilha de Acompanhamento Ambiental	Geral	06/04/2026	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	P1.2 - Controle de Reuniões do mês de março	Outros	Planilha do Controle de Reuniões	Geral	06/04/2026	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	P1.2 - 260313_Ata - Reuniao_IFAG-	Ata de Reunião	Ata da reunião realizada em 13/03/2026.	Geral	06/04/2026	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	P1.2 - 260320_Ata - Reuniao_IFAG-	Ata de Reunião	Ata da reunião realizada em 20/03/2026.	Geral	06/04/2026	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	P1.2 - 260326_Ata - Reuniao_IFAG-	Ata de Reunião	Ata da reunião realizada em 26/03/2026.	Geral	06/04/2026	Entregue
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	RL-P3.1-BI008-RGC-001	Relatório Técnico	RELATÓRIO DE GESTÃO DA CERTIFICAÇÃO	Geral	07/04/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	RV-OB-RD-GO180-IMP-E0000-E1644-COM-001	Relatório Técnico	RELATÓRIO DE VISITA – OBRAS COMPLEMENTARES	GO-180	07/04/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	RV-OB-RD-GO180-IMP-E0000-E1644-CAN-001	Relatório Técnico	RELATÓRIO DE VISITA – CANTEIRO DE OBRAS	GO-180	07/04/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	RV-OB-RD-GO461-IMP-E0000-E2617-CMP-001	Relatório Técnico	RELATÓRIO DE VISITA – ANÁLISE DE COMPLETEZA	GO-461	07/04/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 09	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a março de 2026	Geral	N/A	Em elaboração
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	P5.3 - Relatório de Gestão Contratual	Relatório Técnico	Relatório de Gestão Contratual referente às obras em andamento no	Geral	N/A	Entregue
5.4 RELATÓRIO DE CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	Manesco	P5.4 - Relatório Trimestral de Conformidade Legal em ESG	Relatório Técnico	Relatório trimestral de due diligence e conformidade ESG referente todas as obras em andamento	Geral	N/A	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-004.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Dezembro/2025	GO-147		Em elaboração
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-004.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Janeiro/2026	GO-461		Em elaboração

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-005.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Janeiro/2026	GO-147		Em elaboração
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-004.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Dezembro/2025	GO-180		Em elaboração
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-006.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Fevereiro/2026	GO-147		Em elaboração
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-005.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Janeiro/2026	GO-180		Em elaboração
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-006.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Fevereiro/2026	GO-180		Em elaboração
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-005.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Fevereiro/2026	GO-461		Em elaboração

- Dashboard Analítico das Entregas Executadas em março.

O painel analítico de entregas apresenta uma visão consolidada do desempenho do CAEP no mês de março de 2026, permitindo à Coordenação Geral Executiva acompanhar, de forma sintética e visual, os principais indicadores de produção e o comportamento das frentes de trabalho ao longo do período. A ferramenta reúne informações essenciais para a gestão contratual, como o volume total de produtos emitidos, o percentual de execução, a distribuição por status, a participação das empresas consorciadas e o comparativo entre as frentes técnicas, jurídicas e administrativas.

No período, foram registrados 211 produtos, dos quais 202 (96%) foram efetivamente entregues e 9 (4%) permaneciam em elaboração, conforme demonstrado no dashboard consolidado. Os indicadores evidenciam um expressivo aumento no volume de entregas em relação aos meses anteriores, refletindo a intensificação das atividades e a consolidação do ritmo produtivo do consórcio.

A distribuição por frentes de atuação indica a predominância da área de Gestão de Engenharia, Meio Ambiente e Desapropriação, responsável por 145 documentos, seguida por Assessoramento e Consultoria Jurídica, com 29 entregas, Gestão de Projetos e Contabilidade, com 18, Coordenação Executiva, com 15, e Certificação de Projetos e Obras, com 4 documentos. Essa configuração reforça o caráter multidisciplinar da atuação do CAEP e a forte concentração das atividades nas frentes técnicas de engenharia e acompanhamento das obras.

A análise temporal demonstra que a produção esteve distribuída ao longo de todo o mês de março, com picos significativos de emissão, especialmente nos dias 13, 20, 27 e 31, destacando-se este último como o dia de maior volume de entregas. Esses momentos de maior concentração refletem a consolidação de notas técnicas, relatórios de acompanhamento de obras, pareceres técnicos, documentos jurídicos e produtos de gestão, associados ao fechamento de ciclos semanais e ao encerramento do período mensal.

O dashboard fortalece o papel da Coordenação Geral Executiva ao viabilizar uma visão integrada e transparente das entregas, apoiando a prestação de contas à SEINFRA, ao IFAG, à Associação e aos órgãos de controle. A centralização das informações permite monitorar prazos, avaliar o desempenho das frentes de trabalho, identificar tendências operacionais e antecipar pontos de atenção, contribuindo diretamente para a tomada de decisões estratégicas e para a mitigação de riscos.

Assim, apresenta-se o painel atualizado de análise das entregas do CAEP referente ao mês de março de 2026, elaborado a partir da consolidação dos dados da planilha de controle e dos registros produzidos pelas empresas consorciadas. A visualização evidencia um salto relevante no desempenho produtivo do período, reafirmando a capacidade do consórcio de operar com elevada eficiência, rastreabilidade e governança na execução de suas responsabilidades contratuais.

CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Dashboard: Análise de Entregas CAEP


202
Entregues

211
Total

Tipos de Produtos Entregáveis

- ☐ 1.1 COORDENAÇÃO GERAL
- ☐ 1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
- ☐ 1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL
- ☐ 1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES
- ☐ 2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- ☐ 2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO
- ☐ 2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO
- ☐ 3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO
- ☐ 3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
- ☐ 4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO
- ☐ 4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL
- ☐ 4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE
- ☐ 5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO
- ☐ 5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL
- ☐ 5.4 RELATÓRIO DE CONFORMIDADE LEGAL EM ESG


Produtos X Entrega

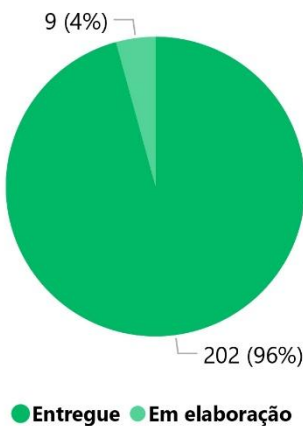


Quantidade de Documentos por Frente

	n°
Gestão de Engenharia, Meio Ambiente e Desapropriação	145
Assessoramento e Consultoria Jurídica	29
Gestão de Projetos e Contabilidade	18
Coordenação Executiva	15
Certificação de Projetos e Obras	4

Produtos por Empresa

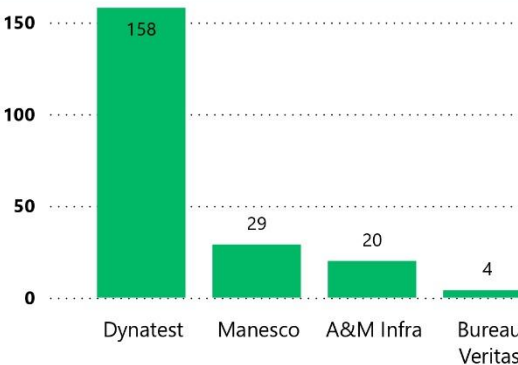

Controle de produtos mensal

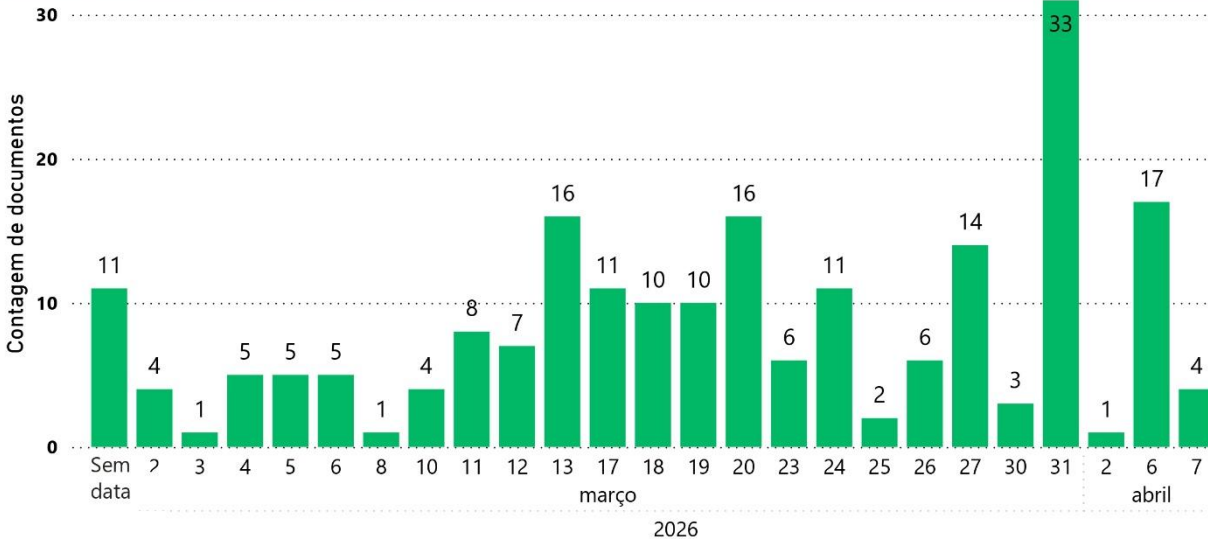

- Linha do Tempo do Progresso das Atividades Executadas em março.

No mês de março de 2026, verificou-se a manutenção do cenário de estabilidade institucional no âmbito do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA, não sendo registrados novos marcos relevantes que implicassem alteração na linha do tempo consolidada das atividades acompanhadas pelo Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos, CAEP.


Durante o período, não houve ocorrência de eventos estruturantes de natureza macro, tais como a publicação de novos editais, formalização de contratos adicionais, início de novas frentes de obras ou emissão de novas licenças ambientais. Dessa forma, a cronologia das ações permanece inalterada, refletindo a continuidade do ciclo já estabelecido nos meses anteriores.

As atividades desenvolvidas concentraram-se, predominantemente, na gestão operacional e no acompanhamento técnico das frentes em andamento, com ênfase no monitoramento de cronogramas, análise de produtos técnicos, verificação de conformidade contratual e articulação entre os agentes institucionais envolvidos, incluindo IFAG, GOINFRA, executoras, supervisoras e demais frentes do consórcio.

Esse contexto evidencia que o programa se encontra em fase consolidada de execução e controle, na qual os esforços institucionais estão direcionados à garantia da qualidade, regularidade e aderência das obras às diretrizes técnicas, ambientais e contratuais estabelecidas.

Assim, a linha do tempo referente ao mês de março de 2026 permanece sem atualizações, caracterizando um período de continuidade operacional e maturidade dos processos de governança, com atuação permanente do CAEP na coordenação e integração das atividades, assegurando a consistência e a transparência na condução dos empreendimentos.


Progresso das atividades executadas [Julho/2025]
Timeline

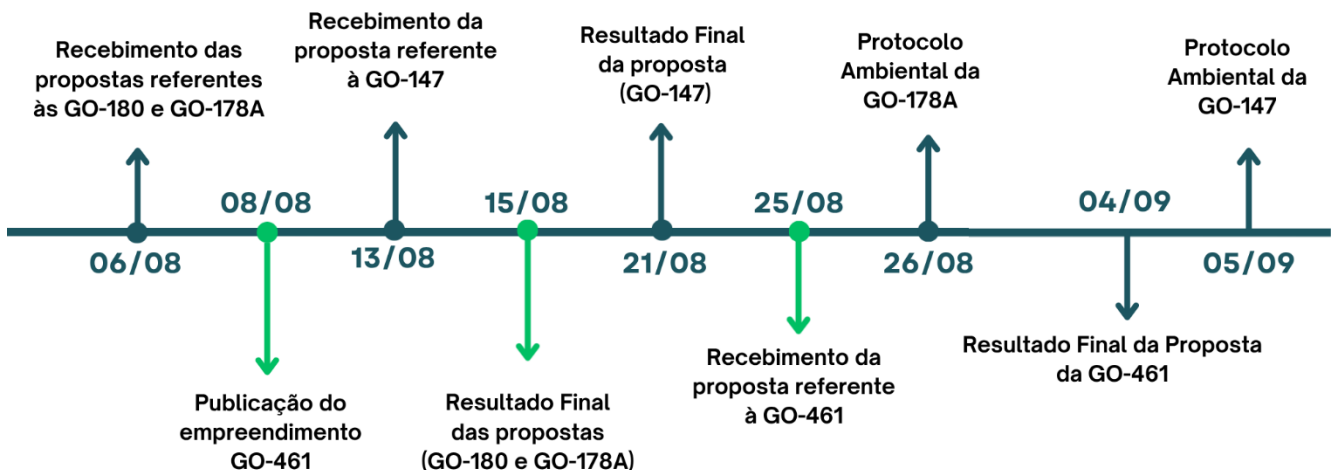Progresso das atividades executadas [Agosto/2025]
Timeline




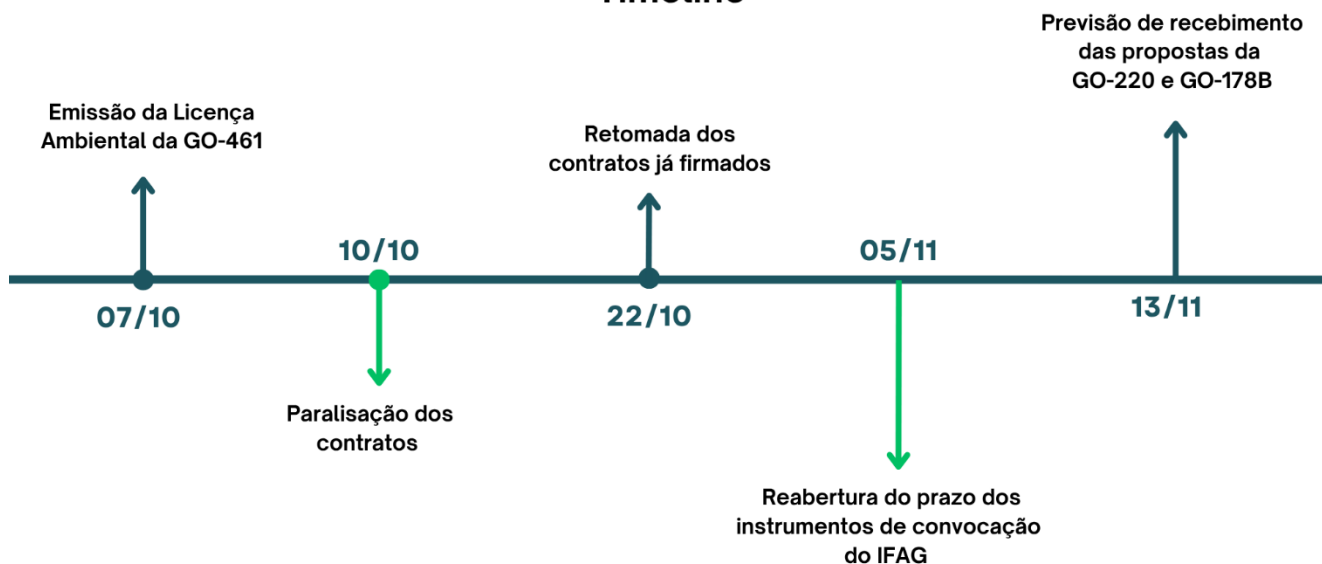
Progresso das atividades executadas [Setembro/2025]

Timeline

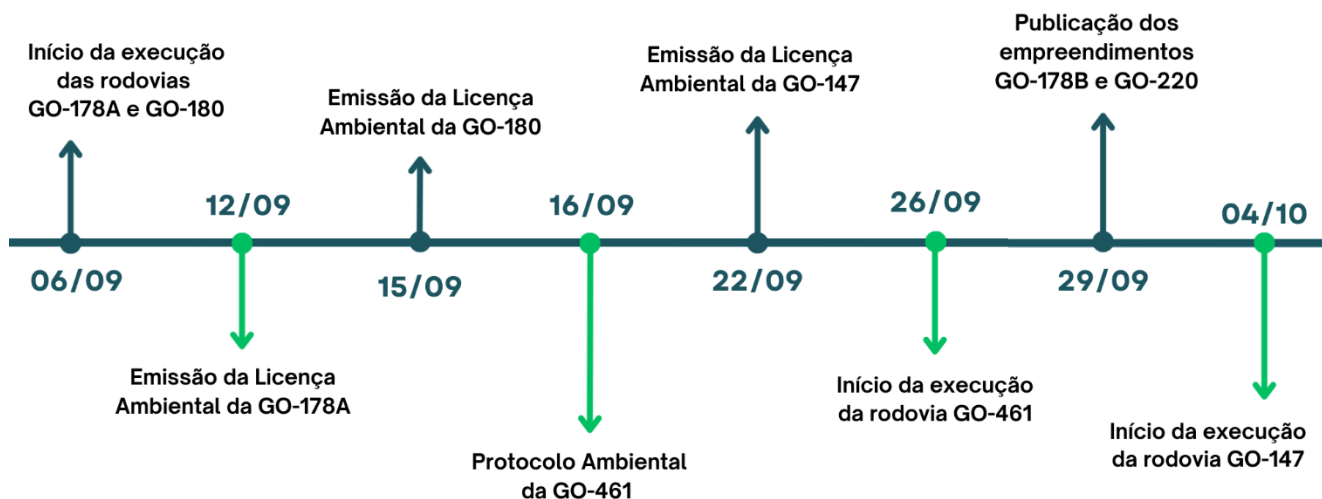

Progresso das atividades executadas [Outubro/2025]


Timeline





Progresso das atividades executadas [Novembro/2025]

Timeline



Progresso das atividades executadas [Dezembro/2025]

Timeline



Timeline

- Reuniões de Governança realizadas durante o mês de março.

Durante o mês de março, as reuniões de governança do Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP) mantiveram uma agenda intensa e estruturada, com foco no acompanhamento da execução contratual, na certificação de projetos e obras, e no fortalecimento dos mecanismos de controle técnico, financeiro e administrativo do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA. A Coordenação Executiva seguiu atuando como instância integradora entre IFAG, GOINFRA e empresas consorciadas.

As reuniões iniciais do mês concentraram-se na análise de aspectos financeiros e contratuais, incluindo pagamentos, repasses, faturamento, riscos contratuais e discussões relacionadas a termo aditivo e impactos das alterações legislativas. Também foram tratadas questões relativas à certificação e ao status dos projetos e obras, bem como à organização de rateios administrativos e impactos do contexto político sobre a execução do programa.

No âmbito técnico-operacional, as agendas com Dynatest e Bureau Veritas tiveram foco no acompanhamento do andamento das frentes de obra e do status dos projetos das executoras, com destaque para atrasos, pendências técnicas e necessidade de reforço na mobilização de equipes e equipamentos. Foram discutidas não conformidades em campo, especialmente relacionadas à supervisão e segurança, além de limitações associadas à ausência de projetos completos, impactando diretamente os processos de certificação e fiscalização.

As reuniões também aprofundaram as discussões sobre certificação de obras e projetos, evidenciando riscos associados à execução sem documentação técnica adequada. Nesse contexto, foram definidos encaminhamentos como intensificação da fiscalização em campo, padronização de fluxos documentais via SharePoint, exigência de planos de ação para não conformidades e estruturação de rotinas técnicas para acompanhamento das disciplinas de projeto.

As agendas com a Alvarez & Marsal concentraram-se na consolidação dos processos de acompanhamento físico-financeiro, incluindo redefinição de metodologias de cálculo de avanço físico, integração de indicadores em painéis BI e estruturação dos fluxos de prestação de contas. Também foram discutidos ajustes nos relatórios, padronização de anexos, consolidação de informações e organização dos ciclos de fechamento mensal e trimestral.

Ao longo do mês, a governança também foi marcada por discussões críticas sobre atrasos na entrega de projetos, necessidade de emissão de notificações formais e possibilidade de aplicação de sanções contratuais às executoras. Foram avaliados impactos de interferências técnicas, revisões de soluções de projeto com repercussão financeira e dificuldades operacionais decorrentes de condições climáticas, com destaque para a necessidade de manutenção da trafegabilidade das rodovias.

O mês foi encerrado com reuniões voltadas à análise de riscos financeiros e operacionais, incluindo possibilidade de paralisação de atividades diante de atrasos em repasses, bem como à formalização de notificações, advertências e comunicações institucionais. Também avançaram as tratativas relacionadas à prestação de contas, padronização de medições, organização documental e alinhamento entre os agentes envolvidos.

CAEP | Controle de Reuniões Março 2026



DATA	Participantes	Assuntos	Anexos
05/03/2026	Representantes CAEP - Dynatest, Bureau Veritas, Alvarez & Marsal e Manesco	Reunião de Governança CAEP - pauta: Pagamentos, termo aditivo e emenda do PL; Certificação e status de projetos e obras; Rateio da nota de débito - ND (escritório e móveis); Faturamento, repasses e riscos contratuais; Contexto político e impacto no projeto.	
06/03/2026	Dynatest: Victor Castro, Josiley Prado, CAEP: Alex Pineli IFAG: Sérgio Borges	Reunião de Governança IFAG e Dynatest - resumo ATA: A reunião avaliou o andamento das frentes de obra e o status das entregas de projetos dos consórcios CCL, CCB e Caiapó, com foco em cronograma de mobilização, qualidade dos projetos e ações de fiscalização. Josiley informou que a mobilização técnica da Caiapó deve aumentar com a chegada de equipamentos e manutenção prevista a partir do dia 20, e a organização de equipamentos deve iniciar em 1º de abril, mas ressaltou que o ritmo de obra permanece lento e a equipe está reduzida. Foi reportada uma não conformidade relacionada à segurança e falta de supervisão na COPLAN, e destacou-se a atuação mais rigorosa do novo fiscal Wander, cuja fiscalização mais severa pode impactar medições da executora se não houver melhorias. Victor apresentou o panorama de projetos: CCL evolui bem em várias disciplinas, com pendências em drenagem e geotécnico que podem exigir trabalho de campo e permitir aprovação parcial em cerca de quatro semanas; CCB é a mais atrasada, com problemas de prioridade nas disciplinas e dificuldades de acesso a arquivos. Decidiu-se organizar pastas aprovadas no drive para controle de versões e definir responsáveis para acompanhar reuniões técnicas e verificações.	
06/03/2026	Bureau Veritas: Vinicius Coutinho, Ciro Sampaio e Luis Quatorze CAEP: Alex Pineli IFAG: Sérgio Borges	Reunião de Governança IFAG e BV - resumo: A reunião teve como objetivo alinhar repasses, a certificação e a fiscalização das obras executadas pela CCL. Inicialmente foram debatidas a expectativa de regularização dos repasses e alterações na minuta de aditivo que possibilitarão pagamentos diretos pelo IFAG, com o objetivo de acelerar os processos administrativos. O grupo concentrou-se na situação da certificação da CCL: ficou claro que, sem projetos, cronogramas e entrega completa de documentação, a certificação fica comprometida e a fiscalização não consegue auditar adequadamente. Para mitigar isso foram acordadas maior presença em campo, com Ciro intensificando visitas e mobilização de um profissional para JATAI, controle amostral rigoroso de elementos como bueiros e a exigência de um plano de ações de não conformidades a ser preenchido pela CCL, condição para decisões sobre continuidade das obras em abril. Sérgio colocou-se disponível para apoiar a cobrança do plano e a notificação. Por fim, alinhou-se a rotina de reuniões técnicas e de projeto com a Dynatest, a inclusão de itens de certificação nas ATAs, e o uso do SharePoint do CAEP para consolidar disciplinas e versões aprovadas; Alex informou que as pastas estão disponíveis e que enviará a lista de documentos. Foi acordada a organização de uma visita presencial e o envolvimento de especialistas (Ciro, Luis) nas tratativas de projetos e certificação, além da padronização do envio de remessas com guia e link de acesso ao SharePoint.	

DATA	Participantes	Assuntos	Anexos
06/03/2026	A&M: Walter Schneider CAEP: Alex Pineli IFAG: Sérgio Fonseca e Eliseu Garcia	Reunião de Governança IFAG e A&M - resumo ATA: A reunião teve por objetivo alinhar critérios de acompanhamento do avanço físico das obras, integração do diagrama unifilar e o fluxo de prestação de contas (4.2) entre os times técnicos e a Goinfra. Foi apresentada e discutida a metodologia de cálculo do avanço físico global, incluindo premissas piloto aplicadas à rodovia 461 e a regra 70/30 para ponderação entre obra e projeto, com parcelas específicas destinadas a desapropriação e interferências. Informou-se que o padrão de cálculo será ajustado por refinamentos no zoom do BI e replicado e publicado na próxima sexta-feira. No aspecto operacional, o time acordou o fluxo de envio de medições à Goinfra e a necessidade de copiar as executoras nas prestações para registrar eventos como autorização de movimentação financeira e emissão de notas fiscais. Também ficou definido consolidar um relatório mensal/trimestral com anexos — incluindo o relatório de obras da Dynatest, os dados 4.2 e o diagrama unifilar — e entregar a versão finalizada na segunda-feira.	
12/03/2026	Representantes CAEP - Dynatest, Bureau Veritas, Alvarez & Marsal e Manesco	Reunião de Governança CAEP - pauta: Status das medições das executoras; Prestação de contas e adequação ao Controle Interno; PL na Assembleia e repercussões de imagem; Vistoria de obra, não conformidades e caminho para certificação; Visita técnica e constATAções de campo; Necessidade de notificação e responsabilidade da executora; Redação e encaminhamento da advertência.	
13/03/2026	Dynatest: Victor Castro, Josiley Prado, CAEP: Alex Pineli IFAG: Sérgio Borges	Reunião de Governança IFAG e Dynatest - resumo ATA: A reunião teve como objetivo revisar o andamento dos projetos de engenharia em estudo e em execução de campo, avaliar prazos de entrega e decidir ações de fiscalização e notificação para empreiteiras com desempenho irregular. Inicialmente foram apresentados relatos de campo e da programação de obras na rodovia 461, incluindo impacto das chuvas sobre o ritmo de trabalho e a importância da mobilização prevista para o final de março e início da segunda quinzena de abril como prazo crítico para disponibilidade de equipamentos. Discutiu-se também a execução de bueiros no lote 147, considerada viável sem grandes dificuldades, com topografia já em obra e execução condicionada à confirmação em reunião de campo. Na sequência foram apresentados os status de entrega das disciplinas por projeto: Caiapó apresenta avanço nas revisões com previsão de aprovações até o fim do mês; o projeto 147 está atrasado, com ausência do relatório geotécnico que compromete o prazo de 9 de abril; e o projeto 461 está em fase de estudos avançando, com início iminente das entregas do viário principal. Como decisão, foi aprovado notificar e registrar não conformidade pelos atrasos dos projetos, além de orientar a transformação dessas notificações em advertências contratuais em coordenação com a Manesco.	
13/03/2026	A&M: Walter Schneider e Igor Ferreira CAEP: Alex Pineli IFAG: Sérgio Fonseca e Eliseu Garcia	Reunião de Governança IFAG e A&M - resumo ATA: A reunião teve como objetivo alinhar a formATAção dos anexos de medição e a prestação de contas do portfólio, buscando reduzir retrabalho e adequar documentos às exigências de avaliação. Inicialmente, Walter Silva explicou a necessidade de revisar como o portfólio e outros produtos são anexados e propôs utilizar relatórios já consolidados no BI para evitar publicações adicionais apenas para medição; foi também destacada a inconsistência entre exigências trimestrais, mensais e a menção a uma prestação anual no manual, gerando dúvidas sobre o formato exigido pela auditoria. Na sequência, Igor Ferreira apresentou avanços do painel executivo e do BI, incluindo validação das porcentagens de avanço físico, integração dos repasses e correções visuais, com previsão de publicar atualizações e incluir evolução física por obra na semana seguinte. Sérgio (IFAG) comentou a intenção de consolidar prestações mensais em uma prestação anual e ficou combinado que Eliseu apresentará proposta de indicadores de execução em reunião futura. Houve alinhamento sobre priorização e estabilização dos painéis antes de mudanças, consolidação de planilhas, formalização de repasses para garantir registros, ciclo de fechamento com dATA-base dia 20 (causando defasagem de um mês entre execução e publicação) e encaminhamento de ordens de pagamento da Goinfra por e-mail. Foram agendadas reuniões de monitoramento de riscos com empreiteiras na última semana de março, com participação prevista de Eliseu e Igor.	
13/03/2026	IFAG: Sérgio Fonseca e Bruna Mendes Manesco: Gabriel Schroeder, Lucas Pinto, Ludmilla Ribeiro e Daniel Esteves CAEP: Alex Pineli	Reunião de Governança IFAG e Manesco	ATA 260313
19/03/2026	Representantes CAEP - Dynatest, Bureau Veritas, Alvarez & Marsal e Manesco	Reunião de Governança CAEP - pauta: Aditivo contratual e medições pendentes; Resposta Manesco ao MP; Advertência CCL; Avaliação técnica dos projetos e ações em obra; Impacto financeiro e risco de atraso nos repasses; Prazos, risco financeiro e decisão de parar se não houver pagamento.	


DATA	Participantes	Assuntos	Anexos
20/03/2026	Dynatest: Victor Castro, Josiley Prado, CAEP: Alex Pineli IFAG: Sérgio Borges	Reunião de Governança IFAG e Dynatest - resumo ATA: A reunião teve por objetivo atualizar o status dos projetos de rodovias, identificar atrasos dos projetistas e definir encaminhamentos contratuais e de fiscalização. Os participantes revisaram situação por trecho com foco em geotécnico, pedreiras e impactos financeiros de mudanças de solução. Foi registrado atraso na entrega de projetos no trecho 147, com notificação emitida; ana 461 avançou em estudos, mas está morosa na entrega do geométrico e da pavimentação; a 180 apresentou melhora nas entregas, porém propôs alteração de solução de pedreira com impacto financeiro aproximado de 9%, exigindo reunião técnica antes de retorno; a 178 está travada por revisão geotécnica em campo que impede liberação do geométrico e demais disciplinas. Ficou acordada a emissão de notificações formais, possibilidade de sanção, realização de reuniões técnicas e contatos de diretoria para exigir maior efetividade nas entregas. Os participantes também discutiram impacto das chuvas na obra e necessidade de manter a trafegabilidade. Josiley reportou precipitação nos trechos da Caiapó e da CCL; Alex e Sérgio avaliaram risco de paralisação e ausência de verba contratual para manutenção isolada. Houve relato de início parcial de terraplenagem interrompido pelas chuvas, com retomada prevista para o final de março e visitas de acompanhamento por Alex na semana seguinte; não houve ainda diálogo formal com o executor sobre a manutenção da trafegabilidade.	
20/03/2026	Bereau Veritas: Vinicius Coutinho, Ciro Sampaio e Luis Quatorze CAEP: Alex Pineli IFAG: Sérgio Borges	Reunião de Governança IFAG e BV - resumo ATA: A reunião visou revisar o status dos planos de ação recebidos, alinhar o fluxo de envio de documentos via SharePoint/GRD e avaliar riscos de não certificação e questões financeiras da parceria com o consórcio. Ciro apresentou o progresso da análise dos planos, apontou preenchimentos inadequados em muitos retornos e informou que pretende finalizar a análise dentro do prazo acordado, com limite até segunda-feira. Foi observado que a Coplan enviou GRDs mais organizadas, embora tenha dado prioridade a emergências como o caso da CCL. O grupo definiu o pacote mínimo de projetos necessários para análise (geotécnico, geométrico, terraplanagem, pavimentação), concordando que a liberação do geotécnico destrava as demais disciplinas, e acordou depositar documentos no SharePoint para cumprir a exigência de guarda por 10 anos, além de ajustar o modelo de GRD e o processo de transferência de arquivos. Quanto ao risco de não certificação, recomendaram notificação formal à executora, ressaltando que respostas da CCL foram insuficientes e genéricas. Na área operacional e financeira, foi confirmada a exigência de substituição do bueiro por concreto armado e identificadas preocupações com pagamentos em atraso; Alex ficará responsável pelas ações relativas aos pagamentos.	
20/03/2026	A&M: Walter Schneider e Igor Ferreira CAEP: Alex Pineli IFAG: Sérgio Fonseca e Eliseu Garcia	Reunião de Governança IFAG e A&M - resumo ATA: A reunião atualizou as entregas de BI e relatórios físico-financeiros, confirmando a publicação do avanço das obras no painel IFAG. O foco está na automação e melhorias internas para mitigar divergências de dados. Propôs-se sincronizar relatórios fotográficos quinzenais com financeiros mensais, consolidando o avanço global mensalmente para viabilizar marcos de fechamento e cruzamentos com o unificar em caso de inconsistências. Foram tratadas as prestações de contas trimestrais e mensais: envio de ofícios, aguardo de aprovação da Goinfra para validação oficial e publicação preliminar em Drive/SharePoint para checagem pela engenharia antes da divulgação pública. Operacionalmente, definiram-se ações como integração de Joberth ao acompanhamento, verificação pontual de percentuais discrepantes e padronização de processos de publicação e compartilhamento de controles. A equipe acordou simplificar anexos, priorizando um anexo físico de avanço e outro financeiro, e organizar o envio do termo de colaboração junto ao relatório de auditoria independente até o final do mês. Sobre o relatório 4.2, decidiu-se incluir ou omitir registrando justificativa e disclaimer sobre medições não aprovadas. Prazos acordados: preparar relatórios prioritários até o fim da próxima semana e fechar o pacote trimestral até o final do mês, além de agendar reuniões de riscos e rotinas com empreiteiros e inserir dados na plataforma IRIS após essas reuniões.	
20/03/2026	IFAG: Sérgio Fonseca e Bruna Mendes Manesco: Gabriel Schroeder, Lucas Pinto, Ludmilla Ribeiro e Daniel Esteves CAEP: Alex Pineli	Reunião de Governança IFAG e Manesco	ATA 260320
26/03/2026	IFAG: Armando Rollenberg, Sérgio Fonseca e Bruna Mendes Manesco: Gabriel Schroeder, Lucas Pinto, Ludmilla Ribeiro e Daniel Esteves CAEP: Alex Pineli	Reunião de Governança IFAG e Manesco	ATA 260326
26/03/2026	Representantes CAEP - Dynatest, Bureau Veritas, Alvarez & Marsal e Manesco	Reunião de Governança CAEP - pauta: Notificação e resposta à prestação de contas; Detalhes sobre retenção, medições e protocolos; Carta de paralisação; Notificações sobre projetos executivos.	

- Análise financeira do contrato até fevereiro/26 - 8ª medição.

As medições foram estruturadas sob a lógica formal de avaliação por produto, com base em critérios previamente definidos pela fiscalização, os quais consideram, de forma ponderada, a qualidade do atendimento e da equipe técnica, a qualidade da documentação e dos relatórios, bem como a conformidade com os prazos, convertendo o resultado avaliativo em parâmetro de pagamento dos serviços efetivamente comprovados. Tal sistemática reforça a robustez do processo de medição, assegura transparência, uniformidade de critérios e maior segurança institucional quanto à regularidade da despesa.

QUADRO FINANCEIRO CONSOLIDADO — 8ª MEDIÇÃO					
Contrato n.º 01/2025 Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos – CAEP					
Data de Assinatura do Contrato: 10/07/2025		Vigência: 36 meses		Referência: 8ª Medição – Fevereiro/2026	
Valor Inicial do Contrato	Valor Atual do Contrato	Valor Acumulado Medido	Valor da 8ª Medição	Saldo Contratual	% Acumulado Executado
R\$ 36.179.265,65	R\$ 21.912.482,34	R\$ 6.851.013,84	R\$ 538.089,55	R\$ 15.061.468,50	31,27%

Distribuição Financeira por Empresa

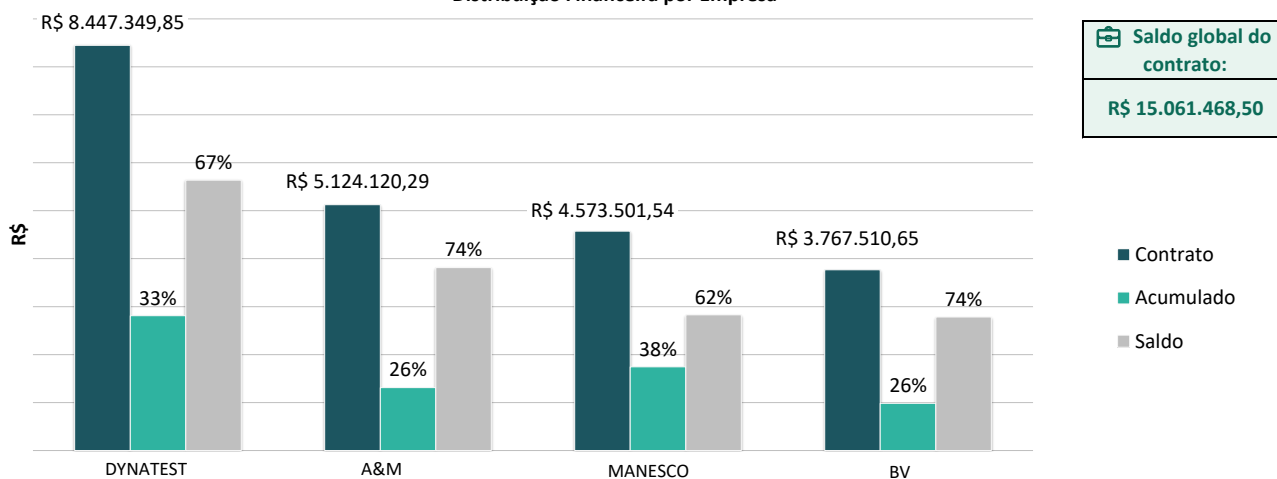

⚠ OBSERVAÇÃO SOBRE ADITIVO CONTRATUAL

Os valores apresentados a partir da 7ª medição consideram a readequação dos preços e quantitativos proposto na minuta do termo aditivo contratual.

• Pago	• Processado	• Em análise	• Não faturado
--------	--------------	--------------	----------------

RESUMO FINANCEIRO POR EMPRESA — 8ª MEDIÇÃO						
Empresa	Valor Mês	Valor Acumulado	Valor Contrato	% Executado	Saldo	Status
DYNA	R\$ 221.476,39	R\$ 2.810.260,74	R\$ 8.447.349,85	33,27%	R\$ 5.637.089,11	Pago
A&M	R\$ 112.199,28	R\$ 1.310.648,48	R\$ 5.124.120,29	25,58%	R\$ 3.813.471,81	Pago
MANESCO	R\$ 83.147,47	R\$ 1.745.355,15	R\$ 4.573.501,54	38,16%	R\$ 2.828.146,39	Pago
BV	R\$ 121.266,41	R\$ 984.749,47	R\$ 3.767.510,65	26,14%	R\$ 2.782.761,18	Pago
TOTAL	R\$ 538.089,55	R\$ 6.851.013,84	R\$ 21.912.482,34	31,27%	R\$ 15.061.468,50	

Sob a perspectiva físico-financeira, a 8ª medição totaliza R\$ 538.089,55, elevando o montante acumulado medido para R\$ 6.851.013,84, frente ao valor global contratual de R\$ 21.912.482,34, o que corresponde a 31,27% de execução acumulada do contrato. O quadro financeiro demonstra, ainda, que a medição em referência já reflete a readequação econômica decorrente da proposta de supressão vinculada ao termo aditivo em discussão, inclusive com a redução não linear de 47,80% sobre o valor global do saldo contratual e com a suspensão do Produto 1.3 – Comunicação Integrada, medida expressamente registrada como técnica, legal e administrativamente fundamentada.

RESUMO FINANCEIRO POR EMPRESA — 8ª MEDIÇÃO				
Contrato n.º 01/2025 CAEP Referência: Fevereiro/2026				
Empresa	Valor Mês	Valor Acumulado	% Executado	Saldo Contratual
DYNA	R\$ 221.476,39	R\$ 2.810.260,74	33,27%	R\$ 5.637.089,11
A&M	R\$ 112.199,28	R\$ 1.310.648,48	25,58%	R\$ 3.813.471,81
MANESCO	R\$ 83.147,47	R\$ 1.745.355,15	38,16%	R\$ 2.828.146,39
BV	R\$ 121.266,41	R\$ 984.749,47	26,14%	R\$ 2.782.761,18
TOTAL	R\$ 538.089,55	R\$ 6.851.013,84	31,27%	R\$ 15.061.468,50

No que se refere ao desempenho técnico das entregas reconhecidas na competência, verifica-se que os produtos efetivamente medidos foram, em sua ampla maioria, recebidos com avaliação integral para fins de pagamento, não havendo, no conjunto dos itens faturados na 8ª medição, ocorrência de redutor financeiro aplicado por insuficiência técnica da entrega. Nos Grupos 1, 2, 3 e 5, os produtos medidos no período foram expressamente reconhecidos como satisfatórios, comprovados e aderentes ao escopo contratual, com registro de desempenho integral nos critérios avaliados para os itens efetivamente mensurados, a exemplo dos Produtos 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 5.1 e 5.3. No Grupo 4, embora o Produto 4.1 - Relatório de Portfólio tenha registrado nota analítica de 87,50%, a própria fiscalização recomendou sua medição integral, sem aplicação de redutor financeiro, em razão do atendimento ao escopo mensal e da suficiência das evidências apresentadas; já o Produto 4.2 não foi medido por ausência de desembolso das obras e por não caracterização plena do objeto no período. Assim, do ponto de vista financeiro e de governança da medição, o conjunto dos itens reconhecidos não evidencia necessidade de apresentação de plano de ação corretivo como condição para continuidade da execução nos meses subsequentes.

BASE TÉCNICA — PLANILHA DE MEDIÇÃO IFAG (8ª MEDIÇÃO)									
ID	Produto	Unidade	Valor Unit.	Valor Contrato	% Acum.	Quant Med.	Valor Mês	Valor Acum.	Empresa
1.1	COORDENAÇÃO GERAL	MENSAL	R\$ 59.212,49	R\$ 2.095.854,28	27,29%	1,00	R\$ 59.212,49	R\$ 556.329,58	DYNA
1.2	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	MENSAL	R\$ 8.503,60	R\$ 615.391,05	66,26%	1,00	R\$ 8.503,60	R\$ 394.297,45	DYNA
1.3	COMUNICAÇÃO SOCIAL	MENSAL	R\$ 28.778,99	R\$ 180.720,54	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 180.720,54	A&M
1.4	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	MENSAL	R\$ 23.940,25	R\$ 872.086,22	29,45%	1,00	R\$ 23.940,25	R\$ 249.639,72	A&M
2.1	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	MENSAL	R\$ 58.407,02	R\$ 2.001.747,91	24,79%	1,00	R\$ 58.407,02	R\$ 483.165,48	DYNA
2.2	ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	POR OBRA	R\$ 116.110,78	R\$ 851.091,98	36,15%		R\$ 0,00	R\$ 307.693,53	DYNA
2.3	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LIC	POR OBRA		R\$ 109.380,60	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 109.380,60	DYNA
2.4	GERENCIAMENTO TÉCNICO	OBRA x MÊS	R\$ 23.838,32	R\$ 2.288.478,72	23,12%	4,00	R\$ 95.353,28	R\$ 511.370,11	DYNA
2.5	RECEBIMENTO DE OBRA	POR OBRA	R\$ 9.345,33	R\$ 37.381,32	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	DYNA
2.6	LICENÇA AMBIENTAL	POR OBRA		R\$ 448.023,99	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 448.023,99	DYNA
3.1	RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	MENSAL	R\$ 47.233,29	R\$ 1.775.628,33	31,75%	1,00	R\$ 47.233,29	R\$ 547.562,67	BV
3.2	PLANOS DE INSPEÇÃO	POR OBRA		R\$ 159.562,60	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 159.562,60	BV
3.3	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	OBRA x MÊS	R\$ 18.508,28	R\$ 1.832.319,72	15,46%	4,00	R\$ 74.033,12	R\$ 277.624,20	BV
4.1	RELATÓRIO DO PORTFÓLIO	MENSAL	R\$ 73.357,00	R\$ 2.630.004,74	28,26%	1,00	R\$ 73.357,00	R\$ 722.722,74	A&M
4.2	CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	OBRA x MÊS	R\$ 9.418,33	R\$ 866.486,36	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	A&M
4.3	GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	MENSAL	R\$ 14.902,03	R\$ 574.822,43	28,15%	1,00	R\$ 14.902,03	R\$ 157.565,48	A&M
5.1	ASSESSORIA JURÍDICA CONTÍNUA	MENSAL	R\$ 30.672,92	R\$ 1.141.600,88	31,03%	1,00	R\$ 30.672,92	R\$ 344.104,96	MANESCO
5.2	ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	POR OBRA		R\$ 557.270,70	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 557.270,70	MANESCO
5.3	RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	MENSAL	R\$ 52.474,55	R\$ 1.953.025,63	31,03%	1,00	R\$ 52.474,55	R\$ 588.687,33	MANESCO
5.4	CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	MENSAL	R\$ 66.631,22	R\$ 921.604,33	27,70%		R\$ 0,00	R\$ 255.292,16	MANESCO

Nesse sentido, registra-se que, no universo dos produtos avaliados na 8ª medição, tendo em vista as notas de avaliação obtidas, não houve necessidade de apresentação de plano de ação corretivo.

Por fim, apresenta-se o acompanhamento financeiro das medições do CAEP até o mês anterior:

LINHA DO TEMPO DE MEDIÇÕES — STATUS FINANCEIRO										
Contrato n.º 01/2025 CAEP Medições 1 a 8										
Pago Processado Em análise										
	MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO 2	MEDIÇÃO 3	MEDIÇÃO 4	MEDIÇÃO 5	MEDIÇÃO 6	MEDIÇÃO 7	MEDIÇÃO 8	TOTAL	
Empresa	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Processado	Processado	Processado	Pago
DYNA	R\$ 312.192,07	R\$ 389.743,01	R\$ 739.212,32	R\$ 270.833,58	R\$ 373.090,29	R\$ 319.147,94	R\$ 184.565,14	R\$ 221.476,39	R\$ 406.041,53	R\$ 2.404.219,21
A&M	R\$ 133.535,85	R\$ 200.293,76	R\$ 200.293,76	R\$ 122.760,04	R\$ 200.293,75	R\$ 200.293,76	R\$ 140.978,27	R\$ 112.199,28	R\$ 253.177,55	R\$ 1.057.470,92
MANESCO	R\$ 274.536,70	R\$ 285.876,79	R\$ 406.518,01	R\$ 114.510,63	R\$ 224.791,05	R\$ 272.827,03	R\$ 83.147,47	R\$ 83.147,47	R\$ 166.294,94	R\$ 1.579.060,21
BV	R\$ 58.320,94	R\$ 127.367,69	R\$ 118.619,99	R\$ 93.505,33	R\$ 182.892,53	R\$ 161.510,16	R\$ 121.266,41	R\$ 121.266,41	R\$ 242.532,82	R\$ 742.216,64
TOTAL	R\$ 778.585,56	R\$ 1.003.281,25	R\$ 1.464.644,08	R\$ 601.609,58	R\$ 981.067,62	R\$ 953.778,89	R\$ 529.957,29	R\$ 538.089,55	R\$	6.851.013,82

- Dashboard de Acompanhamento de Não Conformidades

No mês de março de 2026, a Coordenação Executiva do CAEP deu continuidade ao uso operacional e à evolução funcional do Dashboard de Acompanhamento de Não Conformidades, consolidando sua aplicação como instrumento estratégico de gestão, monitoramento e suporte à tomada de decisão no âmbito do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA.

A partir da estruturação conduzida nos meses anteriores pela Coordenação Executiva em conjunto com a equipe técnica de Engenharia, o dashboard passou a ser utilizado de forma plenamente integrada ao fluxo operacional das não conformidades, envolvendo as frentes de Engenharia, Meio Ambiente, Executoras, Supervisoras e IFAG, consolidando-se como ferramenta central de governança do processo de acompanhamento.

Nesse contexto, o painel compõe ativamente o processo de gestão, permitindo o monitoramento contínuo das notificações desde sua emissão até o efetivo encerramento, com acompanhamento sistemático dos status (em aberto, em plano de ação, em atraso e encerradas), dos prazos associados aos Planos de Ação Corretiva (PAC) e da evolução das tratativas junto às empresas responsáveis.

A utilização do dashboard tem demonstrado elevada efetividade no suporte à gestão por indicadores (KPIs), permitindo a identificação de desvios, priorização de ações corretivas, monitoramento por exceção e fortalecimento da rastreabilidade processual das notificações. Tal abordagem contribui diretamente para a mitigação de riscos técnicos, contratuais, ambientais e de segurança do trabalho, bem como para o aumento da eficiência na condução das tratativas junto aos agentes envolvidos.

Destaca-se que a base de dados do dashboard é estruturada a partir de planilha automatizada de acompanhamento de não conformidades, desenvolvida com lógica de padronização, integridade dos registros e atualização contínua das informações, contemplando dados estruturados de abertura, status, prazos, responsáveis, natureza da ocorrência e histórico de tratativas. Essa estrutura assegura maior confiabilidade dos dados, consistência das informações e aderência aos requisitos de controle e auditabilidade.

A Coordenação Executiva atuou diretamente no apoio à concepção, organização, padronização e validação dessa base de dados, garantindo sua aderência aos fluxos operacionais, bem como sua compatibilidade com os princípios de governança, transparência e controle exigidos no âmbito do CAEP.

A consolidação do uso do dashboard e de sua base estruturante reforça sua funcionalidade como instrumento de integração entre as áreas envolvidas, promovendo maior alinhamento entre CAEP, IFAG, empresas executoras e supervisoras, além de fortalecer os mecanismos de controle e acompanhamento das não conformidades.

Ressalta-se que a base de dados utilizada para alimentação do dashboard encontra-se anexada na presente entrega mensal, garantindo a rastreabilidade das informações, integridade dos dados e suporte às atividades de auditoria, controle e prestação de contas.

Dessa forma, o Dashboard de Acompanhamento de Não Conformidades consolida-se como ferramenta essencial de gestão e governança, evidenciando maturidade operacional, robustez metodológica e elevada capacidade de suporte à tomada de decisão e à gestão de riscos do programa.

Na sequência, apresenta-se a imagem atualizada do dashboard, considerando a última atualização realizada no mês de março de 2026. Ressalta-se que o link de publicação do painel foi atualizado, de acordo com a versão do QR code abaixo, contemplando a integração com ambiente em nuvem e mecanismo de atualização automatizada, ampliando a confiabilidade, disponibilidade e tempestividade das informações.



QR Code – Dashboard de Não-Conformidade Atualizado



Link:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaWY1Y2Y0MzktMTI2YS00ZGMwLTlhZmUtZTAwODY5YTk5YTBkIiwidCI6Ijc3OGYxMTVjLWUxMGEtNDgxMi1iMzVkLTBmYTc5ZWZlNzg1YiJ9>

- Dashboard de Acompanhamento Ambiental

No mês de março de 2026, a Coordenação Executiva do CAEP deu continuidade ao uso operacional do Dashboard de Acompanhamento Ambiental, consolidando sua aplicação como ferramenta estratégica de monitoramento das licenças ambientais, condicionantes e outorgas vinculadas aos empreendimentos do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA.

A ferramenta vem sendo utilizada de forma integrada pelas equipes técnicas de Engenharia e Meio Ambiente, em articulação com o IFAG e demais agentes envolvidos, compondo o fluxo contínuo de acompanhamento das obrigações ambientais e permitindo o monitoramento sistemático dos indicadores associados à conformidade ambiental dos empreendimentos.

O dashboard apresenta elevada funcionalidade ao consolidar, em ambiente analítico, indicadores-chave de desempenho (KPIs) relacionados ao licenciamento ambiental, tais como: quantitativo de licenças emitidas e pendentes, status das condicionantes (finalizadas, no prazo, pendentes e próximas ao vencimento), distribuição por rodovia e tipologia de licença, além da identificação de pontos críticos associados a prazos regulatórios e riscos ambientais.

A utilização contínua da ferramenta permite não apenas a visualização consolidada das informações, mas também o acompanhamento proativo das obrigações ambientais, subsidiando a atuação das equipes técnicas na cobrança de evidências, validação documental, controle de prazos e mitigação de riscos de não conformidade junto aos órgãos licenciadores e entidades de fiscalização.

A base de dados do dashboard é estruturada a partir de planilha de controle ambiental, concebida para consolidação e organização das informações relativas às licenças, condicionantes e outorgas, contemplando campos estruturados de controle, prazos, status, responsáveis e registros complementares, assegurando consistência e rastreabilidade das informações.

A Coordenação Executiva atuou no apoio à estruturação, organização e validação dessa base de dados, garantindo sua aderência aos fluxos de acompanhamento ambiental, bem como sua conformidade com os requisitos de governança, transparência e controle estabelecidos no âmbito do CAEP.

Ressalta-se que a base utilizada para alimentação do dashboard encontra-se anexada na presente entrega mensal, garantindo a transparência das informações, rastreabilidade dos dados e suporte às atividades de auditoria, controle e verificação independente.

A consolidação do uso do dashboard ambiental evidencia sua efetividade como instrumento de gestão, promovendo maior integração entre as áreas envolvidas, melhoria na organização das informações e fortalecimento do controle das obrigações ambientais ao longo da execução dos empreendimentos.



Na sequência, apresentam-se as imagens atualizadas do dashboard, considerando a última atualização realizada no mês de março de 2026.

QR Code – Dashboard de Acompanhamento Ambiental Atualizado



Link:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoibNTQ3ZTg0OTctNDhA2Zi00NGNhLWwMTAtODhA5NWFMmMTI4ZGQ0IiwidCI6Ijc3OGYxMTVjLWUxMGEtNDgxMi1iMzVhLTBmYTc5ZWE4Nzg1YiJ9>

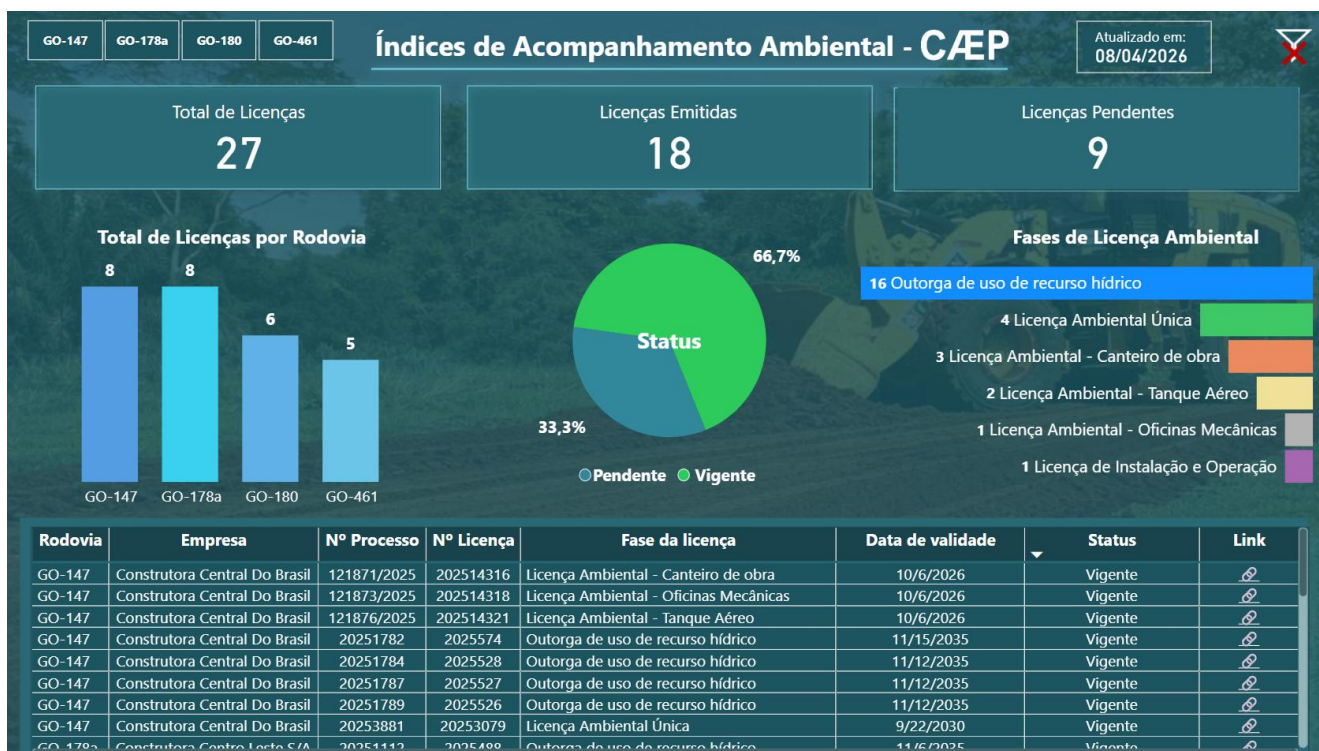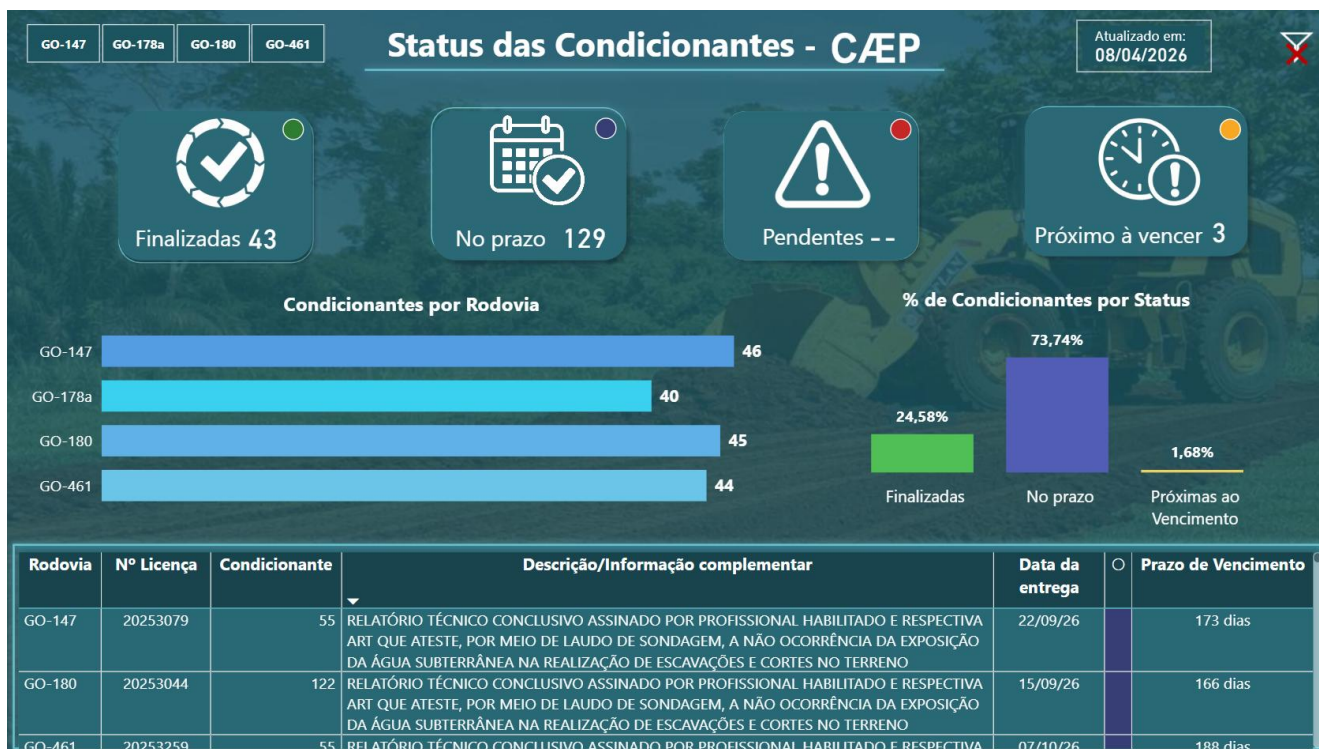

2.2 Produto 1.2 – Relatório de Relações Institucionais

2.2.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.2, referente ao Relatório de Relações Institucionais, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório detalhado que descreve atividades realizadas no período em atendimento às diversas interrelações institucionais necessárias à boa execução do portfólio. Deverá contemplar no mínimo:

- Relatório de Relacionamento Institucional: relatório que descreve a interação entre as diversas áreas do projeto, garantindo que o trabalho de cada setor (engenharia, certificação, contabilidade e jurídico) esteja alinhado e coordenado. Este relatório monitorará a integração dos processos e identificará oportunidades de integração entre as atividades.”*

2.2.2 Produtos desenvolvidos no período

- Integração Institucional e Consolidação de Processos executados em março.

Durante o mês de março, o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP) manteve agenda contínua de reuniões técnicas e de alinhamento operacional voltadas ao acompanhamento da execução das obras, à análise de medições e projetos, e à coordenação entre as equipes técnicas envolvidas no monitoramento dos empreendimentos vinculados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA. As agendas envolveram representantes do próprio CAEP e suas empresas consorciadas, do Instituto para Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (IFAG), da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) e das empresas executoras.

As pautas desenvolvidas ao longo do mês concentraram-se na análise de aspectos técnicos e administrativos relacionados à execução contratual, incluindo o acompanhamento das aprovações financeiras, medições, cronogramas e condicionantes ambientais. Destacaram-se discussões sobre pendências documentais que impactam diretamente os processos de medição e repasse, bem como a necessidade de regularização de evidências técnicas e ambientais para validação dos serviços executados.

As reuniões de alinhamento com a equipe da Dynatest concentraram-se na atualização do status dos projetos e obras, com destaque para atrasos em entregas, pendências em disciplinas técnicas, especialmente geotecnia e topografia, e impactos dessas restrições na liberação de medições. Também foram discutidas não conformidades identificadas em campo, falhas de supervisão, divergências normativas e a necessidade de reforço na qualidade da documentação técnica apresentada pelas executoras.

No âmbito das obras, foram avaliadas as condições de execução nas diferentes rodovias, incluindo paralisações, baixa produtividade decorrente de fatores climáticos e necessidade de mobilização de

equipes e equipamentos. Também foram tratadas interferências técnicas, condicionantes ambientais pendentes, regularização de atividades como armazenamento de insumos e adequação às exigências de órgãos fiscalizadores, além da necessidade de formalização de notificações e ajustes nos cronogramas físicos e financeiros.

Em paralelo, reuniões com IFAG e executoras, com destaque para a Coplan, abordaram o andamento dos projetos e seus impactos na execução das obras, evidenciando atrasos relevantes em estudos geológicos e geotécnicos que comprometem o avanço das demais disciplinas. Foram discutidas medidas para aceleração das entregas, reorganização das frentes de trabalho e normalização dos fluxos financeiros, além da necessidade de vinculação entre certificação e existência de projeto executivo aprovado como condição para avanço das obras.

As agendas também aprofundaram o debate sobre critérios técnicos de medição, consolidação de boletins de medição, validação de marcos físicos e necessidade de lastro documental para aprovação dos serviços. Foram discutidos ainda riscos associados à execução sem suporte técnico adequado, impactos financeiros decorrentes de alterações de projeto e a necessidade de alinhamento com a GOINFRA para definição de diretrizes técnicas e validação de soluções adotadas.

Destaca-se, adicionalmente, que, embora tenha sido apontada, no âmbito da análise da 2ª prestação de contas, a necessidade de inclusão das atas completas das reuniões realizadas, optou-se, neste produto, pela apresentação consolidada das informações em formato de síntese técnica. Tal diretriz decorre da necessidade de assegurar maior confidencialidade dos temas tratados entre os envolvidos. Ressalta-se que a formalização das reuniões por meio de atas não constitui exigência obrigatória para fins de comprovação das atividades desenvolvidas no âmbito deste produto, conforme suas atribuições estabelecidas no Termo de Referência. Ademais, a apresentação estruturada em planilha, contendo datas, participantes e assuntos, permite adequada rastreabilidade das atividades executadas, bem como melhor visualização da evolução temporal das ações, garantindo transparência, objetividade e aderência às diretrizes de governança do programa.

CAEP Controle de Reuniões Março 2026		CAEP
DATA	Participantes	Assuntos
03/03/2026	Dynatest: Guilherme Soares, Luiz Henrique Costa, Edson Shimizu e Victor Castro, Alvaro Laquis, Emine Lauara, Lara Cristina CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/Dynatest - resumo ata: A reunião tratou do status das aprovações financeiras, do avanço dos projetos e do andamento das obras, com foco em pendências documentais, medições e condicionantes ambientais. Todos os quatro processos de repasse têm aprovação formal, porém o ofício relativo ao repasse 147 aguarda assinatura de Salles; os estudos da 178-A só foram aceitos em fevereiro, explicando a ausência de medições anteriores. Na área de projetos foi reportado progresso da 180, com quatro disciplinas em análise de segundo nível; pendências topográficas e no DAP ainda impedem medições de aceitação. As frentes de obra foram atualizadas por rodovia: Caiapó está paralisada com retomada prevista para meados/final de março; a 178 executa cercamento, conservação e intervenções em bueiro/passa-fauna; a 461 enfrenta problemas de gestão de equipe e segurança que geraram não conformidade e motivam reunião disciplinadora. Há seis condicionantes ambientais pendentes, principalmente sobre armazenamento de produtos químicos, cuja validação pelo Corpo de Bombeiros está prevista para março e é crítica para a regularização documental. Foram também tratadas notificações reenviadas por Pedro, evidências ambientais pendentes de formalização do ofício ao IFAG, e ajustes no cronograma e fechamento dos relatórios mensais, com inclusão do passivo na próxima medição e validação por Eliseu, Alex, Emelie e Lara.
17/03/2026	Dynatest: Guilherme Soares, Luiz Henrique Costa, Edson Shimizu e Victor Castro, Alvaro Laquis, Emine Lauara, Lara Cristina CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/Dynatest - resumo ATA: A reunião revisou medições, apropriações financeiras, projetos e condicionantes ambientais de rodovias, focando na rodovia 180 e na consolidação mensal para pagamentos trimestrais. Identificaram-se pendências documentais que travam liberações, exigindo notificação às empresas. Foram avaliados entregáveis de tráfego, geotecnia, marcos e DAP, com orientação para que relatórios finais detalhem quantitativos e memórias de cálculo. Quanto às obras, discutiu-se o início do canteiro, impacto de chuvas e o aumento de maquinário em abril, além de questões de supressão vegetal. Tratou-se de não conformidades técnicas (alas de bueiro e segregação em passagens de fauna), sugerindo demolição ou laudo. Relatou-se atraso em entregas, rotatividade na equipe da contrATAda, divergências normativas (IP16/DUP) e falhas na supervisão (controle tecnológico/topografia). Por fim, definiu-se que pagamentos seguem suspensos até o envio da documentação completa pela supervisão, com prazos fixados para marcos e condicionantes.
23/03/2026	CAEP: Alex Pineli, Victor Castro, Josilei Prado IFAG: Sérgio Borges, Eliseu Garcia e Pedro Salomão Coplan: Nesinho, Vinicius Fonseca, Adriano Martinez	Reunião de Acompanhamento IFAG e Coplan - Andamento de Obras e Projetos - resumo ATA: A reunião tratou do acompanhamento dos projetos e da execução das obras do IFAG com a Coplan, focando atrasos nas entregas e seus impactos na execução física e na certificação. Após apresentação das equipes do IFAG, do consórcio CAEP e da Coplan foi relatado que a fase de estudos progrediu rapidamente no início, mas houve defasagem de cerca de dois meses nas entregas críticas, especialmente dos estudos geológico/geotécnico e do viário principal, o que bloqueia disciplinas predecessoras como geométrico, terraplenagem e pavimentação. A Coplan informou que entregaria os estudos geológico e geotécnico ao final da reunião e programou o início do envio dos projetos de terraplenagem, geométrico, drenagem e pavimentação a partir de 15/04, além de mobilizar equipe e equipamentos para triplicar mão de obra e maquinário antes do fim de abril. Discutiu-se a qualidade executiva e a regularização financeira: o IFAG normalizará pagamentos com a Goinfra em breve, priorizando obras no pós-chuva. A CAEP reforçou que a certificação exige projeto executivo aprovado, responsabilidade do consórcio. A Coplan comprometeu-se a acelerar entregas e iniciar a terraplenagem logo após a aprovação do projeto, antes mesmo da certificação formal. A Goinfra prevê analisar as medições na primeira semana de abril.
24/03/2026	Dynatest: Guilherme Soares, Luiz Henrique Costa, Edson Shimizu, José Augusto Meister e Victor Castro, Alvaro Laquis, Emine Lauara, Lara Cristina CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/Dynatest - resumo ATA: A reunião revisou medições e projetos, focando em pendências de topografia e geotecnia que travam repasses. Definiu-se análise por obra: os BMs 1 a 3 já estão na Goinfra, mas a falta de envio de documentos pela Supervisora põe em risco os BMs 4 a 6 e a certificação futura. Na rodovia 180, discutiram-se inconsistências e danos em marcos topográficos que podem exigir retrabalho. Quanto à geotecnia, orientou-se exaurir a pedreira Rio Claro antes de propor alternativas, visando evitar questionamentos do Tribunal de Contas. Consensuou-se que variações na altura do prisma não invalidam a altimetria, desde que o marco esteja firme. Sobre a Caiapó tratou-se de limpeza, reabertura de bueiros, atualização do diário de obra com assinaturas e condicionantes ambientais a regularizar junto ao IFAG, além de dúvida sobre escopo da IP19 a ser esclarecida com a GOINFRA. Foram apontadas pendências críticas de projeto geométrico e geotécnico, ausência recorrente do geotécnico pela executora, uso irregular de pedra de pedreira não prevista e dúvidas sobre dimensionamento de nova proposta de pavimentação. A obra segue com baixa produtividade por chuvas; registraram-se notificações e a necessidade de lastro documental para medições, com menção ao envio de elementos de medição ao IFAG. Por fim, debateu-se mudança de traçado que demanda posicionamento formal de Goinfra, gerência de projetos e agendamento de apresentação dos impactos na licença ambiental.
31/03/2026	Dynatest: Guilherme Soares, Luiz Henrique Costa, Edson Shimizu, José Augusto Meister e Victor Castro, Alvaro Laquis, Emine Lauara, Lara Cristina CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/Dynatest - resumo ATA: A reunião teve como propósito avaliar o andamento dos projetos e obras sob gestão da CAEP, com foco em pendências de projeto, geotecnia, medições e execução em campo. Foi decidido devolver ainda hoje a análise de hidrologia e a DUP reprovadas da Carapó, e a equipe identificou que a falta de avanço nos estudos geotécnicos é o principal gargalo na Caiapó e na CCL, impedindo definições sobre geométrico e pavimentação e podendo gerar alterações de custo significativas. Em sequência, foram discutidas as medições pendentes dos BMs 4 a 6 e a necessidade de documentação da supervisora e da empresa executora para janeiro e fevereiro, com encaminhamento ao IFAG para cobrança.

2.3 Produto 1.3 – Relatório de Comunicação Integrada

2.3.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.3, referente ao Relatório de Comunicação Integrada, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório com o objetivo de garantir que as informações sobre o andamento dos projetos e obras de infraestrutura sejam comunicadas de forma transparente e acessível às partes interessadas, incluindo as comunidades locais, órgãos governamentais, parceiros privados e o público em geral. Deverá contemplar no mínimo:

- *Este relatório abordará estratégias e atividades desenvolvidas, em andamento e planejadas, que tem como objetivo transparência do relacionamento proativo, minimizando o impacto da elaboração de projeto e execução da obra e assegurar a adesão das comunidades aos projetos de infraestrutura.”*

2.3.1.1 Suspensão dos Serviços de Comunicação Integrada

Em decorrência da proposta de supressão do Produto 1.3 (Comunicação Social) no âmbito do Contrato nº 01/2025 (CAEP–IFAG) e da ausência de manifestação formal da GOINFRA/SEINFRA sobre a retirada integral desse item do escopo, o IFAG solicitou, como medida de mitigação de risco e para evitar potenciais prejuízos ao erário e questionamentos de regularidade, a suspensão temporária da prestação dos serviços vinculados ao 1.3 até que haja anuência/posicionamento definitivo do órgão e a formalização por aditivo contratual. Segue email de registro do tema.

De: Engenharia Infra <engenharia.infra@ifag.org.br>
Data: 5 de fevereiro de 2025 às 15:17:14 BRT
Para: Gabriel Schroeder de Almeida <gabriel.almeida@manesco.com.br>, Alex Pinelli <alex.pinelli@dynatest.com.br>, Sergio Borges Fonseca Junior <sergio.junior@ifag.org.br>, Pedro Salomão Rodrigues de Abreu <pedro.abreu@ifag.org.br>
Assunto: Re: Supressão Contratual [GED-MRPAM.FID1537640]

Bom Tarde Gabriel / Alex,

Em observância ao Parecer encaminhado pela Empresa Manesco Advogados que versa sobre o aditivo de supressão dos serviços do CAEP, mais especificamente sobre o produto 1.3, informamos que:

- 1 – Para contextualização e maior segurança jurídica, solicitamos que seja incorporado ao Parecer, jurisprudências que anuem a referida supressão de um produto de forma integral do escopo do contrato, ou seja, Acórdãos, Decisões Transitadas em Julgado, Pareceres Normativos, que tratem o assunto e embasem tecnicamente esta decisão;
- 2 – Inserir no escopo da documentação, memória de cálculo apresentada pela empresa Alvarez e Marçal, demonstrando a inviabilidade do produto com a redução de 7 obras para 3 obras. Nesse demonstrativo é essencial fazer um comparativo de valores entre a atual estrutura para a entrega do produto e a estrutura necessária para atender a redução de obras, aplicando a redução de 47,60%;
- 3 – Conforme sugerido no Parecer, o IFAG já realizou cobranças à GOINFRA, através de ofício, para dar celeridade nas respostas, no que concerne à redução proposta, porém ainda não obtivemos retorno, dando aquiescência para alteração da redução, conforme proposta encaminhada pelo CAEP;
- 4 – Para não gerar insegurança jurídica aos envolvidos e não trazer prejuízos ao Consórcio e visando evitar danos ao erário, o IFAG solicita a suspensão da prestação dos serviços constantes do Produto 1.3 (sine die), até que se obtenha resposta da GOINFRA/SEINFRA acerca da supressão dos serviços sugerida pelo CAEP.

2.4 Produto 1.4 – Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC)

2.4.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.4, referente ao Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC), é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos


Relatório de todas as atividades de manutenção e desenvolvimento de plataforma integrada de gestão no âmbito do programa de gestão dos produtos, que consolida as atividades prestadas e apuração dos indicadores de apuração e desempenho.”

2.4.1.1 Publicação Rotineira do Painel de Sala de Situação no Site do IFAG

É publicado quinzenalmente, em conformidade com a estratégia do IFAG e CAEP, nos dias 17.03.26 e 26.03.26, com as principais rotinas de atualização do Portfólio e Painel de Acompanhamento Visual, e inclusão do painel de Resumo Executivo e Unifilar. A publicação traz as solicitações dos órgãos de controle e novos cenários pelos prazos e processos da GOINFRA.


2.4.1.2 Painel de Avanço Físico e Unifilar

- **Indicador de Avanço Físico da Obra:** Com a estruturação da metodologia de ponderação do indicador de avanço físico, viabilizada após a aprovação dos eventogramas, foi disponibilizado o painel de acompanhamento, a ser atualizado mensalmente, que traduz de forma visual a evolução semanal das obras, conforme representada em seus respectivos unifilares.

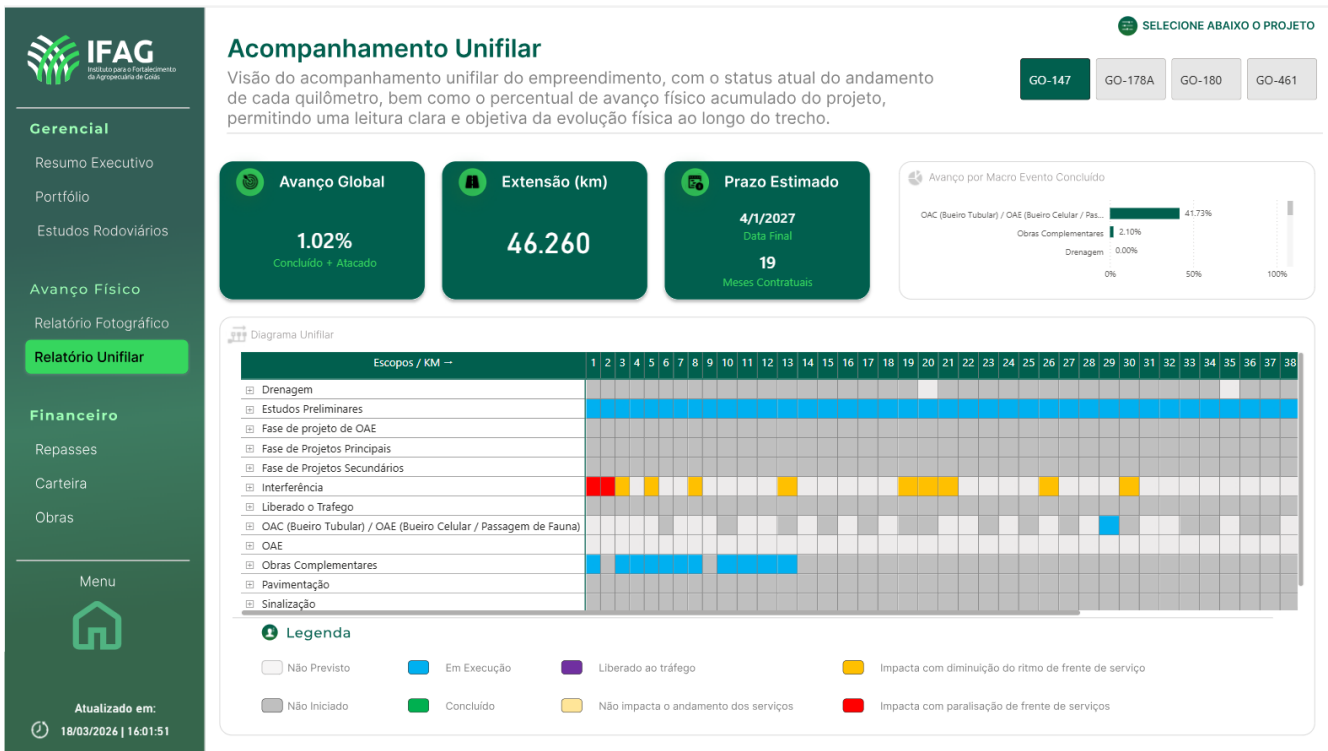

2.4.1.3 Atualização do Painel Resumo Executivo

Após a aprovação dos eventogramas em 04/02/2026 e 09/02/2026, foram incorporados ao Painel Executivo os indicadores de avanço físico das obras, permitindo o acompanhamento inicial da evolução da execução dos empreendimentos. Ressalta-se que o indicador de avanço financeiro será disponibilizado no painel após a aprovação das respectivas medições, momento em que será possível consolidar as informações financeiras de forma validada.

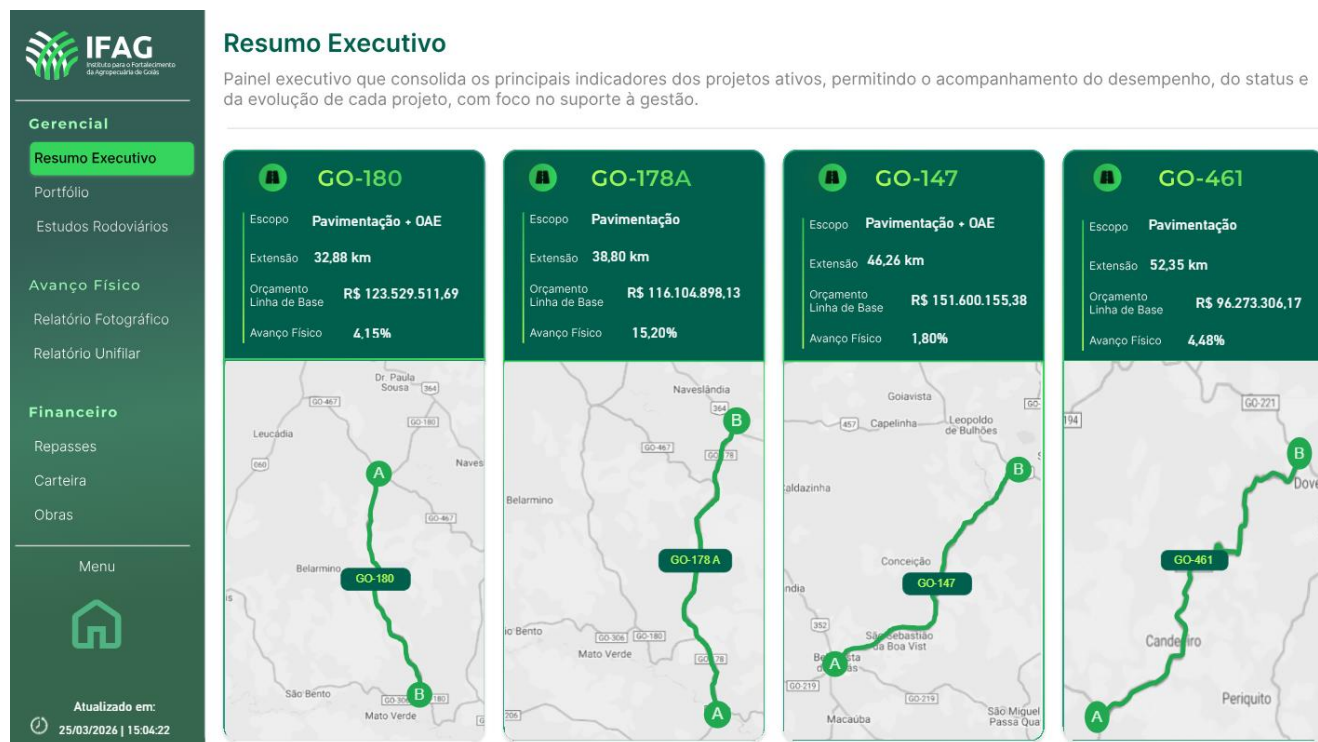

2.4.1.4 Atualização dos Painéis Financeiros

- **Painéis Financeiros:** Foram realizados ajustes e aprimoramentos nos painéis financeiros com o objetivo de qualificar a análise e o acompanhamento da execução orçamentária dos empreendimentos. As melhorias implementadas passaram a evidenciar comparativos entre os valores previstos e realizados no período, bem como a consolidação do realizado acumulado do empreendimento em relação ao previsto, permitindo uma visualização mais clara da evolução financeira das obras. Essa estruturação proporciona maior consistência na análise dos dados, favorecendo o monitoramento gerencial dos projetos e contribuindo para maior transparência e rastreabilidade das informações apresentadas nos painéis. Não obstante a isso, foram realizadas melhorias em atendimento aos apontamentos do IFAG, entregues via relatório. Essas melhorias consistem na atualização de alguns termos, e transmissões mais claras das informações econômicas e financeiras. Também, no período, foram atualizadas as informações referentes aos repasses liberados.



IFAG
Instituto de Apoio à Estruturação de Projetos da Agência de Gestão

Gerencial

Resumo Executivo

Portfólio

Estudos Rodoviários

Avanço Físico

Relatório Fotográfico

Relatório Unifilar

Financeiro

Repasses

Carteira

Obras

Menu



Atualizado em:
25/03/2026 | 15:04:22

Financeiro Repasses

Painel com visão completa do portfólio de empreendimentos, apresentando indicadores que permitem o acompanhamento da situação geral da carteira e do desempenho individual de cada empreendimento.

Repassé Solicitado

R\$ 12.528.002,55

Repassé Liberado

R\$ 11.968.586,13

Pago Financeiro

R\$ 7.238.129,70

Saldo Financeiro

R\$ 4.730.456,43

Visão Financeira

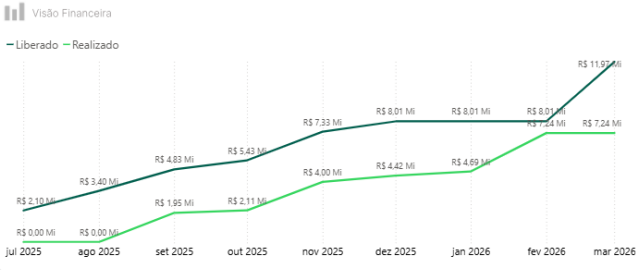


Tabela de Acompanhamento

Passa o mouse sobre o ícone de informação para ver a legenda da tabela.

Classe	Conta	Descrição	Repassé Solicitado [A]	Repassé Liberado [B]	Medido Econômico [C]	Pago Financeiro [D]	Saldo Financeiro [B-D]
Pessoal	70.501-2	Folha Salarial	R\$ 1.427.403,00	R\$ 1.352.967,52	R\$ 1.086.541,37	R\$ 1.086.541,37	R\$ 266.426,15
Administrativos	70.502-0	Aluguel, Contas e Serviços	R\$ 606.731,25	R\$ 606.731,25	R\$ 532.867,88	R\$ 532.867,88	R\$ 74.444,27
Investimento	70.503-9	Mobiliário e Eletrônicos	R\$ 80.500,00	R\$ 80.500,00	R\$ 65.009,00	R\$ 65.009,00	R\$ 15.491,00
Estruturadora	70.504-7	Consórcio - Alvarez/BV/Dynatest/Manesco	R\$ 6.458.734,85	R\$ 5.973.753,91	R\$ 5.554.292,36	R\$ 5.554.292,35	R\$ 419.461,56
Obras	70.508-X	GO-180	R\$ 1.701.141,05	R\$ 1.701.141,05			R\$ 1.701.141,05
Obras	70.509-8	GO-147	R\$ 1.299.543,56	R\$ 1.299.543,56			R\$ 1.299.543,56
Obras	70.510-1	GO-461	R\$ 953.948,84	R\$ 953.948,84			R\$ 953.948,84
Total			R\$ 12.528.002,55	R\$ 11.968.586,13	R\$ 7.238.710,61	R\$ 7.238.129,70	R\$ 4.730.456,43



IFAG
Instituto de Apoio à Estruturação de Projetos da Agência de Gestão

Gerencial

Resumo Executivo

Portfólio

Estudos Rodoviários

Avanço Físico

Relatório Fotográfico

Relatório Unifilar

Financeiro

Repasses

Carteira

Obras

Menu



Atualizado em:
25/03/2026 | 15:04:22

Financeiro Carteira

Painel com visão consolidada do portfólio de projetos, contemplando o orçado e o realizado, o saldo a executar, o status e os principais desvios identificados.

UTILIZE OS FILTROS PARA EXPLORAR OS DADOS

LIMPAR FILTROS

Região Rodovia Tipo de Obra Fase


Todos Todos Todos Todos

Tabela de Acompanhamento

Passa o mouse sobre o ícone de informação para ver a legenda da tabela.

Rodovia	Linha de Base Total [B]	Previsto no Mês [C]	Realizado no Mês [D]	Desvio no Mês [D-C]	Linha de Base Acumulada [E]	Realizado Acumulado [F]	Desvio Acumulado [F-E]
GO-147	R\$ 151.600.155,38	R\$ 1.200.281,07			R\$ 3.226.426,12		
GO-178A	R\$ 116.104.898,13	R\$ 1.573.348,98			R\$ 8.166.047,89		
GO-180	R\$ 123.529.511,69	R\$ 1.195.597,98			R\$ 3.664.236,01		
GO-461	R\$ 96.273.306,17	R\$ 1.130.314,25			R\$ 2.607.955,87		
Total	R\$ 487.507.871,37	R\$ 5.099.542,28			R\$ 17.664.665,89		

Linha de Base vs Realizado

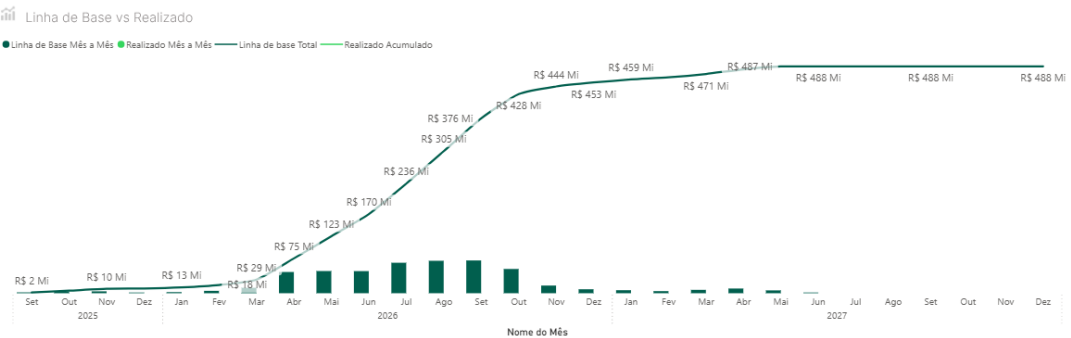



Gerencial

Resumo Executivo

Portfólio

Estudos Rodoviários

Avanço Físico

Relatório Fotográfico

Relatório Unifilar

Financeiro

Repasses

Carteira

Obras

Menu




Atualizado em:

25/03/2026 | 15:04:22

Financeiro Obras

Visão integrada da execução econômica, comparando orçamento e realizado, valores comprometidos (gastos firmes/prováveis) e forecast, com destaque para variações e impactos.

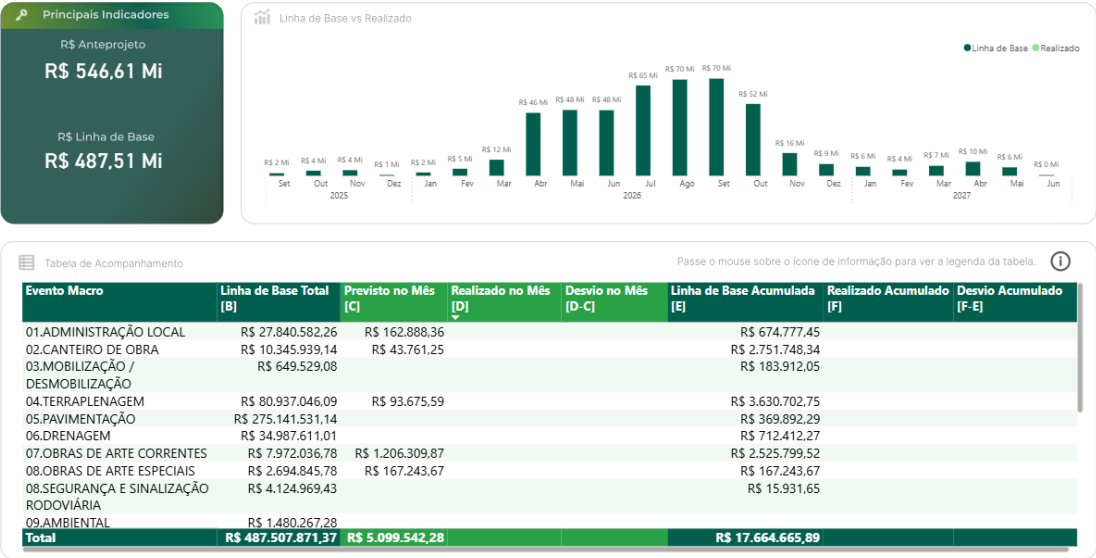

- **Acompanhamento Visual:** No período de referência, foram realizadas atualizações no Painel de Acompanhamento Fotográfico no dia 26/03/2026, referente à primeira quinzena de março. As imagens foram incorporadas de forma estruturada, permitindo evidenciar a evolução das frentes de serviço e o progresso físico dos empreendimentos ao longo do período analisado. As informações utilizadas têm como fonte os relatórios semanais de acompanhamento de obras, sendo consolidadas e disponibilizadas pelo CAEP, com atualização quinzenal e validação realizada pelo IFAG, assegurando a consistência e a confiabilidade dos registros apresentados no painel.



Gerencial

Resumo Executivo

Portfólio

Estudos Rodoviários

Avanço Físico

Relatório Fotográfico

Relatório Unifilar

Financeiro

Repasses

Carteira

Obras

Menu



Atualizado em:

25/03/2026 | 15:04:22

Acompanhamento Fotográfico

O acompanhamento fotográfico registra o progresso das atividades em campo, proporcionando uma visão in loco do andamento do projeto.



- **Portfólio:** No período de referência, foi realizado o acompanhamento no Pannel Portfólio, especialmente através das reuniões de PMO intra consórcio e com o IFAG, com a revisão e consolidação das informações relacionadas às etapas e fases dos projetos que compõem o conjunto de empreendimentos acompanhados. As atualizações permitiram refletir o status atual de cada iniciativa, conforme as práticas e nomenclaturas adotadas na gestão de projetos, proporcionando uma visão consolidada do andamento dos projetos. Porém, no período em questão não houve evolução dos tópicos de acompanhamento para atualizações no portfólio.



IFAG
Instituto para o Fortalecimento da Agricultura de Goiás

Gerencial

Resumo Executivo

Portfólio

Estudos Rodoviários

Avanço Físico

Relatório Fotográfico

Relatório Unifilar

Financeiro

Repasse

Carteira

Obras

Menu



Atualizado em:

 27/02/2026 | 12:24:43

Visão Portfólio

Visão geral do portfólio de empreendimentos, com apresentação dos principais indicadores da carteira e do desempenho individual de cada empreendimento.

UTILIZE OS FILTROS PARA EXPLORAR OS DADOS

LIMPAR FILTROS

Região

Rodovia

Tipo de Obra

Fase

All

All

All

All

**Obras em Iniciação**
0
*Projetos em elaboração pela GONFRA

**Obras em Contratação**
0

**Obras em Implantação**
4

**Obras em Encerramento**
0

**Obras Encerradas**
0
*Projetos acatados pela GONFRA

Tabela de Acompanhamento

RODOVIA	FASE	STATUS	ANTEPROJETO	CONTRATAÇÃO EPC	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	PROJETO EXECUTIVO	FASE DE ESTUDOS	PROJETO EXECUTIVO VIÁRIO PRINCIPAL	PROJETO EXECUTIVO VIÁRIO SECUNDÁRIO	OBRAS ARTES ESPECIAIS	APROVADO
GO-147	Implantação	Ativo	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Em curso	Em curso	À iniciar	À iniciar	À iniciar	
GO-178A	Implantação	Ativo	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Em curso	Em curso	Em curso	Em curso	N/A	
GO-180	Implantação	Ativo	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Em curso	Em curso	À iniciar	À iniciar	À iniciar	
GO-461	Implantação	Ativo	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Em curso	Em curso	À iniciar	À iniciar	N/A	

Legenda

Finalizado

Refere-se aos processos que já foram concluídos, com todas as etapas encerradas.

Em curso

Refere-se aos processos que estão em andamento, com ações sendo realizadas e acompanhamento ativo.

À iniciar

Refere-se aos processos que ainda não foram iniciados, mas que estão previstos nas etapas do empreendimento.

N/A

Refere-se aos processos para os quais a etapa do empreendimento não se aplica.

2.4.2 Produtos desenvolvidos no período

CAEP Controle de Produtos										
ID	Produto	Empresa Responsável	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data de Início	Data de entrega	Status Entrega	
1	1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3	Geral	01/02/2026	28/02/2026	Entregue	
2	1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	Geral	01/02/2026	28/02/2026	Entregue	

-CONFIDENCIAL-

37

ENCERRAMENTO

O **Relatório Mensal N° 09**, referente à consolidação e à apresentação das atividades desenvolvidas durante o mês de **01 de Março/2026 até 31 de Março/2026**, no âmbito do Contrato N°01/2025-IFAG, apresenta-se constituído de 39 (Trinta e Nove) páginas e 13 (Treze) anexos e adotou metodologia tecnicamente adequada e aderente às melhores práticas do assunto em questão, representando a opinião de seus subscritores.

Goiânia, 06 de abril de 2026



Documento assinado digitalmente
ALEX DE VASCONCELOS PINELI ALVES
Data: 13/04/2026 18:57:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alex de V. Pineli Alves

CAEP – Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos
Produto P1.1 e P1.2 – Relatório mensal – Grupo 1

Vinicius Daher

CAEP – Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos
Produto P1.3 e P1.4 – Relatório mensal – Grupo 1

ANEXOS

LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS	
REF.	DESCRIÇÃO
Anexo I	P1.1 - Controle de Entrega de Produtos de março.xlsx
Anexo II	P1.1 - Dashboard da Análise de Entrega de Produtos - março.pdf
Anexo III	P1.1 - Dashboard de Acompanhamento Ambiental.pdf
Anexo IV	P1.1 - Dashboard de Não-Conformidade.pdf
Anexo V	P1.1 - Planilha de Acompanhamento Ambiental.xlsx
Anexo VI	P1.1 - Planilha de gerenciamento de Não-Conformidade.xlsm
Anexo VII	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de março.xlsx
Anexo VIII	P1.1 - Timeline de Acompanhamento Macro até março 2026.pdf
Anexo IX	P1.2 - Controle de Reuniões do mês de março.xlsx
Anexo X	P1.2 - 260313_Ata_Reuniao_IFAG_Manescoassinadoassinado.pdf
Anexo XI	P1.2 - 260320_Ata_Reuniao_IFAG_Manescoassinadoassinado.pdf
Anexo XII	P1.2 - 260326_Ata_Reuniao_IFAG_Manescoassinadoassinado.pdf
Anexo XIII	1.4. Anexos.zip

CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

 **Dynatest**[®]

MANESCO

 **INFRA**
& CAPITAL PROJECTS
BY ALVAREZ & MARSAL



RELATÓRIO CAEP

Grupo 1 - Coordenação Geral Executiva

Relatório Mensal N° 10

Referente ao período de execução de 01.04.26 até 30.04.26

07 de Maio de 2026

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	3
2 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA.....	4
2.1 Produto 1.1 – Relatório de Coordenação Geral	5
2.1.1 Descrição das atividades atribuídas	5
2.1.2 Produtos desenvolvidos no período	5
2.2 Produto 1.2 – Relatório de Relações Institucionais	24
2.2.1 Descrição das atividades atribuídas	24
2.2.2 Produtos desenvolvidos no período	24
2.3 Produto 1.3 – Relatório de Comunicação Integrada	27
2.3.1 Descrição das atividades atribuídas	27
2.4 Produto 1.4 – Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC)	28
2.4.1 Descrição das atividades atribuídas	28
2.4.2 Produtos desenvolvidos no período	34
ENCERRAMENTO.....	35
ANEXOS	36

1 APRESENTAÇÃO

A seleção da empresa Estruturadora pelo Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG - ocorreu por meio do Instrumento de Convocação nº 01/2025 para empresas ou consórcio estruturador, qualificados junto à SEINFRA, conforme o Chamamento Público para pré-qualificação nº 001/2024 da SEINFRA. Consagrado vencedor, o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos - CAEP – desenvolverá, ao longo do contrato, atividades especializadas em gestão de infraestrutura, divididas conformes os grupos:



**Coordenação Geral
Executiva**



**Gestão de Engenharia
e Socioambiental**



**Certificação de
Projetos e
Obras**



**Gestão de Processos
Administrativos e
Contábeis**



**Assessoramento e
Consultoria Jurídica**

O CAEP é formado pelas empresas Dynatest Engenharia LTDA, Bureau Veritas do Brasil Sociedade Classificadora e Certificadora LTDA., Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA e Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados.

O Consórcio Estruturador apresenta ao IFAG o **Relatório Mensal N° 10**, referente ao período de **01 de Abril/2026 até 30 de Abril/2026**, em conformidade ao Contrato N° 01/2025-IFAG.

O presente Relatório Mensal apresenta os elementos do objeto contratual descrito no Termo de Referência como “Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA”.

2 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

A Coordenação Geral Executiva atua como agente de interface entre todos os envolvidos, isto é, IFAG, SEINFRA, GOINFRA, empresas projetistas, empresas executoras e empresas supervisoras, garantindo que o objetivo seja executado de forma eficaz, transparente e coordenada. A função central desta coordenação é manter a coesão entre as diversas áreas envolvidas (gerenciamento de obras, projetos, governança, contábil, legal, dentre outras) e assegurar que todas as atividades sejam realizadas de acordo com os padrões técnicos, legais e de governança definidos pela SEINFRA, GOINFRA, FUNDEINFRA e IFAG.

Principais atividades:

- Gestão centralizada;
- Integração das atividades;
- Interlocução com partes interessadas (stakeholders);
- Comunicação integrada;
- Acompanhamento de cronogramas e alocação de recursos;
- Gestão integrada de riscos;
- Acompanhamento de processos e prestação de contas;
- Desenvolvimento e manutenção de sistemas e painéis do tipo sala de situação.

2.1 Produto 1.1 – Relatório de Coordenação Geral

2.1.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.1, referente ao Relatório de Coordenação Geral, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório detalhado que descreve a estrutura da Coordenação Central, responsável pela gestão centralizada de todas as (macro)atividades e seus produtos, no âmbito de suas atribuições e responsabilidades. Deverá contemplar no mínimo:

- Progresso e Prestação de Contas das Atividades: relatório que consolida o progresso de todas as atividades executadas, em execução e planejadas, indicando as fases atuais de atendimento (status), a fim de assegurar a prestação de contas à Associação, SEINFRA, órgãos de controle, e demais partes interessadas além de oferecer transparência aos demais stakeholders quanto às suas atividades. Esses relatórios incluirão indicadores de desempenho globais e parciais, cumprimento de prazos, resultados financeiros e alinhamento às normas técnicas e legais.*
- Plano de Gestão Integrada de Riscos: documento que consolida a gestão de riscos de todas as áreas do projeto, garantindo que a visão abrangente e atualizada dos riscos envolvidos (financeiros, operacionais, ambientais, jurídicos, ou outros inerentes ao objetivo do projeto). O plano estabelecerá as medidas de mitigação e contingência, indicando os responsáveis por cada ação, além de promover a coordenação entre os setores para garantir uma resposta integrada.”*

2.1.2 Produtos desenvolvidos no período

- Planilha de Controle de Produtos referente ao mês de abril.

Durante o mês de abril de 2026, o CAEP manteve elevado nível de produção técnica e institucional, com a emissão de amplo conjunto de documentos voltados ao acompanhamento das obras, à análise de projetos executivos, à gestão contratual e ao suporte à governança do Programa. O período foi marcado por intensa atuação das frentes técnicas, com destaque para atas de reuniões de alinhamento, notas técnicas de análise e aceitação de projetos, pareceres técnicos, notificações de não conformidade, relatórios semanais e mensais de acompanhamento de obras, além de documentos gerenciais, financeiros, jurídicos e de certificação.

O conjunto de entregas evidencia a atuação integrada das empresas consorciadas Dynatest, A&M Infra, Bureau Veritas e Manesco, que atuaram de forma complementar nas frentes de engenharia, gestão contratual, certificação, planejamento financeiro, riscos, compliance e assessoramento jurídico. Observou-se, novamente, predominância das atividades vinculadas às frentes de Gerenciamento Técnico e Análise de Projeto, responsáveis por um grande volume de produção.

No âmbito técnico-operacional, destacaram-se as entregas relacionadas à análise de projetos executivos, contemplando DAP, DUP, estudos topográficos, geológicos, geotécnicos, drenagem, sinalização, obras complementares, projeto geométrico e pavimentação. Também foram emitidos pareceres técnicos sobre conformidade ambiental, controle tecnológico, interferências, medição de bueiros, alteração de traçado, topografia e encaminhamentos à GOINFRA, reforçando o monitoramento contínuo da execução e a validação técnica dos empreendimentos.

No campo da gestão contratual e assessoramento jurídico, a Manesco manteve atuação relevante por meio da elaboração e revisão de minutas de advertência, respostas a ofícios, pareceres de apoio institucional, documentos de gestão contratual e relatórios jurídicos. Destacam-se os instrumentos relacionados a atrasos de cronograma, permanência de não conformidades, respostas a notificações e apoio à revisão de esclarecimentos destinados a órgãos externos, como MP-GO e GOINFRA.

As áreas de Gestão de Projetos, Controle Financeiro, Portfólio, Riscos e Compliance, sob responsabilidade da A&M Infra, contribuíram com relatórios mensais de portfólio, prestação de contas, acompanhamentos financeiros por empreendimento, controle de relatórios, registros de aprovação, matrizes de riscos e relatórios IRIS aplicados às obras e ao Programa. Essas entregas reforçaram os mecanismos de governança, transparência, controle financeiro e suporte à tomada de decisão estratégica.

No campo da certificação, o Bureau Veritas manteve as atividades de verificação independente, com a emissão de relatório de gestão da certificação e relatórios de obras referentes aos empreendimentos GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461, contribuindo para o fortalecimento dos mecanismos de controle externo, inspeção técnica e conformidade dos empreendimentos acompanhados.

Além das entregas concluídas, o mês de abril registrou produtos em elaboração, especialmente relatórios jurídicos mensais e relatório de gestão contratual, refletindo atividades em andamento que permanecerão sob acompanhamento e consolidação nos ciclos subsequentes.

Dessa forma, o controle de produtos referente ao mês de abril de 2026 apresenta um panorama abrangente, consistente e atualizado da atuação do CAEP no período, assegurando rastreabilidade documental, transparência na execução das atividades e aderência às responsabilidades previstas no escopo contratual. O conjunto de registros subsidia diretamente a elaboração do Relatório de Coordenação Geral Mensal, constituindo instrumento essencial para o monitoramento das frentes de trabalho, a avaliação de desempenho e a prestação de contas às instâncias de governança.

Apresenta-se, portanto, a seguir, a planilha consolidada das entregas de abril de 2026, contendo a identificação do produto, a empresa responsável, o tipo de documento, a descrição, o empreendimento correspondente, a data de entrega e o status atualizado, permanecendo como ferramenta fundamental para o acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas pelo consórcio.

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-073.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	27/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-075.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	27/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-076.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	27/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-074.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	31/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-077.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	01/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-078.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	01/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-037.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	02/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-038.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	02/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-039.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	02/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-040.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	02/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-126.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DAP	GO-180	05/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-127.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Eventograma	GO-178A	06/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-084.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	08/04/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 08	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a março de 2026	Geral	08/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-079.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	09/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-128.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	09/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-129.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Sinalização e Obras Complementares, Drenagem, Geotecnia e Geométrico	GO-178A	09/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-130.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-180	09/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-131.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Topográficos	GO-180	09/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-083.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	09/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-021.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	09/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-026.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	09/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-027.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	09/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-027.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	09/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-081.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	10/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-082.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	10/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-080.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	10/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-015.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Projeto	GO-180	10/04/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	10/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-132.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-461	13/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-133.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-178A	13/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-041.1	Parecer	Parecer Técnico Encaminhamento da DUP	GO-178A	13/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-043.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto Geométrico	GO-180	14/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-045.1	Parecer	Parecer Técnico - Interferência de Adutora Ofício 002/2026	GO-147	14/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-049.1	Parecer	Parecer Técnico - Medição de Bueiro Ofício 019/2026	GO-147	14/04/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Advertência - Subcláusula 12.2.1 - Atraso no Cronograma de Projetos	Gestão Contratual	Elaboração de minuta de notificação de advertência fundamentada na subcláusula 12.2.1, a fim de advertir a empresa sobre o atraso nas entregas do cronograma de projetos	GO-180	14/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-046.1	Parecer	Parecer Técnico - Alteração de Traçado Ofício 017/2026	GO-147	15/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-087.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	15/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-088.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	15/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-022.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	15/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-027.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	15/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-028.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	15/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-028.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	15/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-085.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	16/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-086.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	16/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-089.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	16/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-054.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (out a nov/25)	GO-180	16/04/2026	Entregue

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-055.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Dez/25)	GO-180	16/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-056.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Out/25)	GO-147	16/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-007.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-147	16/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-053.1	Parecer	Parecer Técnico - Topografia	GO-180	17/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-065.1	Parecer	Parecer Técnico - Topografia	GO-178A	17/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-066.1	Parecer	Parecer Técnico - Topografia	GO-147	17/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-067.1	Parecer	Parecer Técnico - Topografia	GO-461	17/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-057.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Nov/25)	GO-147	17/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-058.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Dez/25)	GO-147	17/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-059.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Out/25)	GO-461	17/04/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Revisão de Advertência - Subcláusula 12.2.1 - Permanência de Não Conformidades	Gestão Contratual	Revisão de minuta de notificação de advertência com fundamento na subcláusula 12.2.1, a fim de advertir a empresa sobre a permanência de não conformidades	GO-178A	17/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-068.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	21/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-069.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	21/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-070.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	21/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-008.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-461	21/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-134.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	22/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-135.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos, DAP e Estudos Topográficos	GO-147	22/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-136.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-180	22/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-137.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-461	22/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-063.1	Parecer	Parecer Técnico DUP	GO-147	22/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-071.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Pavimentação	GO-178A	22/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-016.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	22/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-017.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	22/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-064.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Dez/25)	GO-178A	22/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-090.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-091.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	23/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-092.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-098.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-009.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-014.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-016.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-026.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-060.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Nov/25)	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-061.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Dez/25)	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-062.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (out a nov/25)	GO-178A	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-023.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-028.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-029.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-029.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	23/04/2026	Entregue

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-093.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	24/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-094.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	24/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-095.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	24/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-096.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	24/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-097.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	24/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-129.2	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Sinalização e Obras Complementares, Drenagem, Geotecnia e Geométrico	GO-178A	27/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-072.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto Geométrico	GO-147	27/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-099.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	27/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-010.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	27/04/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	27/04/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Resposta aos Ofícios nº 23/2026 e 24/2026 - CCB	Gestão Contratual	Minuta de resposta aos Ofícios nº 23 e 24/2026 recebidos no âmbito do Contrato nº 08/2025 sobre autonomia da Contratada, elaboração do projeto executivo, regularização de pagamentos e resposta a não conformidades	GO-147	27/04/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Revisão de Parecer Técnico-Jurídico - Resposta ao Ofício nº 45/2026 - CCL	Gestão Contratual	Revisão de Parecer Técnico-Jurídico sobre subtração de material lenhoso das faixas de domínio para subsidiar resposta do IFAG ao Ofício nº 45/2026 recebido no âmbito do Contrato nº 07/2025	GO-178A	27/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-138.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	28/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-139.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Drenagem	GO-178A	28/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-071.2	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Pavimentação	GO-178A	28/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-011.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	GO-147	28/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-018.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	28/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-019.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-052.1	Parecer	Parecer Técnico - Documentação para medição	GO-147	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-073.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-074.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade SST	GO-180	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-024.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-029.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-030.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-030.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	29/04/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3	Geral	30/04/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	Geral	30/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-100.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	30/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-101.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	30/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-103.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	30/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-104.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	30/04/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°10 - 01.04.26 30.04.26	Geral	30/04/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	[CAEP-IFAG] Portfólio	Geral	30/04/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - Interno IFAG	Geral	30/04/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Controle de Reuniões A&M	Geral	30/04/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	E-mails de Aprovação	Geral	30/04/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Prestação de Contas Mensais - Obras	Geral	30/04/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-147	Geral	30/04/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-178A	Geral	30/04/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-180	Geral	30/04/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-461	Geral	30/04/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Controle de Relatórios	Geral	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO178A	Geral	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO147	Geral	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO180	Geral	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO461	Geral	30/04/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos de abril

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - Programa	Geral	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO178A	Geral	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO147	Geral	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO180	Geral	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO461	Geral	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - Programa	Geral	30/04/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo I - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - controle de recebimento e arquivamento de documentos e informações relevantes para a gestão contratual no período de recorte	Geral	30/04/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo II - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - perguntas aos responsáveis no período de recorte	Geral	30/04/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Relatório Grupo 1 - Relatório Mensal N°10	Relatório Mensal	Relatório Mensal da Entrega de Produtos de Abril	Geral	07/05/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Timeline de Acompanhamento Macro até abril 2026	Outros	Timeline de Coordenação de Pontos Macros	Geral	07/05/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Dashboard da Análise de Entrega de Produtos - abril	Outros	Dashboard Mensal de Análise de entregas CAEP	Geral	07/05/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Controle de Entrega de Produtos de abril	Outros	Planilha do Gerenciamento de entregas Mensal	Geral	07/05/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de abril	Outros	Planilha com o Quadro Financeiro Mensal	Geral	07/05/2026	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	P1.2 - Controle de Reuniões do mês de abril	Outros	Planilha do Controle de Reuniões	Geral	07/05/2026	Entregue
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	RL-P3.1-BI008-RGC-001	Relatório Técnico	RELATÓRIO DE GESTÃO DA CERTIFICAÇÃO	Geral	07/05/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.3 - 2026.04 - GO178A	Relatório Técnico	RELATÓRIO DE OBRAS - GO178A	GO-178A	07/05/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.3 - 2026.04 - GO180	Relatório Técnico	RELATÓRIO DE OBRAS - GO180	GO-180	07/05/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.3 - 2026.04 - GO147	Relatório Técnico	RELATÓRIO DE OBRAS - GO147	GO-147	07/05/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.3 - 2026.04 - GO461	Relatório Técnico	RELATÓRIO DE OBRAS - GO461	GO-461	07/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-007.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-461	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-008.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-147	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-008.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-180	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-008.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	08/05/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Apoio à revisão do Portal da Transparência	Parecer	Elaboração de parecer para apoio ao IFAG na revisão do Portal da Transparência	Geral	11/05/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Apoio à revisão dos esclarecimentos ao MPGO	Parecer	Elaboração de parecer para apoio ao IFAG na revisão da prestação de esclarecimentos solicitadas pelo MPGO ao longo da parceria	Geral	11/05/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 09	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a abril de 2026	Geral	N/A	Em elaboração
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	P5.3 - Relatório de Gestão Contratual	Relatório Técnico	Relatório de Gestão Contratual referente às obras em andamento no período de recorte	Geral	N/A	Em elaboração

- Dashboard Analítico das Entregas Executadas em abril.

O painel analítico de entregas apresenta uma visão consolidada do desempenho do CAEP no mês de abril de 2026, permitindo à Coordenação Geral Executiva acompanhar, de forma sintética e visual, os principais indicadores de produção e o comportamento das frentes de trabalho ao longo do período. A ferramenta reúne informações essenciais para a gestão contratual, como o volume total de produtos emitidos, o percentual de execução, a distribuição por status, a participação das empresas consorciadas e o comparativo entre as frentes técnicas, jurídicas, administrativas e de governança.

No período, foram registrados 159 produtos, dos quais 157 (99%) foram efetivamente entregues e apenas 2 (1%) permaneciam em elaboração, conforme demonstrado no dashboard consolidado. Os indicadores evidenciam elevado nível de execução das atividades e manutenção da regularidade operacional do consórcio, refletindo a consolidação das rotinas de acompanhamento técnico, gestão contratual e monitoramento das obras.

A distribuição por frentes de atuação indica novamente a predominância da área de Gestão de Engenharia, Meio Ambiente e Desapropriação, responsável por 112 documentos, seguida por Gestão de Projetos e Contabilidade, com 21 entregas, Assessoramento e Consultoria Jurídica, com 13, Coordenação Executiva, com 8, e Certificação de Projetos e Obras, com 5 documentos. Essa configuração reforça o caráter multidisciplinar da atuação do CAEP e demonstra a forte concentração das atividades nas frentes técnicas de engenharia, fiscalização e acompanhamento operacional dos empreendimentos.

No recorte por empresa, observa-se a liderança da Dynatest, com 118 produtos entregues, seguida pela A&M Infra, com 23, pela Manesco, com 13, e pelo Bureau Veritas, com 5 documentos. A distribuição evidencia a predominância das atividades técnicas e operacionais conduzidas pela equipe de engenharia, ao mesmo tempo em que confirma a integração entre as áreas de governança, assessoramento jurídico, gestão financeira e certificação independente.

A análise temporal demonstra que a produção esteve distribuída ao longo de todo o mês de abril, com picos expressivos de emissão especialmente nos dias 23 e 30, destacando-se este último como o dia de maior volume de entregas do período. Esses momentos de maior concentração refletem a consolidação de relatórios de acompanhamento de obras, notas técnicas, pareceres técnicos, documentos jurídicos, relatórios financeiros e instrumentos de gestão associados ao fechamento dos ciclos semanais e mensais de controle e prestação de contas.

O dashboard fortalece o papel da Coordenação Geral Executiva ao viabilizar uma visão integrada e transparente das entregas, apoiando a prestação de contas à SEINFRA, ao IFAG, à Associação e aos órgãos de controle. A centralização das informações permite monitorar prazos, avaliar o desempenho das frentes de trabalho, identificar tendências operacionais e antecipar pontos de atenção, contribuindo diretamente para a tomada de decisões estratégicas e para a mitigação de riscos.

Assim, apresenta-se o painel atualizado de análise das entregas do CAEP referente ao mês de abril de 2026, elaborado a partir da consolidação dos dados da planilha de controle e dos registros produzidos pelas empresas consorciadas. A visualização evidencia a manutenção de elevado desempenho produtivo no período, reafirmando a capacidade do consórcio de operar com eficiência, rastreabilidade e governança na execução de suas responsabilidades contratuais.

CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Dashboard: Análise de Entregas CAEP


157
Entregues

159
Total

Tipos de Produtos Entregáveis

- ☐ 1.1 COORDENAÇÃO GERAL
- ☐ 1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
- ☐ 1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL
- ☐ 1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES
- ☐ 2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- ☐ 2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO
- ☐ 2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO
- ☐ 3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO
- ☐ 3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
- ☐ 4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO
- ☐ 4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL
- ☐ 4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE
- ☐ 5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO
- ☐ 5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL


Produtos X Entrega

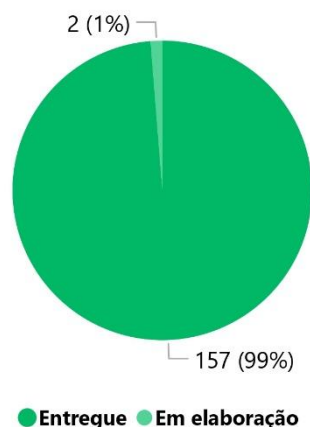


Quantidade de Documentos por Frente

	n°
Gestão de Engenharia, Meio Ambiente e Desapropriação	112
Gestão de Projetos e Contabilidade	21
Assessoramento e Consultoria Jurídica	13
Coordenação Executiva	8
Certificação de Projetos e Obras	5

Produtos por Empresa

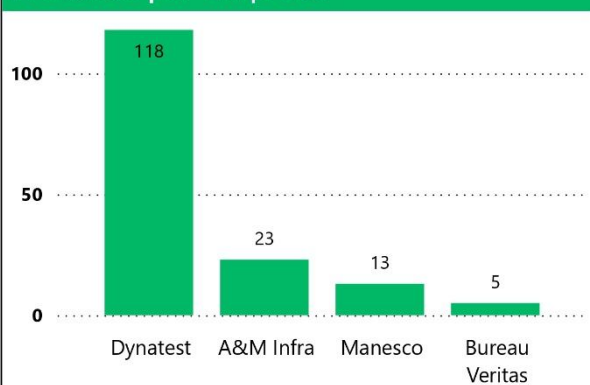

Controle de produtos mensal

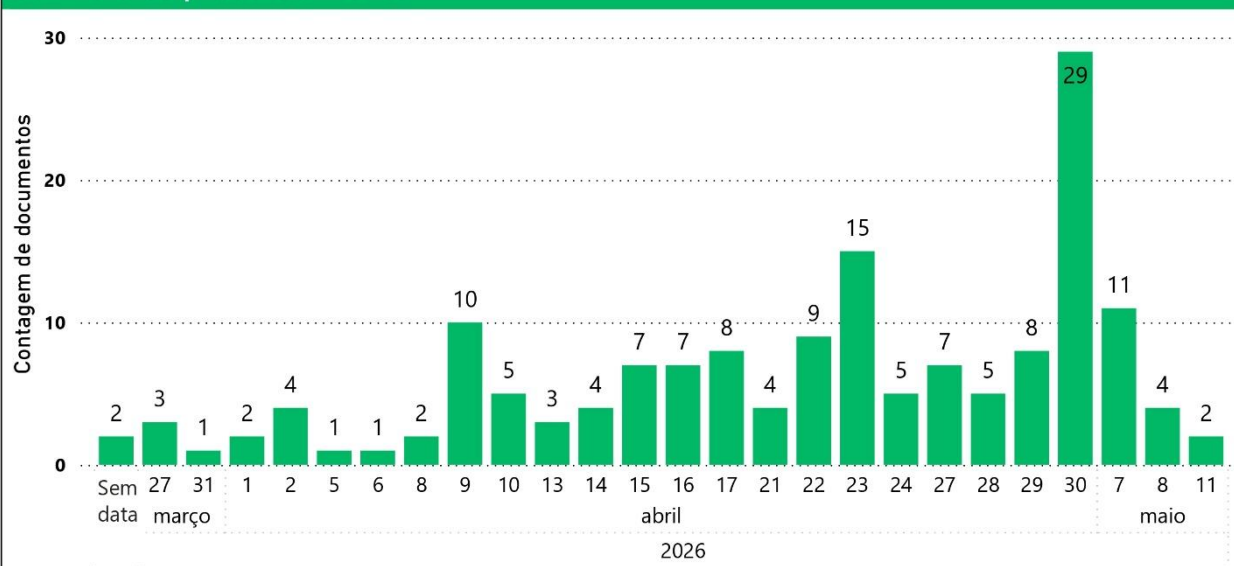

- Linha do Tempo do Progresso das Atividades Executadas em abril.


O mês de abril de 2026 caracterizou-se pela ocorrência de um marco institucional de natureza administrativa e financeira no âmbito do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA, relacionado à operacionalização das retenções cautelares determinadas pela GOINFRA no contexto da prestação de contas vinculada ao Termo de Colaboração nº 001/2025. Sob acompanhamento do Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos, CAEP, o período concentrou-se na consolidação documental, na rastreabilidade dos processos e na continuidade do monitoramento técnico das obras em execução.

O mês de abril não registrou novos eventos macro relacionados à publicação de empreendimentos, recebimento ou julgamento de propostas, emissão de licenças ambientais ou início de novas frentes executivas. Dessa forma, a linha do tempo permanece predominantemente estável sob a perspectiva da coordenação central do programa, refletindo um período voltado ao fortalecimento dos mecanismos de controle, governança e acompanhamento institucional.

Nesse contexto, o CAEP manteve sua atuação contínua na coordenação técnica e no acompanhamento das obras em andamento, assegurando integração entre as frentes administrativa, contratual, ambiental e operacional, bem como suporte às rotinas de monitoramento, prestação de contas e conformidade dos processos vinculados ao FUNDEINFRA.

Assim, a linha do tempo de abril evidencia um período de consolidação dos instrumentos de controle e fiscalização financeira do programa, reforçando a maturidade do modelo de governança implementado e a atuação integrada entre GOINFRA, IFAG e CAEP na condução e acompanhamento das obras estruturantes do Estado de Goiás.


Progresso das atividades executadas [Julho/2025]
Timeline

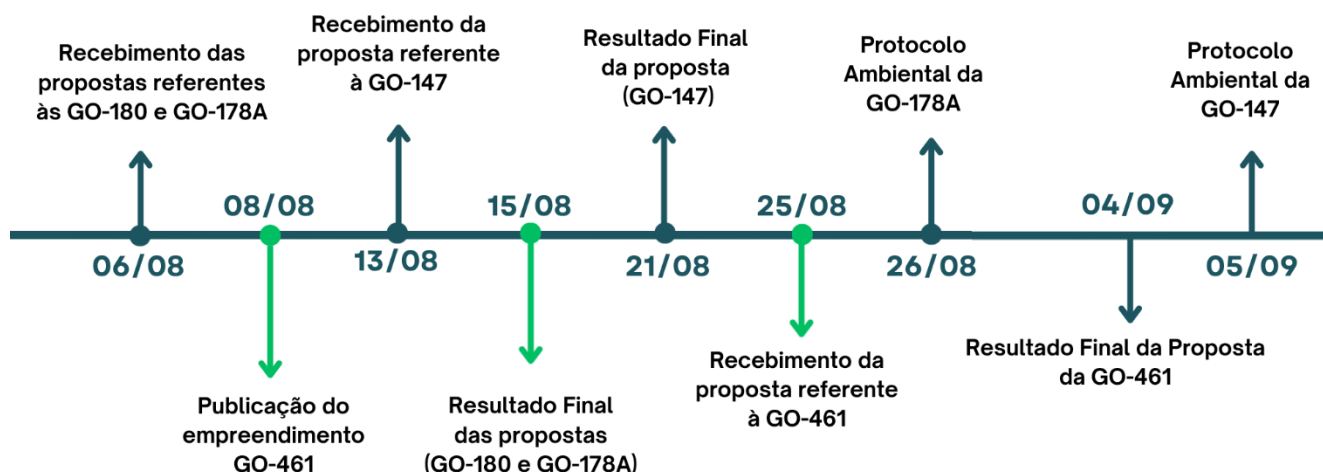Progresso das atividades executadas [Agosto/2025]
Timeline




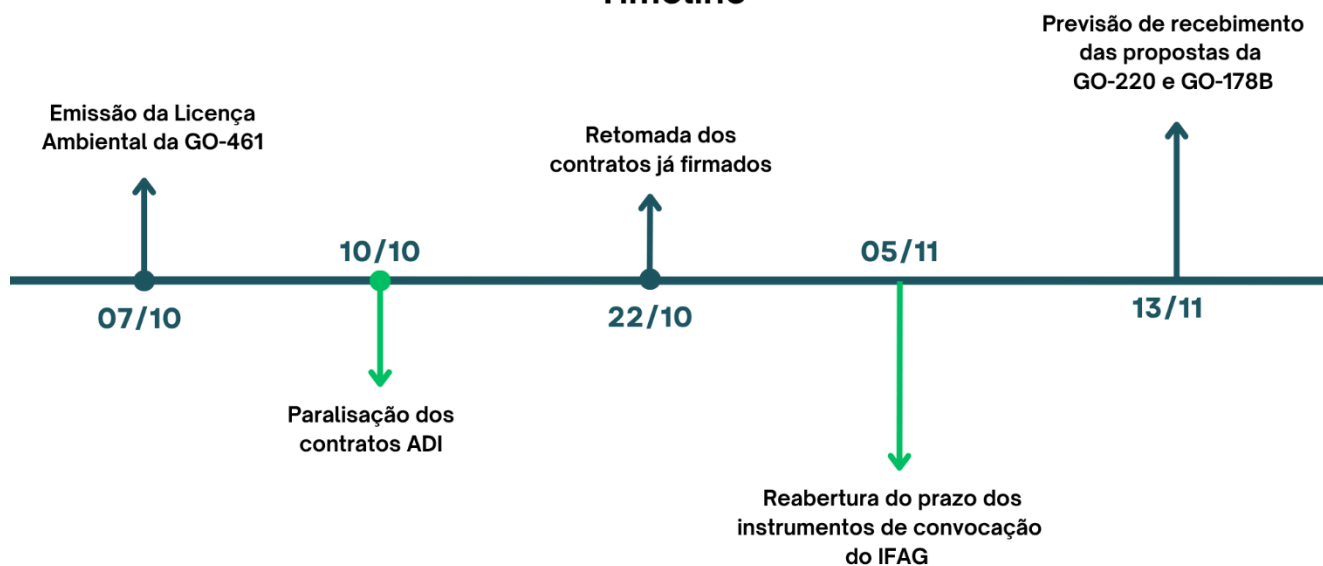
Progresso das atividades executadas [Setembro/2025]

Timeline

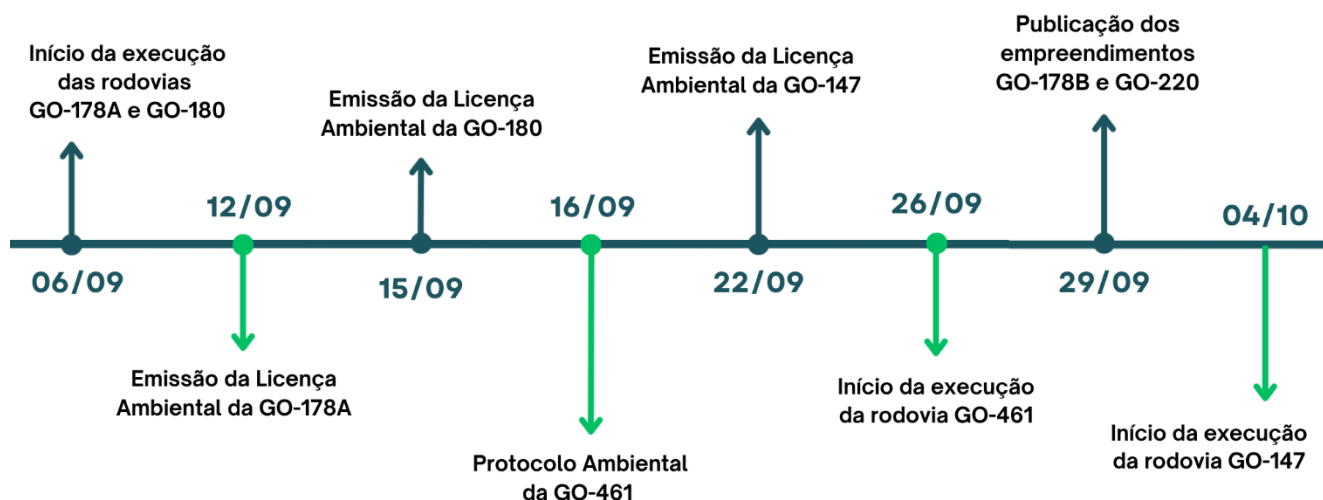

Progresso das atividades executadas [Outubro/2025]

Timeline






Progresso das atividades executadas [Novembro/2025]

Timeline



Progresso das atividades executadas [Dezembro/2025]

Timeline

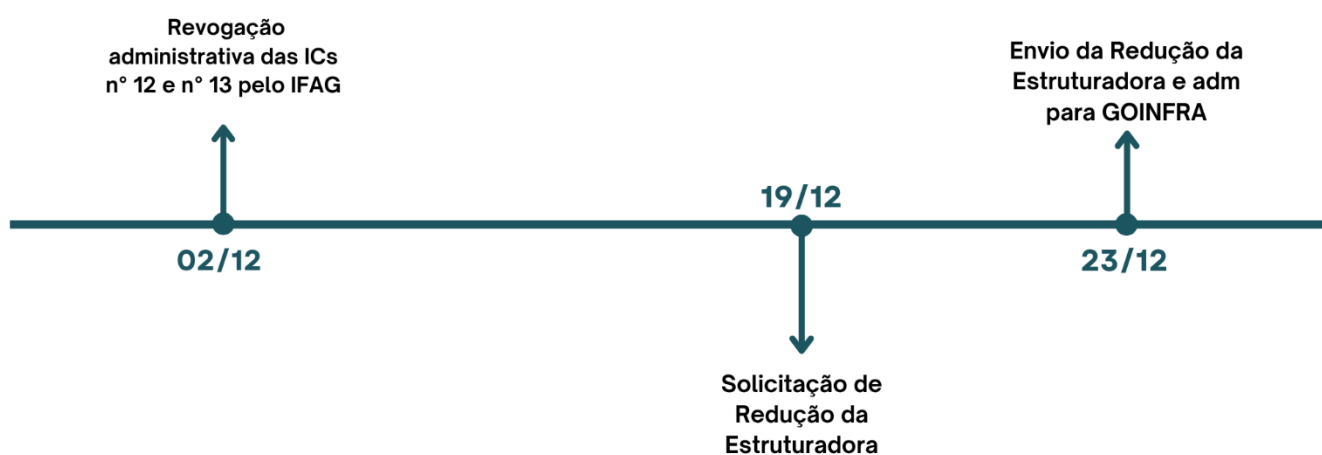




Progresso das atividades executadas [Janeiro/2026]

Timeline



Progresso das atividades executadas [Fevereiro/2026]


Timeline

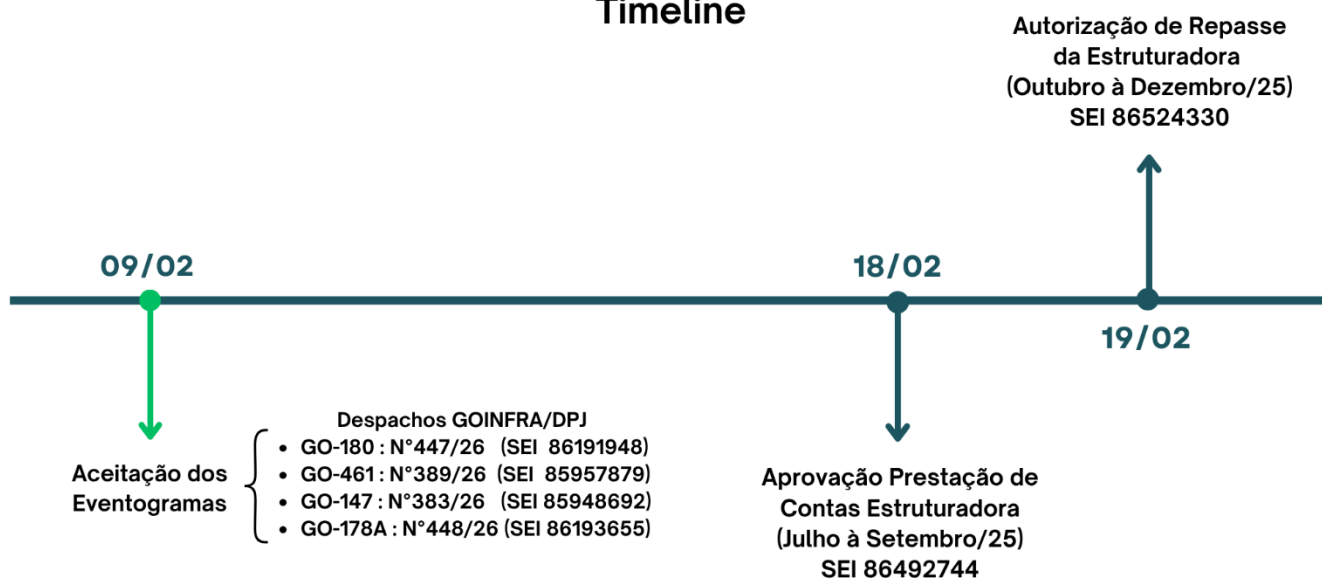




Progresso das atividades executadas [Março/2026]

Timeline

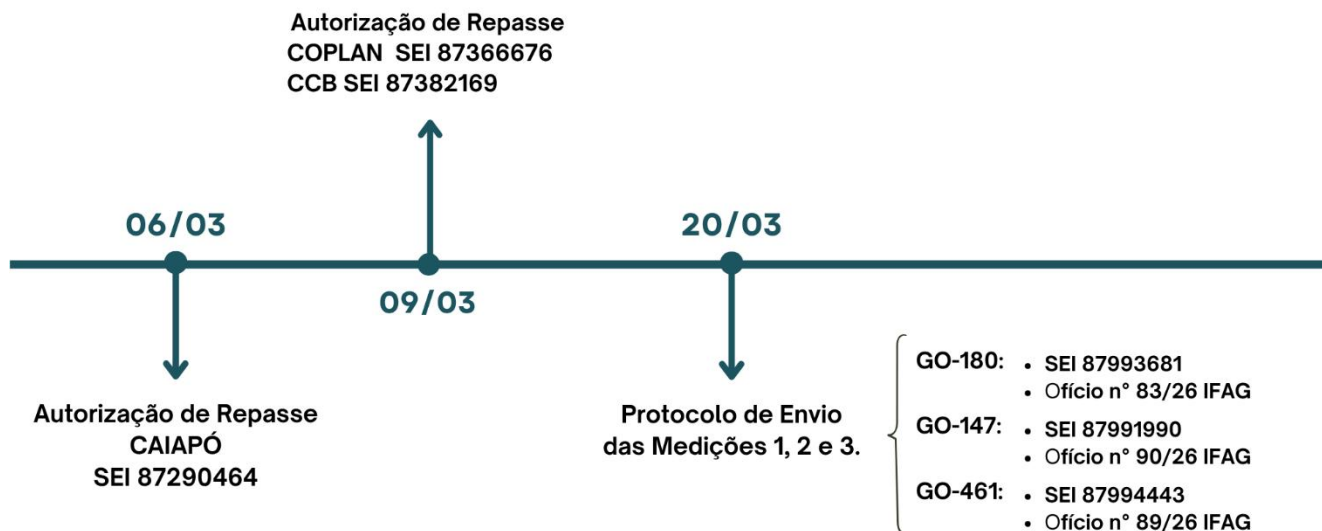

Progresso das atividades executadas [Abril/2026]

Timeline

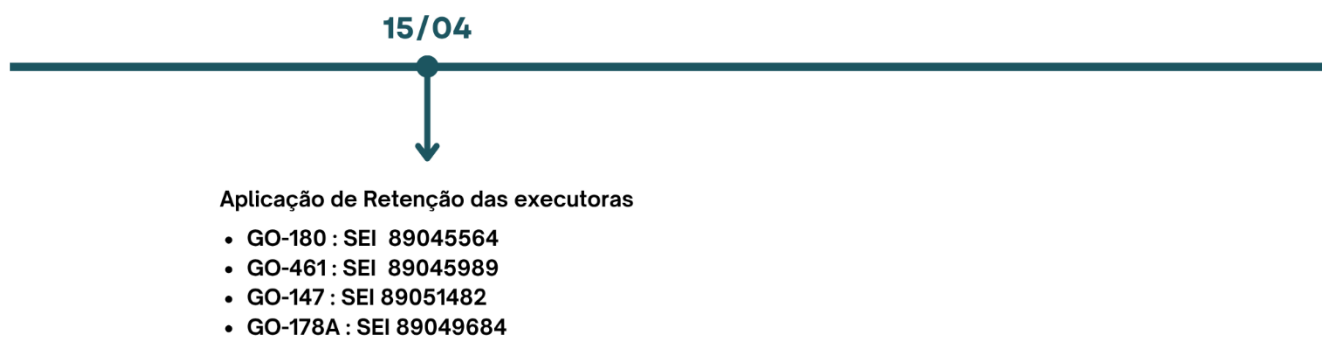

- Reuniões de Governança realizadas durante o mês de abril.

Durante o mês de abril, as reuniões de governança do Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP) mantiveram foco no acompanhamento da execução contratual, no controle técnico das obras e na gestão dos riscos operacionais e financeiros associados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA. A Coordenação Executiva seguiu atuando como instância integradora entre IFAG, GOINFRA, empresas estruturadoras, certificadoras e assessoramento jurídico, assegurando alinhamento institucional, rastreabilidade das deliberações e fortalecimento dos mecanismos de governança do programa.

As agendas iniciais do mês concentraram-se na análise de temas estratégicos relacionados à prestação de contas, empenho de recursos, impactos operacionais junto à GOINFRA e tratativas referentes ao aditivo contratual do CAEP. Também foram discutidos alinhamentos institucionais com IFAG, aspectos relacionados às entregas dos produtos contratados e medidas voltadas à manutenção da regularidade administrativa e financeira do programa.

No âmbito técnico-operacional, as reuniões com Dynatest e Bureau Veritas aprofundaram a análise de não conformidades identificadas em projetos geotécnicos e na documentação técnica associada às obras, especialmente nos empreendimentos vinculados à CCL, CCB e Coplan. Foram avaliados impactos decorrentes de inconsistências em sondagens geotécnicas, riscos de certificação e possíveis repercussões contratuais relacionadas à necessidade de revisão de estudos, alterações de projeto e reequilíbrio econômico-financeiro das obras.

As reuniões também abordaram atrasos na entrega de disciplinas técnicas, pendências documentais e limitações operacionais que impactam diretamente os processos de certificação e aprovação das medições. Nesse contexto, foram discutidas medidas de mitigação, incluindo intensificação das notificações formais às executoras, revisão de fluxos de fiscalização e necessidade de reforço nos controles de rastreabilidade técnica e documental das obras.

As agendas com a Alvarez & Marsal concentraram-se na atualização dos painéis BI, no acompanhamento dos riscos e na consolidação dos processos de prestação de contas e medições. Foram discutidos ajustes metodológicos para utilização de prestações de contas em formato proforma até aprovação definitiva das medições, bem como integração de informações financeiras e operacionais às ferramentas de acompanhamento e gestão de riscos, incluindo a plataforma IRIS.

Em paralelo, reuniões com a Manesco trataram do alinhamento institucional relacionado às tratativas com a GOINFRA e com o Ministério Público, especialmente em temas ligados à transparência, prestação de contas e segurança jurídica do programa IFAG-Manesco. Também foram debatidos aspectos relacionados às mesas técnicas junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), incluindo certificação, amostragem, supervisão e revisão de cláusulas e exigências previstas no TAG.

O mês foi encerrado com discussões voltadas à reprogramação de eventos, revisão de fluxos operacionais e definição de estratégias de negociação junto às executoras e contratadas, além da análise de questões relacionadas a certificação, respostas a ofícios, faturamento e repasses financeiros. Em síntese, abril foi marcado pelo aprofundamento dos controles técnicos e contratuais, pela intensificação das tratativas institucionais e pelo fortalecimento das ações de governança voltadas à mitigação de riscos e à continuidade operacional do programa FUNDEINFRA.

CAEP | Controle de Reuniões




Data	Participantes	Assuntos
02/04/2026	Representantes CAEP - Dynatest, Bureau Veritas, Alvarez & Marsal e Manesco	Reunião de Governança CAEP - pauta: Agenda com o governador e representação jurídica; Impacto operacional e relações com a GOINFRA; Prestação de contas e empenho de recursos; Discussão sobre o aditivo CAEP; Entregas, produtos e reuniões com IFAG.
10/04/2026	Dynatest: Victor Castro, Josiley Prado, CAEP: Alex Pineli IFAG: Sérgio Borges e Eliseu Garcia	Reunião de Governança IFAG e Dynatest - resumo ata: A reunião teve como objetivo revisar o status das equipes de campo, a paralisação parcial das obras da CCL e os impactos técnicos e contratuais decorrentes de não conformidades no projeto geotécnico e na documentação associada. Inicialmente foi detalhada a paralisação de serviços na CCL motivada por uma nota técnica que apontou inconsistências, com execução limitada apenas à trafegabilidade e manutenção de acessos enquanto as pendências não forem resolvidas. O grupo identificou um problema crítico de rastreabilidade das fotos das sondagens geotécnicas, constatando discrepância entre o número de furos e as fotos apresentadas, e decidiu que as sondagens deverão ser refeitas para evitar aprovações parciais que impactem demais disciplinas dependentes. Foi estimado que a repetição dos ensaios demandará cerca de 20 dias. Foram discutidos riscos contratuais relacionados ao critério dos 10% no TAG e possíveis variações de custo por alterações de drenagem e pavimentação, além da necessidade de estudos de capacidade da pedra Rio Claro e de elaboração de advertências e planos de ação para resguardar o IFAG diante de pedidos de reequilíbrio contratuais pela CCL. Também se deliberou sobre notificações formais a executoras em atraso e sobre a necessidade de advertência direta à Caiapó e outras empresas que descumprem cláusulas contratuais. Finalmente, a equipe avaliou riscos de atraso na entrega do geotécnico da Caiapó, necessidade de repactuação de prazos com Engesur/Coplan e a possível alteração de traçado da CCB com impacto em licenciamento e pleitos de reequilíbrio por variação de custos como diesel.
10/04/2026	Bureau Veritas: Vinicius Coutinho, Ciro Sampaio e Luis Quatorze CAEP: Alex Pineli IFAG: Sérgio Borges	Reunião de Governança IFAG e Dynatest - resumo ata: A apresentação incluiu o andamento das tratativas com a Goinfra sobre prestações de contas, a preocupação com exigências do diário de obra e a expectativa de envio de documento para resposta rápida, com intenção de avaliar o checklist quando for recebido para decidir retroações necessárias. A reunião aprofundou atrasos e pendências do projeto geotécnico que bloqueiam várias disciplinas de certificação, especialmente nos empreendimentos Coplan, CCB e CCL, e houve concordância em evitar aprovações finais enquanto houver risco de alterações geotécnicas significativas. Foi destacado que engenheiros de campo têm atuado como projetistas em algumas obras, reduzindo velocidade e qualidade das respostas técnicas, e recomendou-se notificação forma.
10/04/2026	A&M: Walter Schneider e Igor Ferreira CAEP: Alex Pineli IFAG: Joberth Bernazzoli e Eliseu Garcia	Reunião de Governança IFAG e A&M - resumo ata: A reunião teve como objetivo revisar os avanços dos produtos previstos em contrato, atualizar o painel de BI e tratar do acompanhamento de riscos e das medições para prestação de Contas. O time apresentou o painel de BI: a regra atual é reportar apenas itens concluídos sem ponderação, foi publicada a visualização referente a março e ficou previsto incluir as duas primeiras semanas de abril na semana seguinte; também foi informado que não houve atualização nos acompanhamentos financeiros durante a semana. O grupo discutiu o produto 4.2 e acordou utilizar prestações de contas trimestrais e mensais em formato proforma até a aprovação formal das medições, ressaltando a necessidade de retroagir essas informações aos relatórios quando as medições forem aprovadas e alinhar esse procedimento com Sérgio. Foram relatadas reuniões mensais com empreiteiras para gestão de riscos, pendências de importação de riscos das obras 461 e 180 para a ferramenta IRIS e a inclusão planejada da frequência de atualização nas páginas do BI.
10/04/2026	IFAG: Sérgio Fonseca e Bruna Mendes Manesco: Marcos Perez, Gabriel Schroeder, Antônio Gonçalves CAEP: Alex Pineli	Reunião de Governança IFAG e Manesco: O encontro teve como objetivo alinhar ações decorrentes das tratativas com a Secretaria de Infraestrutura (Goinfra) e com o Ministério Público sobre a transparência e prestação de contas do programa IFAG-Manesco
23/04/2026	Representantes CAEP - Dynatest, Bureau Veritas, Alvarez & Marsal e Manesco	Reunião de Governança CAEP - pauta: Contexto das mesas técnicas com o TCE; Esclarecimentos sobre ensaios e certificação; Operacionalização do acompanhamento e amostragem; Supervisão; Reprogramação de eventos e exigência trimestral da Goinfra; Revisão do TAG e encaminhamentos para mesas técnicas;
30/04/2026	Representantes CAEP - Dynatest, Bureau Veritas, Alvarez & Marsal e Manesco	Reunião de Governança CAEP - pauta: Fluxos, metodologia e prazo da Parceria; Problemas operacionais - bueiros e certificação; Estratégia de negociação com o contratado e proposta operacional; Respostas a ofícios da CCB; Situação do pagamento, repasse e faturamento.

- Análise do processo de medição do mês anterior - abril/2026 - 9ª medição

A medição foi estruturada sob a lógica formal de avaliação por produto, com base em critérios previamente definidos pela fiscalização, os quais consideram, de forma ponderada, a qualidade do atendimento e da equipe técnica, a qualidade da documentação e dos relatórios, bem como a conformidade com os prazos, convertendo o resultado avaliativo em parâmetro de pagamento dos serviços efetivamente comprovados. Tal sistemática reforça a robustez do processo de medição, assegura transparência, uniformidade de critérios e maior segurança institucional quanto à regularidade da despesa.

QUADRO FINANCEIRO CONSOLIDADO — 8ª MEDIÇÃO		
Contrato n.º 01/2025 Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos – CAEP		
Data de Assinatura do Contrato: 10/07/2025	Vigência: 36 meses	Referência: 8ª Medição – Fevereiro/2026

Valor Inicial do Contrato	Valor Atual do Contrato	Valor Acumulado Medido	Valor da 8ª Medição	% Acumulado Executado	Saldo Contratual
R\$ 36.179.265,65	R\$ 21.912.482,34	R\$ 6.851.013,84	R\$ 538.089,55	31,27%	R\$ 15.061.468,50

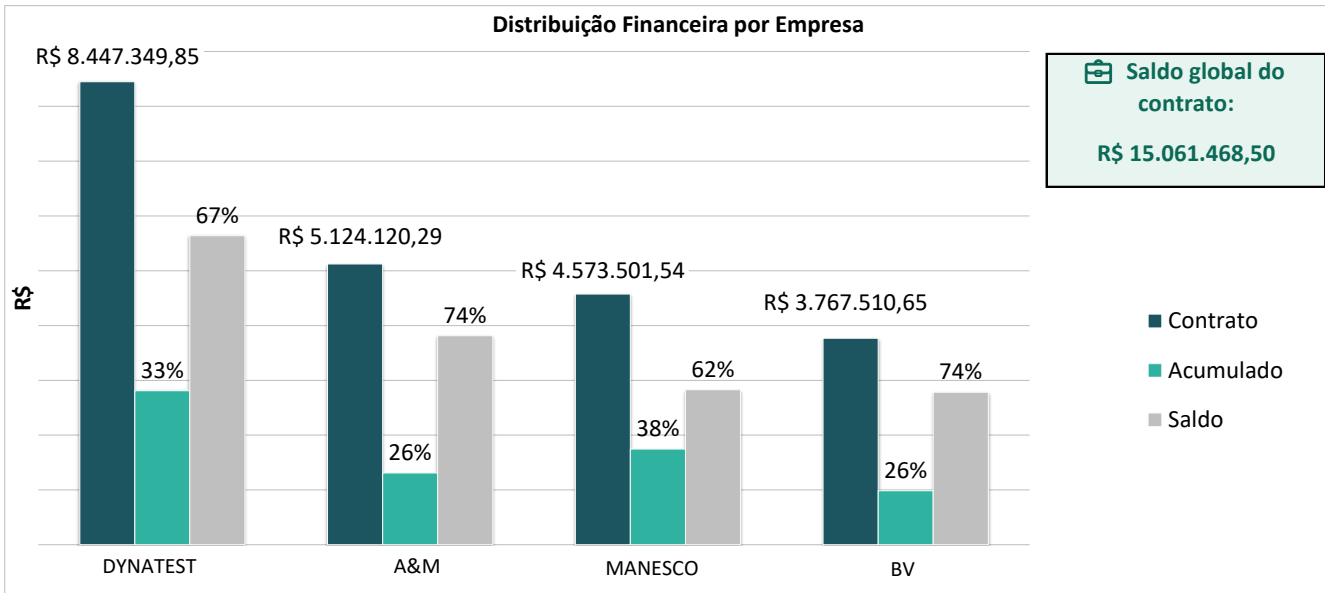

⚠ OBSERVAÇÃO SOBRE ADITIVO CONTRATUAL
Os valores apresentados a partir da 7ª medição consideram a readequação dos preços e quantitativos proposto na minuta do termo aditivo contratual.

RESUMO FINANCEIRO POR EMPRESA — 8ª MEDIÇÃO						
Empresa	Valor Mês	Valor Acumulado	Valor Contrato	% Executado	Saldo	Status
DYNA	R\$ 221.476,39	R\$ 2.810.260,74	R\$ 8.447.349,85	33,27%	R\$ 5.637.089,11	Pago
A&M	R\$ 112.199,28	R\$ 1.310.648,48	R\$ 5.124.120,29	25,58%	R\$ 3.813.471,81	Pago
MANESCO	R\$ 83.147,47	R\$ 1.745.355,15	R\$ 4.573.501,54	38,16%	R\$ 2.828.146,39	Pago
BV	R\$ 121.266,41	R\$ 984.749,47	R\$ 3.767.510,65	26,14%	R\$ 2.782.761,18	Pago
TOTAL	R\$ 538.089,55	R\$ 6.851.013,84	R\$ 21.912.482,34	31,27%	R\$ 15.061.468,50	

Sob a perspectiva físico-financeira, a 9ª medição totaliza **R\$ 604.720,77**, elevando o montante acumulado medido para **R\$ 7.455.734,61**, frente ao valor global contratual de **R\$ 21.912.482,34**, o que corresponde a **34,03%** de execução acumulada do contrato. O quadro financeiro demonstra, ainda, que a medição em referência permanece vinculada à readequação econômica decorrente da proposta de supressão relacionada ao termo aditivo em discussão, conforme registrado na própria planilha de medição, a qual consigna que os valores previstos para a competência foram estimados com base na proposta comercial de supressão, permanecendo necessária a aprovação e validação pela GOINFRA para formalização do aditivo e subsequente desembolso financeiro.

RESUMO FINANCEIRO POR EMPRESA — 9ª MEDIÇÃO				
Contrato n.º 01/2025 CAEP Referência: Abril/2026				
Empresa	Valor Mês	Valor Acumulado	% Executado	Saldo Contratual
DYNA	R\$ 221.476,39	R\$ 3.031.737,12	35,89%	R\$ 5.415.612,73
A&M	R\$ 112.199,28	R\$ 1.422.847,77	27,77%	R\$ 3.701.272,53
MANESCO	R\$ 149.778,69	R\$ 1.895.133,84	41,44%	R\$ 2.678.367,70
BV	R\$ 121.266,41	R\$ 1.106.015,88	29,36%	R\$ 2.661.494,77
TOTAL	R\$ 604.720,77	R\$ 7.455.734,61	34,03%	R\$ 14.456.747,73

No que se refere ao desempenho técnico das entregas reconhecidas na competência, verifica-se que os produtos efetivamente medidos foram recebidos com **avaliação integral para fins de pagamento**, não havendo, no conjunto dos itens faturados na 9ª medição, ocorrência de redutor financeiro aplicado por insuficiência técnica da entrega. Os produtos medidos no período foram expressamente registrados com **nota avaliativa de 100,00%**, a exemplo dos Produtos 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.3 e 5.4, evidenciando aderência ao escopo contratual, suficiência documental e regularidade para reconhecimento financeiro na competência. Do ponto de vista financeiro e de governança da medição, o conjunto dos itens reconhecidos demonstra conformidade satisfatória, sem indicativo de glosa técnica ou de necessidade de adoção de redutor sobre os valores medidos no período.

BASE TÉCNICA — PLANILHA DE MEDIÇÃO IFAG (9ª MEDIÇÃO)										
ID	Produto	Unidade	Valor Unit.	Valor Contrato	% Acum.	Quant Med.	Valor Final	Valor Mês	Valor Acum.	Empresa
1.1	COORDENAÇÃO GERAL	MENSAL	R\$ 59.212,49	R\$ 2.095.854,28	30,86%	1,00	R\$ 59.212,49	R\$ 59.212,49	R\$ 615.542,06	DYNA
1.2	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	MENSAL	R\$ 8.503,60	R\$ 615.391,05	69,83%	1,00	R\$ 8.503,60	R\$ 8.503,60	R\$ 402.801,05	DYNA
1.3	COMUNICAÇÃO SOCIAL	MENSAL	R\$ 28.778,99	R\$ 180.720,54	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.720,54	A&M
1.4	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	MENSAL	R\$ 23.940,25	R\$ 872.086,22	33,02%	1,00	R\$ 23.940,25	R\$ 23.940,25	R\$ 273.579,97	A&M
2.1	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	MENSAL	R\$ 58.407,02	R\$ 2.001.747,91	28,36%	1,00	R\$ 58.407,02	R\$ 58.407,02	R\$ 541.572,49	DYNA
2.2	ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	POR OBRA	R\$ 116.110,78	R\$ 851.091,98	36,15%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307.693,53	DYNA
2.3	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LIC	POR OBRA		R\$ 109.380,60	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.380,60	DYNA
2.4	GERENCIAMENTO TÉCNICO	OBRA x MÊS	R\$ 23.838,32	R\$ 2.288.478,72	28,06%	4,00	R\$ 95.353,28	R\$ 95.353,28	R\$ 606.723,39	DYNA
2.5	RECEBIMENTO DE OBRA	POR OBRA	R\$ 9.345,33	R\$ 37.381,32	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	DYNA
2.6	LICENÇA AMBIENTAL	POR OBRA		R\$ 448.023,99	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448.023,99	DYNA
3.1	RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	MENSAL	R\$ 47.233,29	R\$ 1.775.628,33	35,32%	1,00	R\$ 47.233,29	R\$ 47.233,29	R\$ 594.795,96	BV
3.2	PLANOS DE INSPEÇÃO	POR OBRA		R\$ 159.562,60	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.562,60	BV
3.3	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	OBRA x MÊS	R\$ 18.508,28	R\$ 1.832.319,72	19,81%	4,00	R\$ 74.033,12	R\$ 74.033,12	R\$ 351.657,32	BV
4.1	REPORTE DO PORTFÓLIO	MENSAL	R\$ 73.357,00	R\$ 2.630.004,74	31,83%	1,00	R\$ 73.357,00	R\$ 73.357,00	R\$ 796.079,74	A&M
4.2	CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	OBRA x MÊS	R\$ 9.418,33	R\$ 866.486,36	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	A&M
4.3	GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	MENSAL	R\$ 14.902,03	R\$ 574.822,43	31,49%	1,00	R\$ 14.902,03	R\$ 14.902,03	R\$ 172.467,51	A&M
5.1	ASSESSORIA JURÍDICA CONTÍNUA	MENSAL	R\$ 30.672,92	R\$ 1.141.600,88	34,60%	1,00	R\$ 30.672,92	R\$ 30.672,92	R\$ 374.777,88	MANESCO
5.2	ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	POR OBRA		R\$ 557.270,70	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 557.270,70	MANESCO
5.3	RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	MENSAL	R\$ 52.474,55	R\$ 1.953.025,63	34,60%	1,00	R\$ 52.474,55	R\$ 52.474,55	R\$ 641.161,88	MANESCO
5.4	CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	MENSAL	R\$ 66.631,22	R\$ 921.604,33	37,70%	1,00	R\$ 66.631,22	R\$ 66.631,22	R\$ 321.923,38	MANESCO

Nesse sentido, registra-se que, no universo dos produtos avaliados na 9ª medição, tendo em vista as notas de avaliação obtidas, **não houve necessidade de apresentação de plano de ação corretivo**. Tal conclusão decorre do fato de que todos os produtos efetivamente avaliados na competência foram reconhecidos com desempenho integral para fins de medição, preservando-se, assim, a regularidade do fluxo contratual e a continuidade da execução nos ciclos subsequentes.

Por fim, apresenta-se o acompanhamento financeiro das medições do CAEP até o mês anterior:

LINHA DO TEMPO DE MEDIÇÕES — STATUS FINANCEIRO										
Contrato n.º 01/2025 CAEP Medições 1 a 9										
● Pago ● Processado ● Em análise										
Empresa	MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO 2	MEDIÇÃO 3	MEDIÇÃO 4	MEDIÇÃO 5	MEDIÇÃO 6	MEDIÇÃO 7	MEDIÇÃO 8	MEDIÇÃO 9	
Empresa	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	
DYNA	R\$ 312.192,07	R\$ 389.743,01	R\$ 739.212,32	R\$ 270.833,58	R\$ 373.090,29	R\$ 319.147,94	R\$ 184.565,14	R\$ 221.476,39	R\$ 221.476,39	
A&M	R\$ 133.535,85	R\$ 200.293,76	R\$ 200.293,76	R\$ 122.760,04	R\$ 200.293,75	R\$ 200.293,76	R\$ 140.978,27	R\$ 112.199,28	R\$ 112.199,28	
MANESCO	R\$ 274.536,70	R\$ 285.876,79	R\$ 406.518,01	R\$ 114.510,63	R\$ 224.791,05	R\$ 272.827,03	R\$ 83.147,47	R\$ 83.147,47	R\$ 149.778,69	
BV	R\$ 58.320,94	R\$ 127.367,69	R\$ 118.619,99	R\$ 93.505,33	R\$ 182.892,53	R\$ 161.510,16	R\$ 121.266,41	R\$ 121.266,41	R\$ 121.266,41	
TOTAL	R\$ 778.585,56	R\$ 1.003.281,25	R\$ 1.464.644,08	R\$ 601.609,58	R\$ 981.067,62	R\$ 953.778,89	R\$ 529.957,29	R\$ 538.089,55	R\$ 604.720,77	

2.2 Produto 1.2 – Relatório de Relações Institucionais

2.2.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.2, referente ao Relatório de Relações Institucionais, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório detalhado que descreve atividades realizadas no período em atendimento às diversas interrelações institucionais necessárias à boa execução do portfólio. Deverá contemplar no mínimo:

- *Relatório de Relacionamento Institucional: relatório que descreve a interação entre as diversas áreas do projeto, garantindo que o trabalho de cada setor (engenharia, certificação, contabilidade e jurídico) esteja alinhado e coordenado. Este relatório monitorará a integração dos processos e identificará oportunidades de integração entre as atividades.”*

2.2.2 Produtos desenvolvidos no período

- Integração Institucional e Consolidação de Processos executados em abril.

Durante o mês de abril, o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP) manteve agenda contínua de reuniões técnicas e de alinhamento operacional voltadas ao acompanhamento da execução das obras, à análise de medições e projetos, e à coordenação entre as equipes técnicas responsáveis pelo monitoramento dos empreendimentos vinculados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA. As agendas envolveram representantes do próprio CAEP, das equipes técnicas da Dynatest, da Alvarez & Marsal, da Bureau Veritas, do Instituto para Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (IFAG) e da assessoria jurídica da Manesco.

As reuniões de alinhamento com a equipe da Dynatest concentraram-se na atualização do status dos projetos e obras, incluindo pendências em disciplinas técnicas como geotecnia, drenagem e topografia, além da avaliação de impactos dessas restrições nos processos de medição e certificação. Também foram discutidas limitações operacionais em campo, necessidade de retrabalhos, controle de variações contratuais dentro dos limites previstos e reforço na rastreabilidade documental das atividades executadas, especialmente em relação às evidências geotécnicas e às não conformidades recorrentes identificadas nas frentes de obra.

No âmbito institucional e jurídico, reuniões com IFAG e Manesco abordaram riscos operacionais e contratuais relacionados à paralisação parcial de obras da CCL, análise de notificações e advertências às executoras, além da definição de estratégias de resposta técnica e documental para resguardar o programa diante de possíveis pleitos futuros. Também foram discutidos mecanismos de comprovação documental, histórico de cronogramas e metodologias de avaliação ESG aplicadas às executoras, com foco na estruturação de indicadores ambientais, sociais e de governança.

As agendas com a Alvarez & Marsal concentraram-se no alinhamento das prestações de contas trimestrais, na unificação de relatórios e na revisão dos critérios de medição física e financeira das obras. Foram discutidos aspectos relacionados à governança das medições, interpretação de índices de execução e adequação dos fluxos de acompanhamento às exigências de controle da GOINFRA, bem como controvérsias envolvendo a supressão e eventual reinstalação do Produto 1.3 no contrato do IFAG.

Em paralelo, reuniões integradas entre CAEP, Manesco, Dynatest, Bureau Veritas e A&M trataram de atrasos em pagamentos, riscos associados à paralisação de repasses financeiros e necessidade de alinhamento dos fluxos operacionais e das responsabilidades entre os agentes envolvidos. Também foram discutidas adequações de medições ao eventograma, impactos das não conformidades acumuladas e critérios para tomada de decisão quanto à continuidade das liberações financeiras.

Em síntese, abril foi marcado pelo aprofundamento das discussões técnicas e contratuais relacionadas à certificação, medição e regularidade documental das obras, bem como pelo fortalecimento da articulação institucional entre as equipes técnicas, jurídicas e de governança do programa.

Destaca-se, adicionalmente, que, embora tenha sido apontada, no âmbito da análise da 2ª prestação de contas, a necessidade de inclusão das atas completas das reuniões realizadas, optou-se, neste produto, pela apresentação consolidada das informações em formato de síntese técnica. Tal diretriz decorre da necessidade de assegurar maior confiabilidade dos temas tratados, compatibilização entre os diversos stakeholders envolvidos e padronização das informações apresentadas. A apresentação estruturada em planilha, contendo datas, participantes e assuntos, permite adequada rastreabilidade das atividades executadas, bem como melhor visualização da evolução temporal das ações, garantindo transparência, objetividade e aderência às diretrizes de governança do programa.

Data	Participantes	Assuntos
10/04/2026	IFAG: Sérgio Fonseca, Eliseu Garcia e Bruna Mendes Manesco: Gabriel Schroeder, Antônio Gonçalves CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento IFAG e Manesco - Advertência CCL: O encontro teve por objetivo alinhar a resposta técnica e jurídica do IFAG e do Manesco ao posicionamento da CCL sobre paralisação e certificação do projeto. Inicialmente foram expostas preocupações de que a carta da CCL extrapola a nota técnica e pode embasar pleitos futuros, especialmente diante da mobilização de equipamentos no canteiro e da alegação de paralisação não determinada; por isso propôs-se construir uma resposta cronológica e técnica sobre responsabilidades e atrasos. Em seguida analisaram-se riscos operacionais e contratuais, ressaltando que atrasos na entrega de projetos pela CCL influenciam prazos e certificação e que a paralisação deve ser dissociada do contrato como um todo. Foram definidos itens de prova a coletar (inventário de mobilização, histórico de cronogramas, gravação documental) e ações concretas como emissão de advertências a empreiteiras e solicitação formal de cronogramas e identificação de projetistas por disciplina. Também foi apresentada a metodologia ESG aplicada às executoras, com formulário transformado em indicadores ambientais, sociais e de governança, escala de 0 a 4, pesos por natureza (legal, contratual, boa prática) e conversão em percentual e faixas de maturidade.
13/04/2026	A&M: Walter Schneider e Igor Ferreira CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/A&M - resumo ata: A reunião teve como objetivo alinhar a prestação de contas trimestral e o checklist do consórcio, com foco na unificação de relatórios e na forma de medir a execução física versus financeira.
14/04/2026	Dynatest: Guilherme Soares, Luiz Henrique Costa, Edson Shimizu, José Augusto Meister e Victor Castro, Álvaro Laquis, Emine Lauara, Lara Cristina CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/Dynatest - resumo ata: A reunião teve como objetivo revisar o status dos projetos e da obra da CAEP, com foco em estudos técnicos, medições, não conformidades e impactos contratuais. Foi organizada a troca de presença, links e arquivos entre participantes no início da sessão. Em sequência, foram apresentados avanços nos estudos, com entregas parciais dos projetos geométrico e de drenagem e pendência do relatório geotécnico com entrega prevista até quinta-feira, o que impede aceitação de terraplanagem e pavimentação enquanto os ensaios não forem refeitos com fotos e rastreabilidade GPS. A equipe discutiu operação em campo limitada à conservação, pendências de medições sob responsabilidade da Goinfra e a retomada da rotina interna de envio de não conformidades às sextas-feiras para encerrar itens acumulados e atualizar o BI quando necessário. Foi detalhado o controle de variações contratuais dentro do limite de 10% e os riscos de drenagem e geotecnia que podem exceder esse limite, incluindo divergências sobre responsáveis pelas revisões de projeto e necessidade de atualizar programações disciplinares conforme aprovações. Por fim, foram revisadas entregas e notificações por trecho, pendências documentais e de topografia, retrabalhos em campo, problemas de solo expansivo, encaminhamentos para pareceres e minutas de liberação de medições, e a não conformidade recorrente na execução de cercas com impacto financeiro em boletins de medição.
20/04/2026	A&M: Walter Schneider e Igor Ferreira CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/A&M - resumo ata: A reunião tratou da controvérsia sobre a supressão e eventual reinstalação do produto de comunicação identificado como 1.3 no contrato do IFAG, examinando o contexto trazido pela Goinfra, a posição de Armando e o ponto de vista da nova gestora Alessandra.
23/04/2026	A&M: Walter Schneider , Gabrielle Rocha e Igor Ferreira Dynatest: Victor Castro CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/A&M - resumo ata: A reunião teve como objetivo revisar a governança das prestações de contas e o processamento das medições no programa, com foco na interpretação do índice 80/100 e na nova forma de planejar o executado em função do realizado, sob acompanhamento trimestral pela GOINFRA.
27/04/2026	A&M: Walter Schneider e Igor Ferreira BV: Vinicius Coutinho CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/A&M/Certificação - pauta: Atrasos, riscos e responsabilidade por paralisações de pagamento no modelo de execução adotado.
28/04/2026	Manesco: Gabriel Schroeder e Lucas Pinto Dynatest: Edson Shimizu CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/Manesco/Dynatest - pauta: A reunião teve como objetivo alinhar fluxos, responsabilidades e pendências da parceria GOINFRA-IFAG.
29/04/2026	Manesco: Gabriel Schroeder e Daniel Esteves CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/Manesco - pauta: A reunião teve como objetivo tratar medições das executoras, adequação ao eventograma e decisões de pagamento diante de não conformidades e atrasos acumulados.

2.3 Produto 1.3 – Relatório de Comunicação Integrada

2.3.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.3, referente ao Relatório de Comunicação Integrada, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório com o objetivo de garantir que as informações sobre o andamento dos projetos e obras de infraestrutura sejam comunicadas de forma transparente e acessível às partes interessadas, incluindo as comunidades locais, órgãos governamentais, parceiros privados e o público em geral. Deverá contemplar no mínimo:

- *Este relatório abordará estratégias e atividades desenvolvidas, em andamento e planejadas, que tem como objetivo transparência do relacionamento proativo, minimizando o impacto da elaboração de projeto e execução da obra e assegurar a adesão das comunidades aos projetos de infraestrutura.”*

2.3.1.1 Suspensão dos Serviços de Comunicação Integrada

Em virtude da supressão do Produto 1.3 (Comunicação Social) no âmbito do Contrato nº 01/2025 (CAEP–IFAG), devidamente formalizada mediante aditivo contratual, os serviços vinculados a este item foram encerrados de forma regular e definitiva. O IFAG adotou as medidas cabíveis para garantir a regularidade do processo, preservando o erário e assegurando a conformidade contratual. O e-mail de registro do tema, segue abaixo para fins de comprovação.

De: Engenharia Infra <engenharia_infra@ifag.org.br>
Data: 5 de fevereiro de 2025 às 15:17:14 BRT
Para: Gabriel Schneider de Almeida <gschneider@manesco.com.br>, Alex Pineli <alex.pineli@dynatest.com.br>, Sérgio Borges Fonseca Junior <sergio.junior@ifag.org.br>, Pedro Salomão Rodrigues de Abreu <pedro.abreu@ifag.org.br>
Assunto: Re: Supressão Contratual [QED-MRPAM.FID1537640]

Boa Tarde Gabriel / Alex,

Em observância ao Parecer encaminhado pela Empresa Manesco Advogados que versa sobre o aditivo de supressão dos serviços do CAEP, mais especificamente sobre o produto 1.3, informamos que:

1 – Para contextualização e maior segurança jurídica, solicitamos que seja incorporado ao Parecer, jurisprudências que anuem a referida supressão de um produto de forma integral do escopo do contrato, ou seja, Acórdãos, Decisões Transitadas em Julgado, Pareceres Normativos, que tratem o assunto e embasem tecnicamente esta decisão;

2 – Inserir no escopo da documentação, memória de cálculo apresentada pela empresa Alvarez e Marçal, demonstrando a inviabilidade do produto com a redução de 7 obras para 3 obras. Nesse demonstrativo é essencial fazer um comparativo de valores entre a atual estrutura para a entrega do produto e a estrutura necessária para atender a redução de obras, aplicando a redução de 47,60%.

3 – Conforme sugerido no Parecer, o IFAG já realizou cobranças à GOINFRA, através de ofício, para dar celeridade nas respostas, no que concerne à redução proposta, porém ainda não obtivemos retorno, dando aquiescência para alteração da redução, conforme proposta encaminhada pelo CAEP;

4 – Para não gerar insegurança jurídica aos envolvidos e não trazer prejuízos ao Consórcio e visando evitar danos ao erário, o IFAG solicita a suspensão da prestação dos serviços constantes do Produto 1.3 (sine die), até que se obtenha resposta da GOINFRA/SEINFRA acerca da supressão dos serviços sugerida pelo CAEP.

2.4 Produto 1.4 – Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC)

2.4.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.4, referente ao Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC), é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório de todas as atividades de manutenção e desenvolvimento de plataforma integrada de gestão no âmbito do programa de gestão dos produtos, que consolida as atividades prestadas e apuração dos indicadores de apuração e desempenho.”

2.4.1.1 Publicação Rotineira do Painel de Sala de Situação no Site do IFAG

É publicado quinzenalmente, em conformidade com a estratégia do IFAG e CAEP. No entanto, ressalta-se que a edição de 07/04/2026 refere-se exclusivamente à última quinzena de março, não integrando o ciclo de publicações de abril. As publicações de abril correspondem às datas de 22/04/2026 e 30/04/2026.

A cada atualização, o BI é inicialmente publicado em ambiente preliminar para avaliação e aprovação do IFAG. Um e-mail é encaminhado ao IFAG solicitando a aprovação formal e, após a manifestação favorável do órgão — formalizada via e-mail —, o painel é publicado no site do IFAG. Segue abaixo evidências das aprovações do IFAG:



 Adriano Silva de Faria
Para:  Ferreira, Igor
Cc: Eliseu Silva Garcia <eliseu.garcia@ifag.org.br>; +6 outros

Responder Responder a todos Encaminhar

Qui, 23/04/2026 13:41

 Você respondeu em Qui, 23/04/2026 14:35

Exibir conversa

 [EXTERNAL EMAIL]: Use Caution

Prezado, Igor.
Boa tarde.
Após consulta à equipe do IFAG, deliberou-se para a **aprovação** da publicação.
Obrigado.

Em qui., 23 de abr. de 2026 às 09:23, Ferreira, Igor <i.ferreira@alvarezandmarsal.com> escreveu:
Prezados, bom dia!

Em atendimento à solicitação recebida dia 22/04/2026 quanto a temporalidade de publicação das informações de avanço físico (de atualização mensal), inserimos a informação de mês de referência no painel de Resumo Executivo e Relatório Unifilar.

 Adriano Silva de Faria
Para:  Ferreira, Igor
Cc: Eliseu Silva Garcia <eliseu.garcia@ifag.org.br>; +6 outros

Responder Responder a todos Encaminhar

Seg, 04/05/2026 11:39

 Você respondeu em Seg, 04/05/2026 13:02

Exibir conversa

 [EXTERNAL EMAIL]: Use Caution

Prezado, Igor.
Bom dia.
A equipe do IFAG realizou a conferência e está de acordo com a publicação da atualização do painel.
Obrigado.


Em qui., 30 de abr. de 2026 às 13:43, Ferreira, Igor <i.ferreira@alvarezandmarsal.com> escreveu:
Prezados, boa tarde!

Formalizamos através deste e-mail, a publicação do BI, no Drive do IFAG, para uma avaliação e posterior confirmação de que poderemos publicar no site do IFAG.

2.4.1.2 As publicações contemplam as principais rotinas de atualização do Portfólio e do Painel de Acompanhamento Visual, bem como dos painéis de Resumo Executivo e Unifilar. Painel de Avanço Físico e Unifilar


- **Indicador de Avanço Físico da Obra:** Como estruturação de processos, e vinculado ao Produto 4.1 Gestão de Portfólio de Projetos, foram realizadas reuniões com o consórcio (CAEP) para definição dos pesos de ponderação do indicador de avanço físico global de cada obra. Com a aprovação dos eventogramas e a consolidação dessa metodologia, tornou-se possível estruturar um cálculo padronizado e consistente do avanço global por empreendimento.


Como resultado direto desse trabalho, e no âmbito do Produto 1.4, foi disponibilizado o painel de acompanhamento unifilar publicado no BI, atualizado mensalmente, que traduz de forma visual a evolução semanal das obras e a porcentagem de evolução global mensal, conforme representado no painel abaixo.

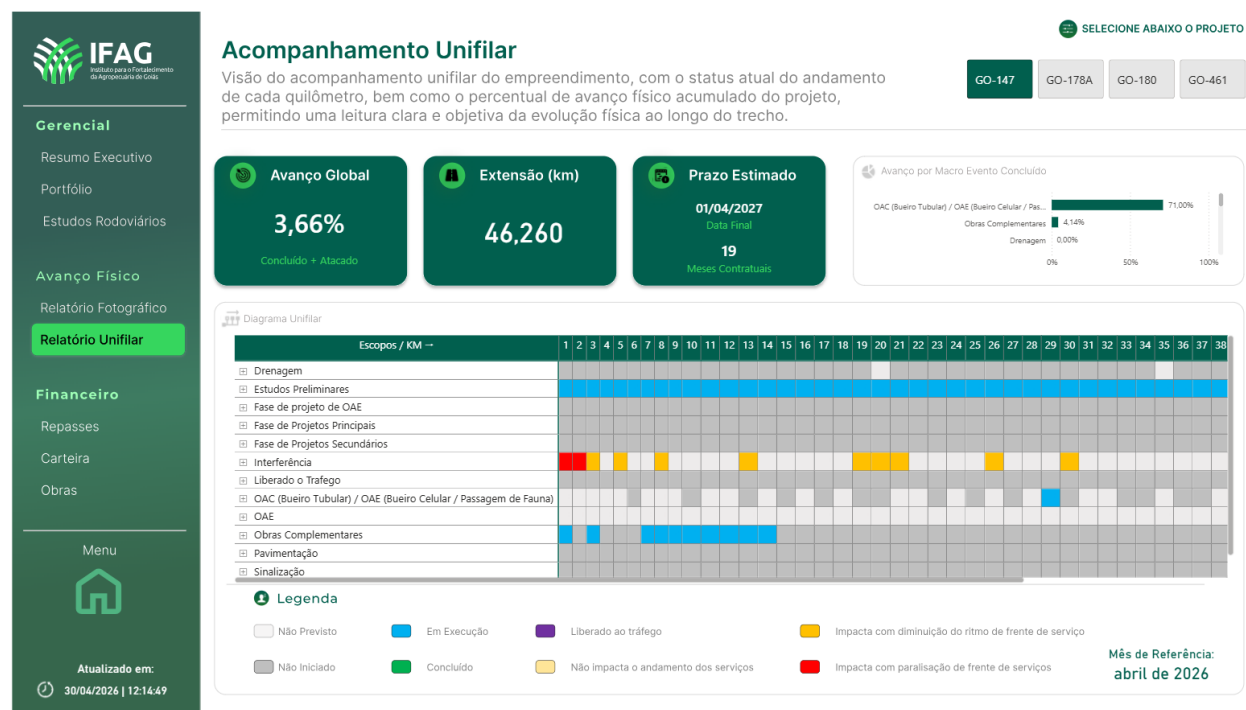

2.4.1.4 Atualização dos Painéis Financeiros

- **Painéis Financeiros:** No período em análise, foram realizadas atualizações nos painéis financeiros com foco na atualização das informações referentes às solicitações de repasses à estruturadora, abrangendo os meses de janeiro, fevereiro e março de 2026. Essas atualizações visam refletir de forma mais fiel a evolução temporal das solicitações de repasse, contribuindo para a manutenção da base de dados atualizada e alinhada aos registros administrativos do período. Ressalta-se que as alterações efetuadas tiveram caráter pontual e informativo, não implicando mudanças na estrutura, metodologia ou critérios de análise dos painéis financeiros, os quais permanecem consistentes com o padrão previamente estabelecido para o acompanhamento gerencial e institucional dos empreendimentos.

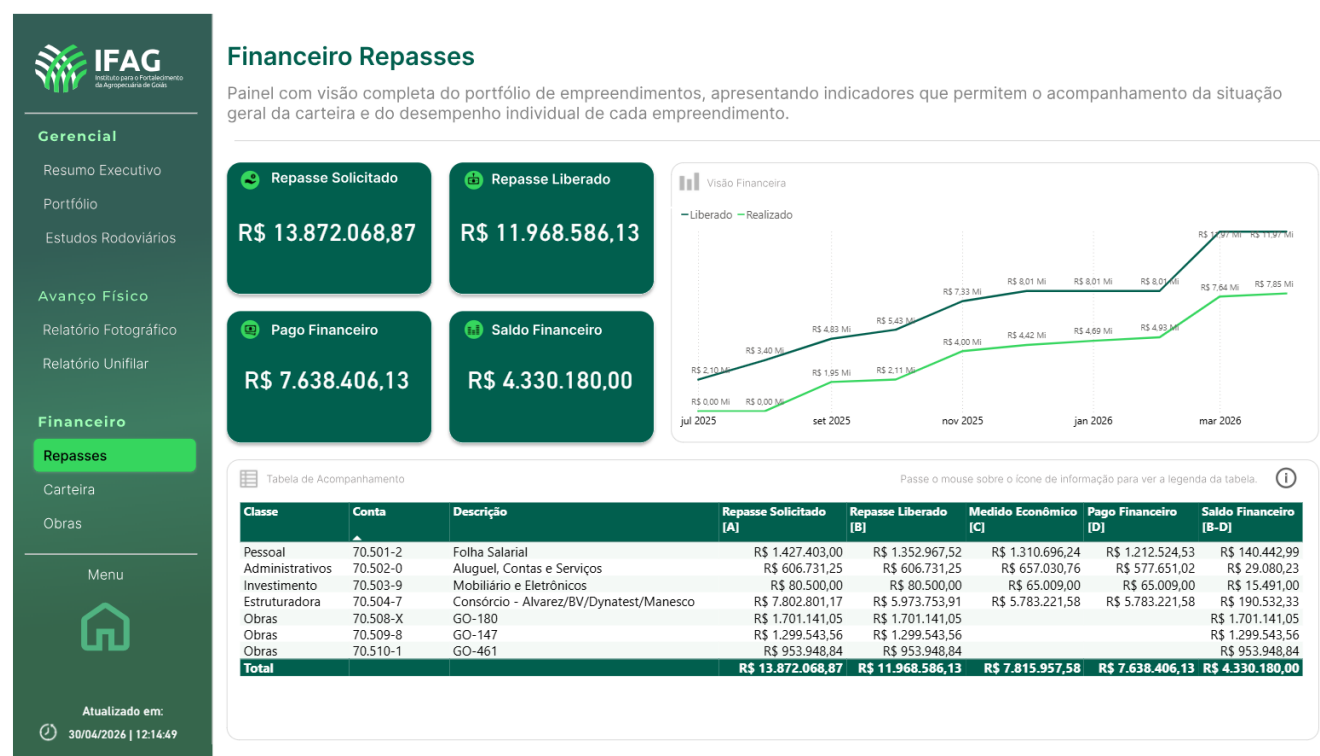

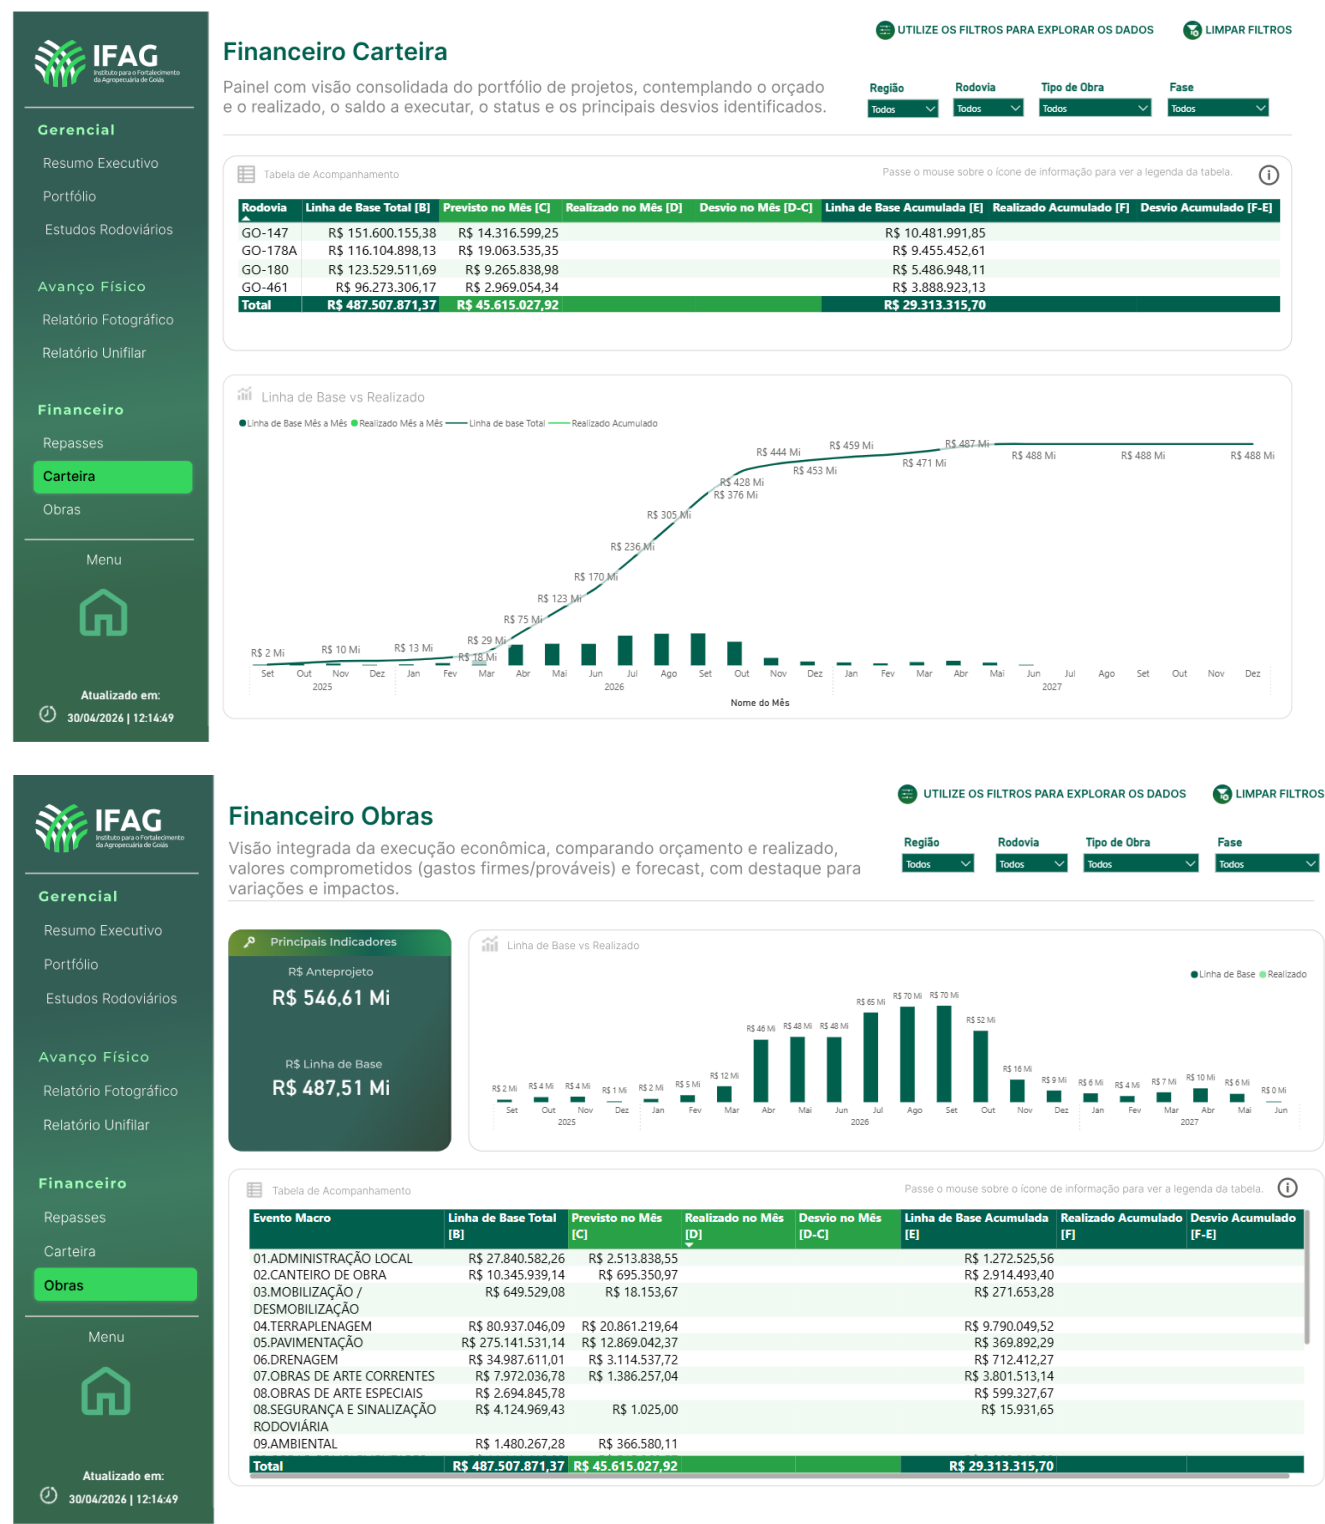



Gerencial

- Resumo Executivo
- Portfólio
- Estudos Rodoviários

Avanço Físico

- Relatório Fotográfico**
- Relatório Unifilar

Financeiro

- Repasse
- Carteira
- Obras

Menu

Atualizado em:
30/04/2026 | 12:14:49

Acompanhamento Fotográfico

O acompanhamento fotográfico registra o progresso das atividades em campo, proporcionando uma visão in loco do andamento do projeto.

UTILIZE OS FILTROS PARA EXPLORAR OS DADOS LIMPAR FILTROS

Rodovia: Todos Disciplina: Todos Data: 17/09/2025 24/04/2026

Descrição das Atividades - Selecione um ponto no mapa abaixo para detalhar.

Sem disciplina exclusiva selecionada.



Selecione um ponto no mapa para detalhar.



25 de novembro de 2025
22K 450002 7986555
Est.378+00 a 407+00 corpo de aterro em execução
#GO 178_A
Número do índice: 13

- **Portfólio:** No âmbito do Produto 4.1 — Gestão de Portfólio de Projetos (PMO) —, foram realizadas reuniões de PMO com o CAEP e com o IFAG para acompanhamento, revisão e consolidação das informações relacionadas às etapas e fases dos projetos que compõem o portfólio de empreendimentos monitorados. As atualizações realizadas permitiram refletir o status atual de cada iniciativa, em conformidade com as práticas e nomenclaturas adotadas na gestão de projetos, proporcionando uma visão consolidada do andamento do portfólio. No período em questão, houve as seguintes atualizações:

- Evolução dos tópicos de Fase de Estudos das GO-461 e GO-147, de “A iniciar” para “Em curso”;
- Evolução do tópico de Desapropriação da GO-147, de “A iniciar” para “Em curso”.



IFAG
Instituto para o Fortalecimento da Administração Pública

Gerencial

Resumo Executivo

Portfólio

Estudos Rodoviários

Avanço Físico

Relatório Fotográfico

Relatório Unifilar

Financeiro

Repasse

Carteira

Obras

Menu



Atualizado em:

30/04/2026 | 12:14:49

Visão Portfólio

Visão geral do portfólio de empreendimentos, com apresentação dos principais indicadores da carteira e do desempenho individual de cada empreendimento.

Obras em Iniciação
0
*Projetos em elaboração pela COINFRA

Obras em Contratação
0

Obras em Implantação
4

Obras em Encerramento
0

Obras Encerradas
0
*Projetos aceitos pela COINFRA

Tabela de Acompanhamento

RODOVIA	FASE	STATUS	ANTEPROJETO	CONTRATAÇÃO EPC	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	PROJETO EXECUTIVO	FASE DE ESTUDOS	PROJETO EXECUTIVO VIÁRIO PRINCIPAL	PROJETO EXECUTIVO VIÁRIO SECUNDÁRIO	OBRAS ARTES ESPECIAIS	APROVAÇÃO EXE
GO-147	Implantação	Ativo	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Em curso	Em curso	Em curso	À iniciar	À iniciar	À
GO-180	Implantação	Ativo	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Em curso	Em curso	Em curso	À iniciar	À iniciar	À
GO-461	Implantação	Ativo	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Em curso	Em curso	Em curso	À iniciar	N/A	À
GO-178	Implantação	Ativo	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Em curso	Em curso	Em curso	Em curso	N/A	À

Legenda

Finalizado

— Refere-se aos processos que já foram concluídos, com todas as etapas encerradas.

Em curso

— Refere-se aos processos que estão em andamento, com ações sendo realizadas e acompanhamento ativo.

À iniciar

— Refere-se aos processos que ainda não foram iniciados, mas que estão previstos nas etapas do empreendimento.

N/A

— Refere-se aos processos para os quais a etapa do empreendimento não se aplica.

2.4.2 Produtos desenvolvidos no período

CAEP Controle de Produtos										CAEP CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS	
ID	Produto	Empresa Responsável	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data de Início	Data de entrega	Status Entrega		
1	1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3	Geral	01/04/2026	30/04/2026	Entregue		
2	1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	Geral	01/04/2026	30/04/2026	Entregue		

-CONFIDENCIAL-

34

ENCERRAMENTO

O **Relatório Mensal N° 10**, referente à consolidação e à apresentação das atividades desenvolvidas durante o mês de referente ao período **01 de abril/2026 até 30 de abril/2026**, em conformidade ao Contrato N° 01/2025-IFAG, apresenta-se constituído de 35 (Trinta e Cinco) páginas e 07 (Sete) anexos e adotou metodologia tecnicamente adequada e aderente às melhores práticas do assunto em questão, representando a opinião de seus subscritores.

Goiânia, 07 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente
 **ALEX DE VASCONCELOS PINELI ALVES**
Data: 13/05/2026 16:57:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alex de V. Pineli Alves

CAEP – Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos
Produto P1.1 e P1.2 – Relatório mensal – Grupo 1



Vinicius Daher

CAEP – Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos
Produto P1.3 e P1.4 – Relatório mensal – Grupo 1

ANEXOS**LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS**

REF.	DESCRIÇÃO
Anexo I	P1.1 - Controle de Entrega de Produtos de abril.xlsx
Anexo II	P1.1 - Dashboard da Análise de Entrega de Produtos - abril.pdf
Anexo III	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de abril.xlsx
Anexo IV	P1.1 - Timeline de Acompanhamento Macro até abril 2026.pdf
Anexo V	P1.2 - Controle de Reuniões do mês de abril.xlsx
Anexo VI	1.4. Anexos.zip
Anexo VII	Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3 (2)

CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

 **Dynatest**[®]

MANESCO

 **INFRA**
& CAPITAL PROJECTS
BY ALVAREZ & MARSAL



RELATÓRIO CAEP

Grupo 1 - Coordenação Geral Executiva

Relatório Mensal N° 11

Referente ao período de execução de 01.05.26 até 31.05.26

08 de Junho de 2026

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	3
2 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA.....	4
2.1 Produto 1.1 – Relatório de Coordenação Geral	5
2.1.1 Descrição das atividades atribuídas	5
2.1.2 Produtos desenvolvidos no período	5
2.2 Produto 1.2 – Relatório de Relações Institucionais	29
2.2.1 Descrição das atividades atribuídas	29
2.2.2 Produtos desenvolvidos no período	29
2.3 Produto 1.3 – Relatório de Comunicação Integrada	35
2.3.1 Descrição das atividades atribuídas	35
2.4 Produto 1.4 – Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC)	36
2.4.1 Descrição das atividades atribuídas	36
2.4.2 Produtos desenvolvidos no período	44
ENCERRAMENTO.....	45
ANEXOS	46

1 APRESENTAÇÃO

A seleção da empresa Estruturadora pelo Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG - ocorreu por meio do Instrumento de Convocação nº 01/2025 para empresas ou consórcio estruturador, qualificados junto à SEINFRA, conforme o Chamamento Público para pré-qualificação nº 001/2024 da SEINFRA. Consagrado vencedor, o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos - CAEP – desenvolverá, ao longo do contrato, atividades especializadas em gestão de infraestrutura, divididas conformes os grupos:



**Coordenação Geral
Executiva**



**Gestão de Engenharia
e Socioambiental**



**Certificação de
Projetos e
Obras**



**Gestão de Processos
Administrativos e
Contábeis**



**Assessoramento e
Consultoria Jurídica**

Figura 1 – Imagem ilustrativa da gestão em infraestrutura.

O CAEP é formado pelas empresas Dynatest Engenharia LTDA, Bureau Veritas do Brasil Sociedade Classificadora e Certificadora LTDA., Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA e Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados.

O Consórcio Estruturador apresenta ao IFAG o **Relatório Mensal Nº 11**, referente ao período de **01 de Maio/2026 até 31 de Maio/2026**, em conformidade ao Contrato Nº 01/2025-IFAG.

O presente Relatório Mensal apresenta os elementos do objeto contratual descrito no Termo de Referência como “Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA”.

2 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

A Coordenação Geral Executiva atua como agente de interface entre todos os envolvidos, isto é, IFAG, SEINFRA, GOINFRA, empresas projetistas, empresas executoras e empresas supervisoras, garantindo que o objetivo seja executado de forma eficaz, transparente e coordenada. A função central desta coordenação é manter a coesão entre as diversas áreas envolvidas (gerenciamento de obras, projetos, governança, contábil, legal, dentre outras) e assegurar que todas as atividades sejam realizadas de acordo com os padrões técnicos, legais e de governança definidos pela SEINFRA, GOINFRA, FUNDEINFRA e IFAG.

Principais atividades:

- Gestão centralizada;
- Integração das atividades;
- Interlocução com partes interessadas (stakeholders);
- Comunicação integrada;
- Acompanhamento de cronogramas e alocação de recursos;
- Gestão integrada de riscos;
- Acompanhamento de processos e prestação de contas;
- Desenvolvimento e manutenção de sistemas e painéis do tipo sala de situação.

2.1 Produto 1.1 – Relatório de Coordenação Geral

2.1.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.1, referente ao Relatório de Coordenação Geral, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório detalhado que descreve a estrutura da Coordenação Central, responsável pela gestão centralizada de todas as (macro)atividades e seus produtos, no âmbito de suas atribuições e responsabilidades. Deverá contemplar no mínimo:

- Progresso e Prestação de Contas das Atividades: relatório que consolida o progresso de todas as atividades executadas, em execução e planejadas, indicando as fases atuais de atendimento (status), a fim de assegurar a prestação de contas à Associação, SEINFRA, órgãos de controle, e demais partes interessadas além de oferecer transparência aos demais stakeholders quanto às suas atividades. Esses relatórios incluirão indicadores de desempenho globais e parciais, cumprimento de prazos, resultados financeiros e alinhamento às normas técnicas e legais.*
- Plano de Gestão Integrada de Riscos: documento que consolida a gestão de riscos de todas as áreas do projeto, garantindo que a visão abrangente e atualizada dos riscos envolvidos (financeiros, operacionais, ambientais, jurídicos, ou outros inerentes ao objetivo do projeto). O plano estabelecerá as medidas de mitigação e contingência, indicando os responsáveis por cada ação, além de promover a coordenação entre os setores para garantir uma resposta integrada.”*

2.1.2 Produtos desenvolvidos no período

- Planilha de Controle de Produtos referente ao mês de maio.

Durante o mês de maio de 2026, o CAEP manteve elevado nível de produção técnica, administrativa e institucional, com a emissão de documentos voltados ao acompanhamento das obras, à análise de projetos executivos, à gestão contratual e ao fortalecimento da governança do Programa. O período foi marcado por intensa atuação das equipes, com destaque para atas de reuniões de alinhamento técnico e operacional, notificações de não conformidade, pareceres técnicos, notas técnicas, relatórios de acompanhamento de obras, boletins de medição e instrumentos de assessoramento jurídico.

O conjunto de entregas evidencia a atuação integrada das empresas consorciadas Dynatest, A&M Infra, Bureau Veritas e Manesco, que atuaram de forma complementar nas frentes de engenharia, gestão contratual, certificação, planejamento financeiro, gestão de riscos e assessoramento jurídico. Observou-se predominância das atividades vinculadas às frentes de Gerenciamento Técnico, Coordenação de

Serviços de Engenharia e Análise de Projeto e RPFO, responsáveis pela maior parte das entregas relacionadas ao acompanhamento dos empreendimentos e à análise técnica dos projetos executivos.

No âmbito técnico-operacional, destacaram-se as análises e aceitação de projetos executivos, abrangendo estudos geotécnicos, geológicos, hidrológicos, drenagem, terraplenagem, pavimentação e projeto geométrico. Também foram emitidos pareceres de conformidade ambiental, avaliações de segurança do trabalho, análises de pendências documentais, eventogramas e notificações de não conformidade de natureza contratual, ambiental e de obra, além de boletins de medição e relatórios semanais de acompanhamento.

As atividades do mês abrangeram os empreendimentos GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461, que concentraram reuniões de alinhamento técnico, análises especializadas, pareceres ambientais, notificações e relatórios de acompanhamento de obras. A recorrência dessas entregas demonstra a continuidade das ações de fiscalização, controle técnico e monitoramento dos empreendimentos acompanhados pelo consórcio.

No campo da gestão contratual e assessoramento jurídico, a Manesco manteve atuação relevante por meio da elaboração de relatórios jurídicos, revisões de minutas, respostas a ofícios, análises de cronogramas e documentos voltados à gestão contratual das obras. Paralelamente, a A&M Infra contribuiu com relatórios de portfólio, dashboards gerenciais, acompanhamentos financeiros, matrizes de riscos e relatórios IRIS, reforçando os mecanismos de governança, transparência e suporte à tomada de decisão.

No campo da certificação, o Bureau Veritas manteve as atividades de verificação independente, com a emissão do Relatório Mensal de Gestão da Certificação e dos relatórios técnicos de obra referentes aos empreendimentos GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461, fortalecendo os mecanismos de inspeção técnica e controle externo.

Além das entregas concluídas, o mês de maio registrou produtos em elaboração relacionados à padronização dos processos de fiscalização ambiental e de segurança do trabalho, evidenciando a continuidade das ações de aprimoramento institucional.

Dessa forma, o controle de produtos referente ao mês de maio de 2026 apresenta um panorama abrangente e atualizado da atuação do CAEP no período, assegurando rastreabilidade documental, transparência na execução das atividades e aderência às responsabilidades previstas no escopo contratual.

Apresenta-se, portanto, a seguir, a planilha consolidada das entregas de maio de 2026, contendo a identificação do produto, a empresa responsável, o tipo de documento, a descrição, o empreendimento correspondente, a data de entrega e o status atualizado, permanecendo como ferramenta fundamental para o acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas pelo consórcio.

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-102.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	04/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.3	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Setembro/2025	GO-180	04/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-002.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-180	04/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-003.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Novembro/2025	GO-180	04/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-017.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	04/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-047.1	Parecer	Parecer Técnico - Eventograma	GO-180	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-461	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-002.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Novembro/2025	GO-461	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-003.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Dezembro/2025	GO-461	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-025.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-030.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-031.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-031.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-107.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	06/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-018.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	06/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-108.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	07/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-109.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	07/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-077.1	Parecer	Parecer Técnico - Eventograma	GO-461	07/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-105.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	07/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-106.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	07/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-110.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	08/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-111.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	08/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-076.1	Parecer	Parecer Técnico - Eventograma	GO-147	08/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-078.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Terraplenagem	GO-178A	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-019.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	GO-461	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-020.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza SST	GO-461	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-027.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	GO-178A	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-028.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Segurança do Trabalho	GO-178A	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-029.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-034.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-035.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-035.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	08/05/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião 08/05/2026	Reunião	Reunião de alinhamento entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	08/05/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta - bueiros sem armação - Relatório de Medição - CCB	Gestão Contratual	Revisão de minuta sobre a execução de bueiros sem armação para relatório de medição de serviços executados pela CCB	GO-147	08/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-138.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-139.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos, DAP e DUP	GO-147	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-140.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-141.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos	GO-178A	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-142.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-180	11/05/2026	Entregue

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-143.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP, Hidrologia e Geotecnia	GO-180	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-144.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-461	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-145.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-461	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-075.1	Parecer	Parecer Técnico - DUP	GO-178A	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-079.1	Parecer	Parecer Técnico - DUP	GO-180	11/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-112.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	11/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Setembro/2025	GO-147	11/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-002.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-147	11/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-003.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Novembro/2025	GO-147	11/05/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 10	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a abril de 2026	Geral	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-146.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos	GO-461	13/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-012.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Projeto	GO-147	13/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-013.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	13/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-026.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	13/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-031.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	13/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-032.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	13/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-032.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	13/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-114.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	14/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-115.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	14/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-113.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	14/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-014.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza SST	GO-147	14/05/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Nota Técnica em resposta ao Ofício CCB-28/2026	Gestão Contratual	Minuta de resposta ao Ofício 28/2026 da CCB sobre bueiros sem armacão	GO-147	14/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-116.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	15/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-117.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	15/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-044.1	Parecer	Parecer Técnico - Projeto Geométrico	GO-461	15/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-147.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Hidrológicos	GO-180	15/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-149.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-461	15/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-150.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-461	15/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-026.2	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	15/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-031.2	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	15/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-032.2	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	15/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-032.2	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	15/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-080.1	Parecer	Parecer Técnico - DUP	GO-461	18/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-118.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	18/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-048.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade SST	GO-147	18/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-050.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	18/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-051.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	18/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-148.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Drenagem	GO-178A	19/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-123.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	20/05/2026	Entregue

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-081.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	20/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-082.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-180	20/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-084.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	20/05/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Matriz RACI	Outros	Apoio na elaboração de Matriz RACI pelo CAEP considerando as alterações nas responsabilidades da parceria após Mesa Técnica Revisão do Parecer Técnico (PA-078) elaborado pelo CAEP em resposta à CCL/TRAFFECOM	Geral	20/05/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Parecer Técnico (PA-078)	Gestão Contratual		GO-178A	20/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-119.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	21/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-120.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-121.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-122.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-015.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-016.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-147	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-083.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-027.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-032.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-033.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-033.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	21/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-125.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	22/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-126.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	22/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-020.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-180	22/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-021.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	22/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-021.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-461	22/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-022.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	22/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-029.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-178A	22/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-086.1	Parecer	Parecer Técnico - Relatório de Não Conformidade NC-018	GO-461	22/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-087.1	Parecer	Parecer Técnico - Ocorrência apontada na passagem de fauna Elaboração de resposta ao Ofício 031/2026 da CCB quanto à notificação de atraso do cronograma na entrega dos projetos executivos	GO-147	22/05/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Resposta ao Ofício 031/2026 da CCB	Gestão Contratual		GO-147	22/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	IT-006.1	Instrução Técnica	Instrução Técnica Inspeção em Alojamentos	Geral	25/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-151.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	25/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-085.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Terraplenagem	GO-461	25/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-088.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Terraplenagem	GO-178A	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-124.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-017.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-147	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-023.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza SST	GO-180	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-024.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-180	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-089.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-090.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-091.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-180	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-092.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	25/05/2026	Entregue

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-093.1	Parecer	Parecer Técnico Análise de pendência documental referente à supervisora	GO-147	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-094.1	Parecer	Parecer Técnico Análise de pendência documental referente à supervisora	GO-180	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-095.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-096.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-180	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-097.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-100.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-022.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	26/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-023.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	26/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-030.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-178A	26/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-101.1	Parecer	Parecer Técnico Análise de pendência documental referente à supervisora	GO-178A	26/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-102.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	26/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-152.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	27/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-153.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos	GO-147	27/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-154.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	27/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-155.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos	GO-178A	27/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-103.1	Parecer	Parecer Técnico - DUP	GO-178A	27/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-104.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto Geométrico	GO-147	27/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-133.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	27/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-129.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	28/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-130.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	28/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-127.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	28/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-024.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-461	28/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-099.1	Parecer	Parecer Técnico Análise de pendência documental referente à supervisora	GO-461	28/05/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião 28/05/2026	Reunião	Reunião entre IFAG e equipe jurídica do CAEP sobre acompanhamento de cronograma e aplicação de penalidades	Geral	28/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-128.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	29/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-156.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto Geométrico	GO-180	29/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-157.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	29/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-158.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto Geométrico, Projeto de Drenagem e DUP	GO-178A	29/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-108.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Pavimentação	GO-461	29/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-031.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	29/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-032.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza SST	GO-178A	29/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-028.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	29/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-033.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	29/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-034.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	29/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-034.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	29/05/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3	Geral	31/05/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	Geral	31/05/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	[TIC] Sala de Situação - Manual Descritivo do Portal de Acompanhamento	Geral	31/05/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°11 - 01.05.26	Geral	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	[CAEP.IFAG] Portfólio	Geral	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Alocação de Recursos - Interno IFAG	Geral	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Ata de Reunião	Controle de Reuniões A&M	Geral	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Outros	E-mails de Aprovação	Geral	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Outros	KPI - Alocação de Recursos - Sala de Situação	Geral	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Outros	KPI - Gestão Integrada	Geral	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Ata de Reunião	[2026.05] Controle de Reuniões A&M.xlsx	Geral	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	IFAG - Portfólio de Projetos.xlsx	Geral	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Acompanhamento Financeiro - GO-147	Geral	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Acompanhamento Financeiro - GO-178A	GO-147	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Acompanhamento Financeiro - GO-180	GO-178A	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Acompanhamento Financeiro - GO-461	GO-180	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	[GO147] Relatório Financeiro - Set a Nov - 2025	GO-147	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	[GO180] Relatório Financeiro - Set a Nov - 2025	GO-180	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	[GO461] Relatório Financeiro - Out a Dez - 2025	GO-461	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	GO147 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Nov	GO-147	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	GO147 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Out	GO-147	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	GO147 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Set	GO-147	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	GO180 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Nov	GO-180	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	GO180 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Out	GO-180	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	GO180 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Set	GO-180	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	GO461 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Dez	GO-461	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	GO461 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Nov	GO-461	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	GO461 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Out	GO-461	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	4.2. Financeiro Carteira - Sala de Situação	Geral	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	4.2. Financeiro Obras - Sala de Situação	Geral	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	4.2. Financeiro Repasses - Sala de Situação	Geral	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°11 - 01.05.26	Geral	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO178A	GO-178A	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO147	GO-147	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO180	GO-180	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO461	GO-461	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - Programa	Geral	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO178A	GO-178A	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO147	GO-147	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO180	GO-180	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO461	GO-461	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Relatório IRIS - Programa	Geral	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°11 - 01.05.26	Geral	31/05/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo I - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - controle de recebimento e arquivamento de documentos e informações relevantes para a gestão contratual no período de recorte	Geral	31/05/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo II - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - perguntas aos responsáveis no período de recorte	Geral	31/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-131.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	01/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-132.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	01/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-098.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	03/06/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Relatório Grupo 1 - Relatório Mensal N°11	Relatório Mensal	Relatório Mensal da Entrega de Produtos de Maio	Geral	07/06/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Timeline de Acompanhamento Macro até maio 2026	Outros	Timeline de Coordenação de Pontos Macros	Geral	07/06/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Dashboard da Análise de Entrega de Produtos - maio	Outros	Dashboard Mensal de Análise de entregas CAEP	Geral	07/06/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Controle de Entrega de Produtos de maio	Outros	Planilha do Gerenciamento de entregas Mensal	Geral	07/06/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de maio	Outros	Planilha com o Quadro Financeiro Mensal	Geral	07/06/2026	Entregue

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de maio	Outros	Planilha com o Quadro Financeiro Mensal	Geral	07/06/2026	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	P1.2 - Controle de Reuniões do mês de	Outros	Planilha do Controle de Reuniões	Geral	07/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-008.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-461	08/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-009.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-147	08/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-009.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-180	08/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-009.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	08/06/2026	Entregue
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	RL-P3.1-BI008-RGC-001	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Gestão da Certificação	Geral	09/06/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.05 - GO-180	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-180	09/06/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.05 - GO-178A	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-178A	09/06/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.05 - GO-147	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-147	09/06/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.05 - GO-461	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-461	09/06/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 11	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a maio de 2026	Geral	N/A	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	P5.3 - Relatório de Gestão Contratual	Relatório Técnico	Relatório de Gestão Contratual referente às obras em andamento no período de recorte	Geral	N/A	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	POP-007.1	Procedimento Operacional Padrão	Procedimento Operacional Padrão Fiscalização e Gestão Ambiental.	Geral		Em elaboração
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	POP-008.1	Procedimento Operacional	Procedimento Operacional Padrão Fiscalização em Segurança do	Geral		Em
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Parecer	Carta 012-2026 Carta CAEP aditivo contratual_v1assinado	Geral	31/05/2026	Entregue

- Dashboard Analítico das Entregas Executadas em maio.

O painel analítico de entregas apresenta uma visão consolidada do desempenho do CAEP no mês de maio de 2026, permitindo à Coordenação Geral Executiva acompanhar, de forma sintética e visual, os principais indicadores de produção e o comportamento das frentes de trabalho ao longo do período. A ferramenta reúne informações essenciais para a gestão contratual, como o volume total de produtos emitidos, o percentual de execução, a distribuição por status, a participação das empresas consorciadas e o comparativo entre as frentes técnicas, jurídicas, administrativas e de governança.

No período, foram registrados 218 produtos, dos quais 216 (99%) foram efetivamente entregues e apenas 2 (1%) permaneciam em elaboração, conforme demonstrado no dashboard consolidado. Os indicadores evidenciam um desempenho altamente satisfatório e representam um crescimento significativo em relação ao mês anterior, refletindo a intensificação das atividades de acompanhamento técnico, gestão contratual e monitoramento dos empreendimentos.

A distribuição por frentes de atuação indica a predominância da área de Gestão de Engenharia, Meio Ambiente e Desapropriação, responsável por 152 documentos, seguida por Gestão de Projetos e Contabilidade, com 40 entregas, Assessoramento e Consultoria Jurídica, com 11, Coordenação Executiva, com 10, e Certificação de Projetos e Obras, com 5 documentos. Essa configuração reforça o caráter multidisciplinar da atuação do CAEP e demonstra a forte concentração das atividades nas frentes técnicas de engenharia, fiscalização e acompanhamento operacional das obras.

No recorte por empresa, observa-se a liderança da Dynatest, com 158 produtos entregues, seguida pela A&M Infra, com 44, pela Manesco, com 11, e pelo Bureau Veritas, com 5 documentos. A distribuição evidencia a predominância das atividades técnicas e operacionais conduzidas pela equipe de engenharia, ao mesmo tempo em que confirma a integração entre as áreas de governança, assessoramento jurídico, gestão financeira e certificação independente.

A análise temporal demonstra que a produção esteve distribuída ao longo de todo o mês de maio, com picos expressivos de emissão especialmente nos dias 25 e 31, destacando-se este último como o dia de maior volume de entregas do período, com 46 documentos registrados. Esses momentos de maior concentração refletem a consolidação de relatórios de acompanhamento de obras, notas técnicas, pareceres técnicos, documentos jurídicos, relatórios financeiros e instrumentos de gestão associados ao fechamento dos ciclos semanais e mensais de controle e prestação de contas.

O dashboard fortalece o papel da Coordenação Geral Executiva ao viabilizar uma visão integrada e transparente das entregas, apoiando a prestação de contas à GOINFRA, ao IFAG e aos órgãos de controle. A centralização das informações permite monitorar prazos, avaliar o desempenho das frentes de trabalho, identificar tendências operacionais e antecipar pontos de atenção, contribuindo diretamente para a tomada de decisões estratégicas e para a mitigação de riscos.

Assim, apresenta-se o painel atualizado de análise das entregas do CAEP referente ao mês de maio de 2026, elaborado a partir da consolidação dos dados da planilha de controle e dos registros produzidos pelas empresas consorciadas. A visualização evidencia a manutenção de elevado desempenho produtivo no período, reafirmando a capacidade do consórcio de operar com eficiência, rastreabilidade e governança na execução de suas responsabilidades contratuais.

CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Dashboard: Análise de Entregas CAEP


216
Entregues

218
Total

Tipos de Produtos Entregáveis

- ☐ 1.1 COORDENAÇÃO GERAL
- ☐ 1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
- ☐ 1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL
- ☐ 1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES
- ☐ 2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- ☐ 2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO
- ☐ 2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO
- ☐ 3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO
- ☐ 3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
- ☐ 4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO
- ☐ 4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL
- ☐ 4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE
- ☐ 5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO
- ☐ 5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL

Produtos X Entrega

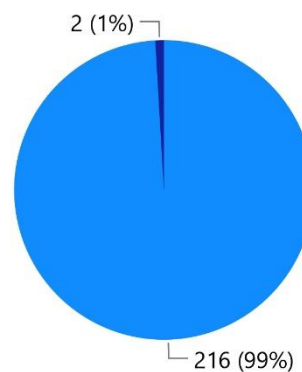


● Entregue ● Em elaboração


Quantidade de Documentos por Frente

	n°
Gestão de Engenharia, Meio Ambiente e Desapropriação	152
Gestão de Projetos e Contabilidade	40
Assessoramento e Consultoria Jurídica	11
Coordenação Executiva	10
Certificação de Projetos e Obras	5

Produtos por Empresa

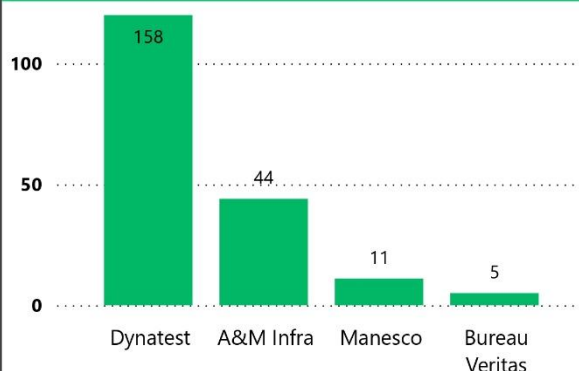

Controle de produtos mensal

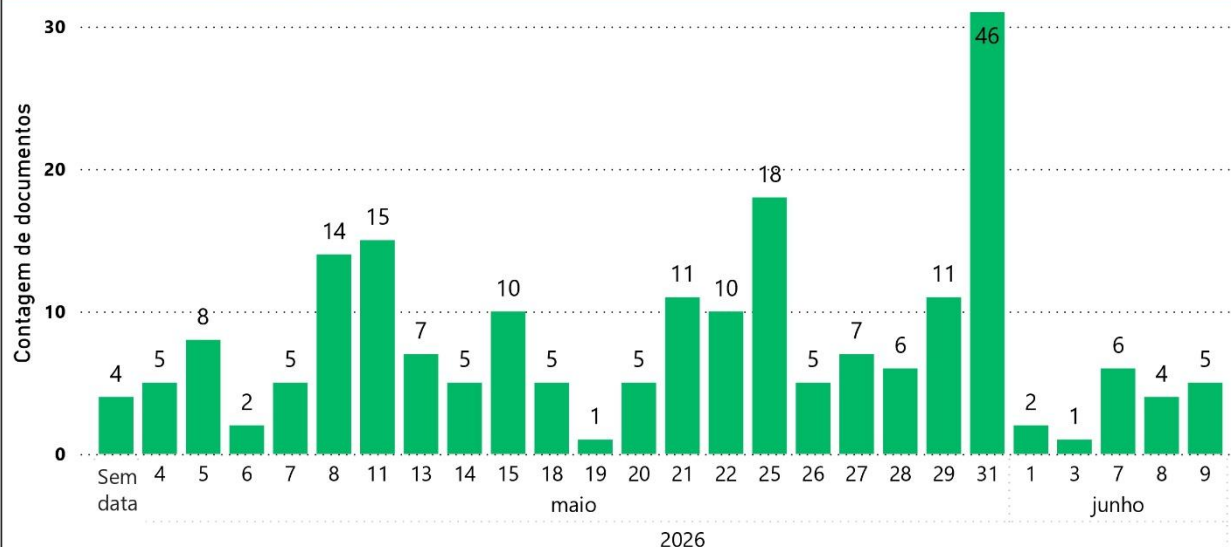

- Linha do Tempo do Progresso das Atividades Executadas em maio de 2026

O mês de maio de 2026 caracterizou-se pela continuidade das atividades de acompanhamento, monitoramento e controle dos empreendimentos vinculados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA, sob coordenação do Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP). Embora não tenham sido registrados novos marcos estruturantes relacionados à publicação de empreendimentos, recebimento ou julgamento de propostas, emissão de licenças ambientais ou início de novas frentes de execução, o período foi marcado pela efetivação de importantes etapas de natureza financeira e contratual associadas às obras em andamento.


Nesse contexto, destacam-se os pagamentos das medições referentes ao primeiro trimestre de execução dos contratos, realizados por intermédio do IFAG, contemplando a rodovia GO-180 em 6 de maio, correspondente aos serviços executados entre setembro e novembro de 2025; a rodovia GO-461 em 8 de maio, referente ao período compreendido entre outubro e dezembro de 2025; e a rodovia GO-147 em 12 de maio, relativa aos serviços executados entre setembro e novembro de 2025. Esses pagamentos representam marcos relevantes para a manutenção do fluxo financeiro dos contratos e refletem a regular evolução dos serviços executados, observados os procedimentos de medição, conferência, certificação e aprovação estabelecidos no âmbito do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA.

Durante o período, o CAEP manteve sua atuação voltada à coordenação das atividades de monitoramento técnico, administrativo, financeiro, jurídico e socioambiental, acompanhando a tramitação dos processos de medição, a conformidade documental e o alinhamento entre os agentes envolvidos na execução dos empreendimentos. As ações desenvolvidas contribuíram para assegurar a regularidade dos desembolsos e a aderência dos contratos aos instrumentos de governança e controle adotados pelo FUNDEINFRA.

Esse cenário demonstra que o programa permanece em uma fase de execução consolidada, na qual os esforços institucionais concentram-se no acompanhamento do desempenho físico e financeiro das obras, na mitigação de riscos e na garantia da conformidade contratual e administrativa dos empreendimentos em execução.

Assim, a linha do tempo de maio de 2026 evidencia um período de estabilidade institucional e operacional, no qual os principais registros estão associados à gestão financeira dos contratos em andamento. A efetivação dos pagamentos das medições trimestrais reforça a continuidade da execução das obras e reafirma o papel do CAEP como instância técnica responsável pela integração das frentes de trabalho, pelo acompanhamento dos processos e pela transparência na condução dos empreendimentos estruturantes do Estado de Goiás.


Progresso das atividades executadas [Julho/2025]
Timeline

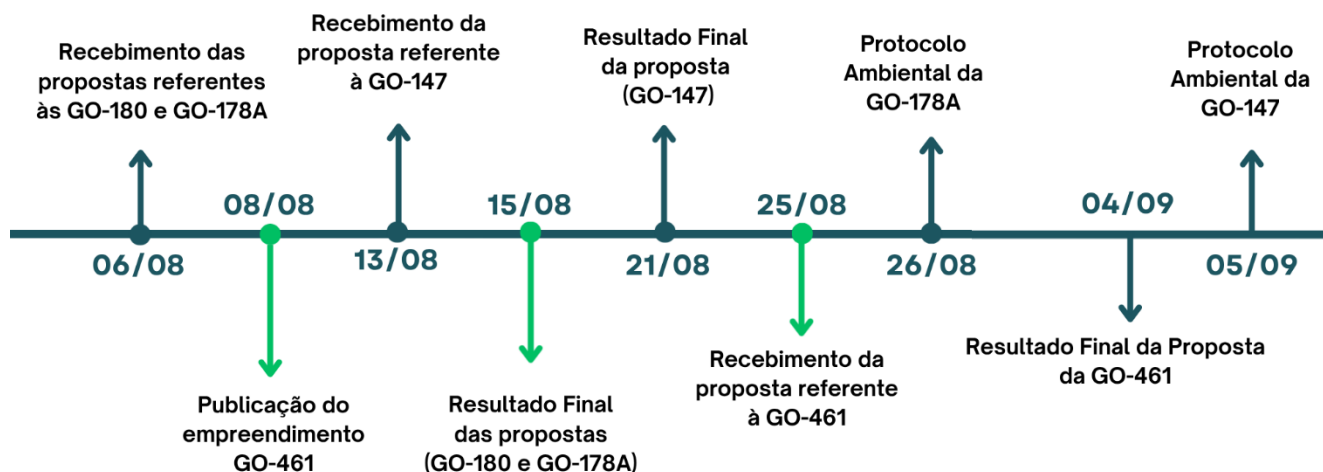Progresso das atividades executadas [Agosto/2025]
Timeline




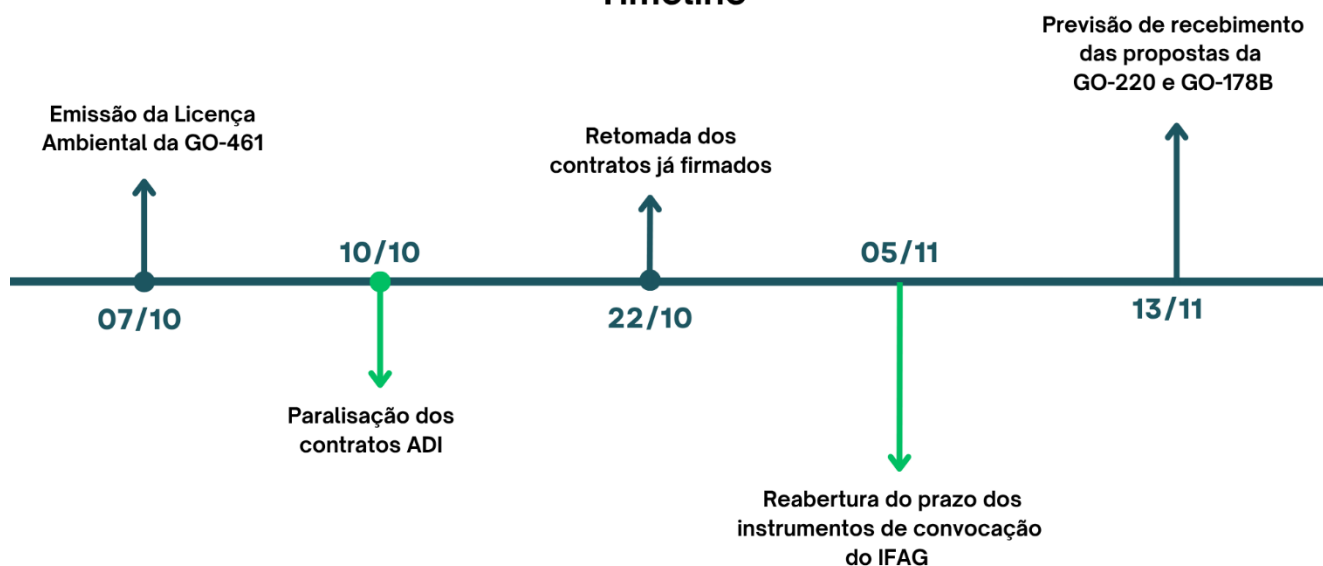
Progresso das atividades executadas [Setembro/2025]

Timeline

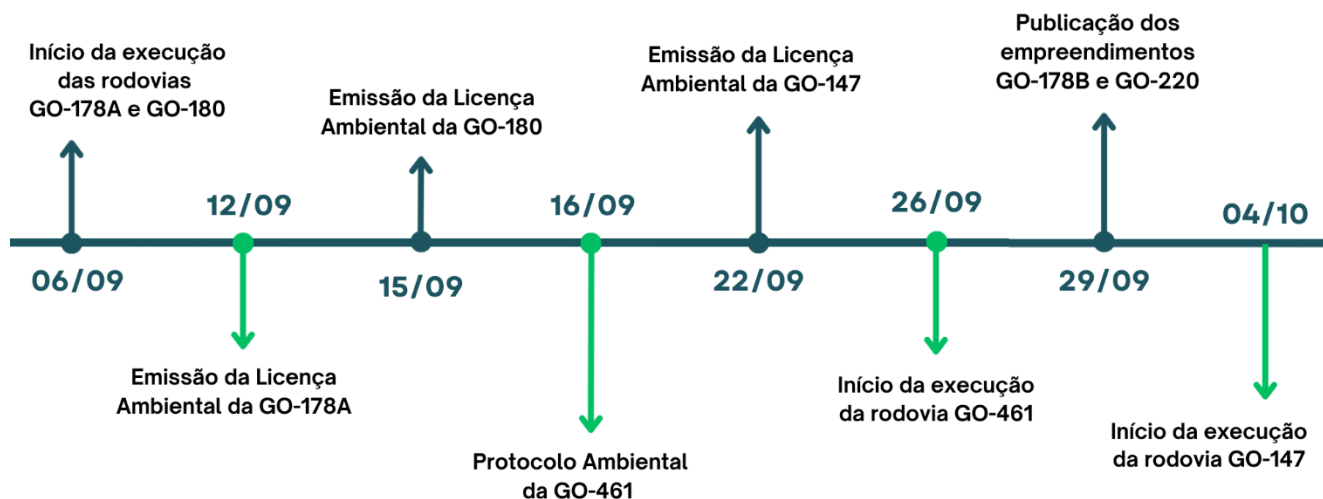

Progresso das atividades executadas [Outubro/2025]


Timeline






Progresso das atividades executadas [Novembro/2025]

Timeline



Progresso das atividades executadas [Dezembro/2025]

Timeline

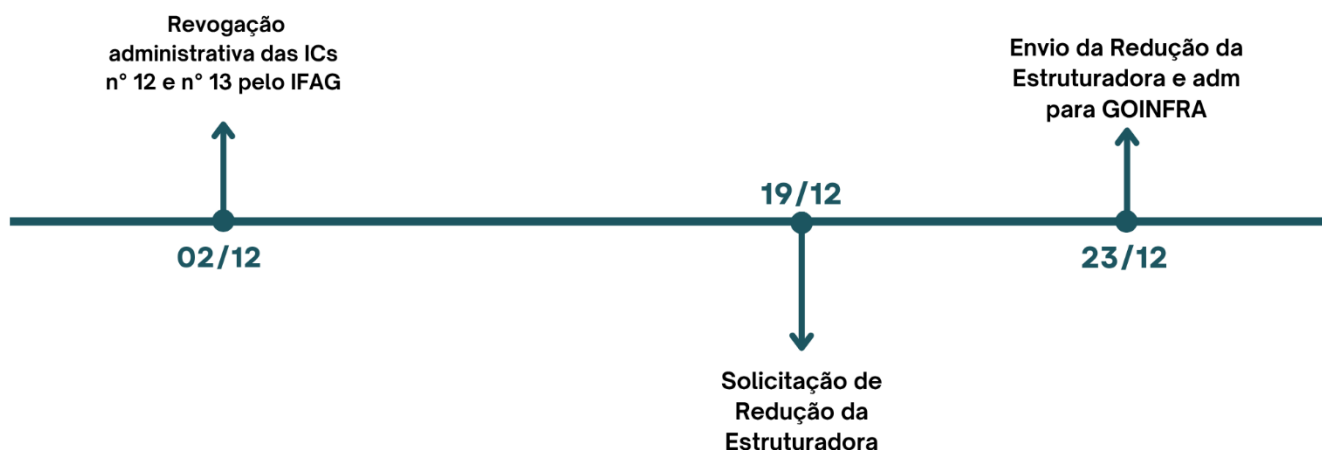




Progresso das atividades executadas [Janeiro/2026]

Timeline



Progresso das atividades executadas [Fevereiro/2026]


Timeline

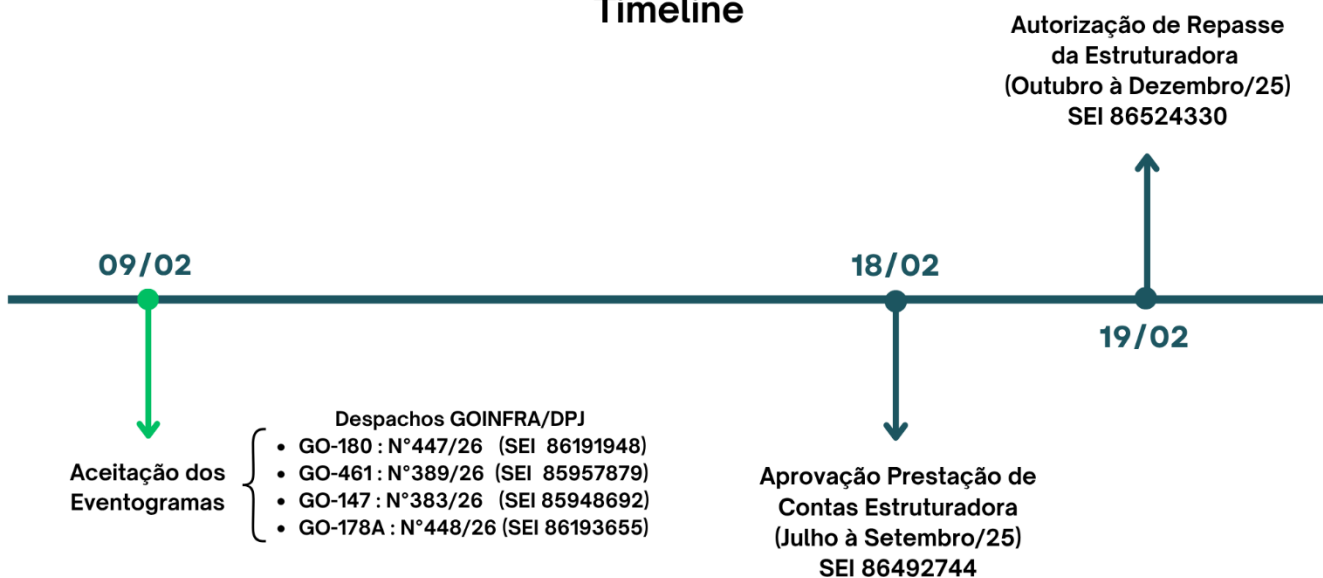




Progresso das atividades executadas [Março/2026]

Timeline

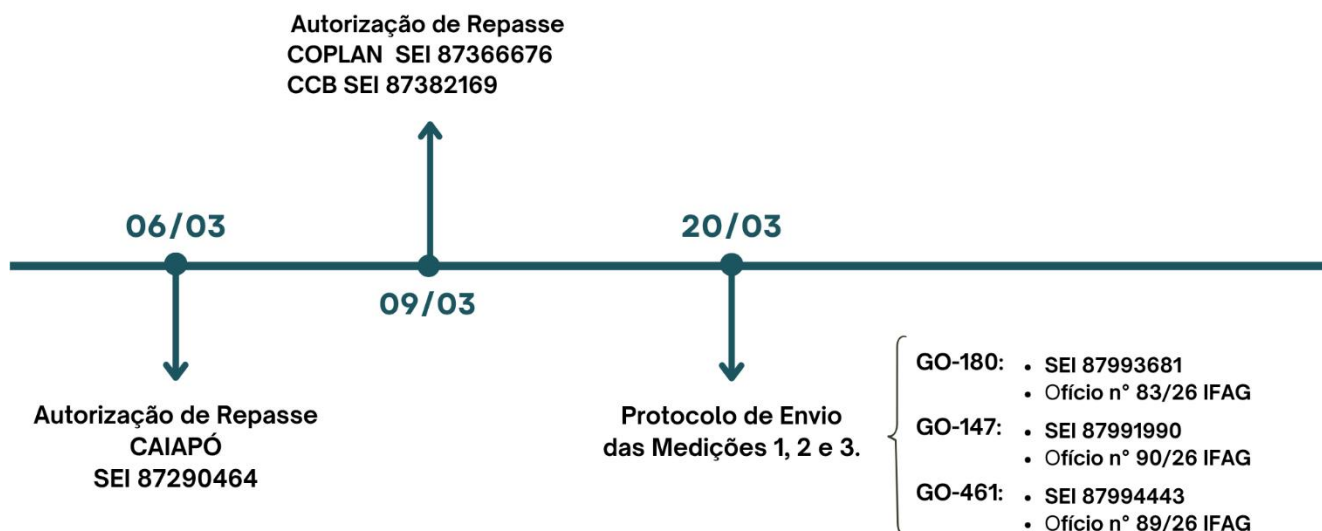

Progresso das atividades executadas [Abril/2026]

Timeline

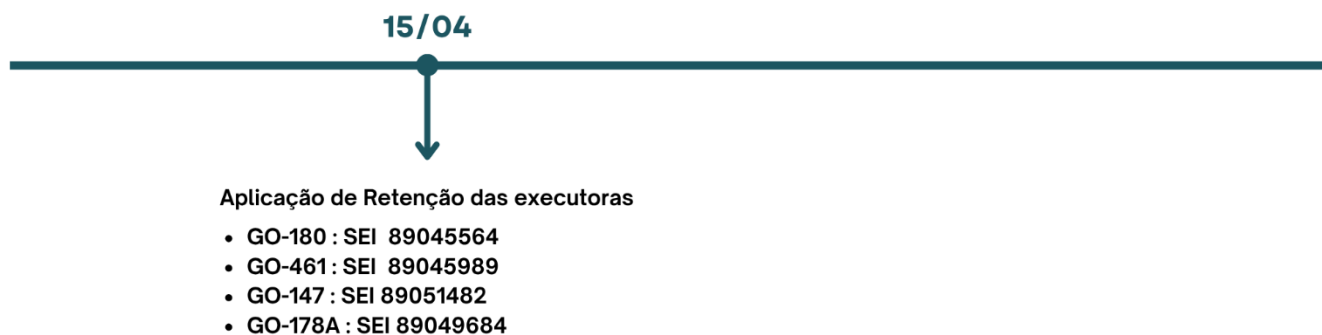

Timeline



- Reuniões de Governança realizadas durante o mês de maio.

Durante o mês de maio, as reuniões de governança do Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP) concentraram-se no fortalecimento dos mecanismos de controle técnico, contratual e financeiro do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA, com ênfase na certificação de projetos e obras, na gestão de não conformidades e na consolidação dos fluxos de governança entre IFAG, GOINFRA, empresas executoras, certificadora e consórcio estruturador. A Coordenação Executiva manteve sua atuação como instância integradora entre os diversos agentes envolvidos, promovendo alinhamento institucional e padronização dos processos de tomada de decisão.

As agendas internas de governança do CAEP concentraram-se na estruturação documental dos empreendimentos, no aperfeiçoamento dos fluxos de certificação, na revisão de responsabilidades entre as equipes envolvidas e na reorganização dos processos de acompanhamento dos projetos. Também foram discutidos temas relacionados ao Produto 1.3, à revisão de aditivos contratuais e à definição de fluxogramas operacionais.

No âmbito técnico-operacional, as reuniões com a Dynatest tiveram como foco principal a situação dos projetos das rodovias GO-180, GO-147, GO-178 e demais empreendimentos em andamento, com destaque para os impactos decorrentes de atrasos em disciplinas críticas, especialmente geotecnia, hidrologia, drenagem e desapropriações. Foram discutidos riscos associados ao avanço das obras sem aprovação definitiva dos projetos, limitações para certificação, necessidade de emissão de circulares e notificações preventivas, além da adoção de mecanismos de controle para evitar pagamentos e medições desvinculados da conformidade técnica exigida contratualmente.

As reuniões com a Bureau Veritas aprofundaram as discussões sobre não conformidades de execução, riscos de certificação e responsabilidades das executoras quanto à qualidade dos projetos e serviços

executados. Foram debatidos casos de execução de obras sem documentação executiva completa, divergências de interpretação contratual relativas aos limites de avanço físico sem projetos aprovados e necessidade de adoção de medidas graduais de controle, incluindo notificações, advertências e eventuais sanções administrativas. Também foram alinhados procedimentos para consolidação de evidências técnicas e fortalecimento da atuação da certificadora como instância independente de validação dos empreendimentos.

As agendas com a Alvarez & Marsal concentraram-se na governança financeira do programa, incluindo prestação de contas, validação de medições, acompanhamento dos riscos financeiros e consolidação de relatórios gerenciais. Foram discutidos mecanismos de rastreabilidade de solicitações, repasses e alterações contratuais, além do aperfeiçoamento dos painéis de monitoramento e integração de informações físicas e financeiras. Destacou-se também a busca por ferramentas que permitam maior automação e transparência dos controles, reduzindo riscos operacionais e fortalecendo a capacidade de acompanhamento do portfólio de obras.

Em paralelo, as reuniões com a Manesco tiveram como foco a reprogramação das atividades do consórcio, a redistribuição formal de responsabilidades entre IFAG, GOINFRA, consórcio e executoras, bem como a elaboração de documentos voltados à definição dos fluxos institucionais e das responsabilidades de cada agente. As discussões buscaram fortalecer a segurança jurídica dos processos, assegurar maior clareza na governança contratual e promover alinhamento prévio entre os órgãos envolvidos antes da formalização dos encaminhamentos.

Em síntese, maio foi marcado pelo aprofundamento das discussões relacionadas à certificação, conformidade contratual, gestão de riscos e controle das medições, evidenciando a necessidade de maior integração entre os processos de projeto, execução e fiscalização das obras. As reuniões realizadas no período reforçaram a governança do programa, ampliaram a rastreabilidade das decisões e contribuíram para o fortalecimento dos mecanismos de controle técnico, financeiro e institucional necessários à adequada condução dos empreendimentos vinculados ao FUNDEINFRA.


CAEP Controle de Reuniões			CAEP
Data	Participantes	Assuntos	
07/05/2026	Representantes CAEP: Dynatest, Bureau Veritas, Alvarez & Marsal e Manesco	Reunião de Governança CAEP - pauta: Medição e não conformidades; Estruturação documental e PMO; Histórico, divisão de conteúdo e responsabilidades; Produto 1.3 e revisão do aditivo; Avaliação dos estudos e repositório de projetos; Alteração de materiais, riscos e apoio jurídico; Definição de fluxos para Goinfra e certificação.	
08/05/2026	Dynatest: Victor Castro CAEP: Alex Pineli IFAG: Sérgio Borges e Eliseu Garcia	Reunião de Governança IFAG e Dynatest - resumo ata: A reunião tratou do status de projetos (Caiaipó, CCL, CCB, Coplan) e das implicações da qualidade dos entregáveis sobre as frentes de obra e pagamentos contratuais. No projeto Caiaipó (trecho 180) foram discutidas as disciplinas DUP, Hidrologia, Geotecnia e Projeto Geométrico: hidrologia/drenagem obteve aprovação que permitiu avanços, mas a geotecnia (identificada como gargalo) está na quarta revisão (entregue em 24/4) com inconsistências em ensaios e boletins fotográficos que podem levar à reprovação. A equipe reportou que a construtora já executa cerca de 20 km de terraplenagem sem geotecnia aprovada, colocando em risco atingir 50% do valor global do contrato sem projeto de terraplenagem aprovado. O geométrico será analisado preliminarmente, condicionado à coerência com sondagens e correções geotécnicas. Sobre CCL e CCB, a geotecnia da CCL apresentou problemas semelhantes e a drenagem teve aprovação com ressalva quantitativa, com avaliação em curso sobre compensações orçamentárias e quantitativas. A CCB apresentou entregas incompletas e baixa qualidade técnica recorrente, incluindo disciplinas como desapropriação; a equipe sugeriu notificação mais dura à contratada e possível advertência formal se não houver melhora até a semana seguinte. A Coplan foi elogiada pela qualidade relativa da documentação e retomada de entregas, com avaliações prévias já encaminhadas para DUP e geométrico. Foram mencionadas limitações operacionais: sem aprovação final da geotecnia não é possível concluir análises finais de terraplenagem e pavimentação, mesmo com partes do viário já entregues. Em campo, Caiaipó retomou forte terraplenagem em ~20 km, CCL avançou em drenagem e montagem de bueiros, e as variações de terraplenagem reportadas (~10 cm) não impactam o projeto de forma expressiva.	
08/05/2026	Bureau Veritas: Vinicius Coutinho e Ciro Sampaio CAEP: Alex Pineli IFAG: Sérgio Borges e Eliseu Garcia	Reunião de Governança IFAG e BV - resumo ata: A reunião tratou da situação das obras sob responsabilidade do IFAG, com foco em não conformidades de execução sem projeto executivo adequado, interpretações contratuais controversas e o papel do consórcio e da certificadora na garantia técnica e na mitigação de riscos jurídicos. Participantes discutiram avanços na interlocução com Goinfra e sinais favoráveis de manutenção das obras sob IFAG. Foi debatida em detalhe a redação controversa da cláusula que permitiria até 50% da obra sem entrega total dos projetos, cuja interpretação ambigua tem permitido início de serviços com anteprojetos incompletos. Foram relatadas várias não conformidades práticas: drenagens e bueiros executados fora de normas técnicas, omissões contratuais (por exemplo, especificação de aço ausente na CPU) e práticas locais que substituem projeto por orçamentos locais. A equipe enfatizou que a construtora é responsável pela qualidade e deve produzir estudo de abrangência, análise de causa raiz e plano de ação para cada não conformidade; a fiscalização, supervisão e certificadora são garantias de terceiros, sem eximir responsabilidades da empreiteira. Discussões sobre normas e revisão normativa destacaram o risco de pleitos por aumento de custo caso seja imposta versão normativa posterior à vigente na licitação; ficou claro que a decisão sobre qual revisão aplicar compete aos contratantes (IFAG/Goinfra) e que é possível validar normas estrangeiras desde que cálculos comprovem a solução. Por fim, acordou-se que a certificadora prestará análises independentes e haverá consolidação técnica entre equipes para apoiar avaliações e respostas técnicas frente a executoras e para gerar evidências formais de descumprimentos contratuais.	
08/05/2026	A&M: Walter Schneider e Igor Ferreira CAEP: Alex Pineli IFAG: Sérgio Borges, Joberth Bernazzoli e Eliseu Garcia	Reunião de Governança IFAG e A&M - resumo ata: A reunião tratou de status de relatórios financeiros, validação de medições e alinhamento de governança de riscos para as obras do programa. Foram apresentados progresso em publicações visuais, atualização de portfólio e consolidação de relatórios contábeis, com importação de riscos na plataforma IRIS e geração de relatórios de situação. Nos controles financeiros, a equipe enfatizou a necessidade de formalização e rastreabilidade de pedidos, repasses e alterações (ex.: cronogramas, pedidos de repasse, lançamentos manuais de taxas e reembolsos). Foi debatida a preferência por comunicações por e-mail para reduzir erro humano, o uso do Drive como registro complementar e a sugestão de automatizar check-ins semanais (possível uso de IA) para registrar movimentações sem burocratizar.	
08/05/2026	IFAG: Sérgio Fonseca Manesco: Daniel Esteves, Ludmilla Ribeiro, Gabriel Schroeder, Antônio Gonçalves, Lucas Saraiva. CAEP: Alex Pineli	Reunião de Governança IFAG e Manesco: A reunião tratou da reprogramação do consórcio e da formalização da redistribuição de responsabilidades entre Goinfra, IFAG, consórcio e executoras, com foco em documentos que detalham status e fluxos. Foram discutidos prazos, necessidade de revisão interna e alinhamento antes de encaminhamentos formais. O consórcio informou que está elaborando dois documentos: um relatório de status das obras e contratos e outro detalhando fluxos e responsabilidades. Álvares & Marsal lideram a confecção desses documentos, que o consórcio pretende revisar internamente antes do envio ao IFAG; a previsão é que estejam prontos por volta de terça-feira, com ressalva sobre a necessidade de tempo para garantir qualidade e alinhamento prévio com a Goinfra.	

CAEP Controle de Reuniões			CAEP
Data	Participantes	Assuntos	
14/05/2026	Representantes CAEP: Dynatest, Bureau Veritas, Alvarez & Marsal e Manesco	Reunião de Governança CAEP - pauta: Ausência do Alex e transição de responsabilidades; Compartilhamento de documentos e fluxogramas; Debate técnico - plano de trabalho versus eventograma; Checkpoints, prioridades e alinhamento de fluxos; Documentos de contexto, histórico e prestação de contas; Advertência do IFAG e histórico com a CCL; Execução de bueiros sem armação e necessidade de avaliação técnica; Aceleração das obras, segurança e supervisão; Falta de cronogramas e impacto nas inspeções e certificação; Responsabilidades operacionais, certificação e uso da matriz RACI; Proposta de reunião para mapear programação e gaps; Detalhamento da apresentação por empreendimento; BV - Inspeção do cumprimento contratual e itens omissos.	
15/05/2026	Dynatest: Victor Castro CAEP: Edson Shimizu IFAG: Sérgio Borges e Eliseu Garcia	Reunião de Governança IFAG e Dynatest - resumo ata: A reunião tratou de alinhamentos operacionais e de governança contratual relacionados a projetos e obras, com foco em atrasos técnicos, necessidade de certificação e medidas documentais para mitigar riscos. Foram levantados riscos de execução e conformidade: avanço rápido da frente de terraplenagem pode levar ao atingimento de indicadores (50%) sem aval executivo, motivando proposta de emitir uma circular de alerta em vez de notificação imediata para criar documentação de acompanhamento; Edson comprometeu-se a tratar com o escritório Manesco e preparar minuta estrutural de circular. Na CCB existe risco de alteração de cronograma por pagamentos irregulares a projetistas, ausência de disciplinas básicas (geologia) e pendência de atualização de licença ambiental, o que coloca em alerta a necessidade de notificações formais caso ocorram intervenções em trechos não licenciados. Em gestão contratual e financeira, a equipe identificou ausência de mecanismo que vincule pagamento à certificação da obra (diferente do projeto, que tem evento de certificação no eventograma). Eliseu mencionou alternativas como doação da obra, certificação por medição e uso de cláusulas de seguro-garantia para retenção; Sérgio destacou que falta de certificação configura descumprimento contratual passível de multa e defendeu exigir certificação nas entregas e segurar pagamentos até conformidade. A equipe concordou sobre a necessidade de correção contratual e gestão robusta com evidências e notificações reiteradas para viabilizar ações administrativas futuras.	
15/05/2026	Bureau Veritas: Vinicius Coutinho e Ciro Sampaio CAEP: Edson Shimizu IFAG: Sérgio Borges e Eliseu Garcia	Reunião de Governança IFAG e BV - resumo ata: A reunião tratou do avanço de obras sem documentação executiva completa e do risco iminente de não certificação dos empreendimentos, com debate sobre responsabilidades contratuais, fiscalização e medidas punitivas. Participantes concordaram na necessidade de ação coordenada do consórcio e do IFAG para garantir conformidade documental e técnica. Houve consenso sobre conflito de autoridade entre Goinfra (pressão por entrega rápida) e IFAG (requisitos de certificação), com riscos de obras avançarem sem acompanhamento técnico. Foi discutida a entrada de segundo turno sem formalização. Medidas propostas incluíram emissão colaborativa de circular enumerando deficiências e alertando sobre penalidades, institucionalização de reuniões de acompanhamento com atas para evidenciar cobranças, criação de pontos focais por empresa para apoio a notificações, e formatação de apresentação/gráfico situacional do progresso por obra. Houve apoio à adoção de medidas punitivas graduais (notificação, advertência, multa, paralisação) caso documentação contratual não seja regularizada.	
15/05/2026	A&M: Walter Schneider e Igor Ferreira CAEP: Edson Shimizu IFAG: Sérgio Borges, Joberth Bernazzolli e Eliseu Garcia	Reunião de Governança IFAG e A&M - resumo ata: A reunião tratou da finalização da prestação de contas, da metodologia dos relatórios e dos riscos de execução financeira em obras, com foco nas divergências entre avanço físico e financeiro e na necessidade de controles e responsabilização das construtoras. Foi confirmada a postergação da publicação do acompanhamento visual para a semana do dia 18 devido às adequações nas prestações solicitadas pelo IFAG, sem prejuízo ao total mensal de publicações. Quanto a controles e ferramentas, Igor apresentou a intenção de produzir um one-page com controles macro para acompanhamento semanal, com protótipo previsto para a semana seguinte e participação da Dynatest e A&M. Eliseu sugeriu simplificar demonstração de avanço físico usando diagrama unifilar e dados de BI; propôs reunião com Edson e Igor para demonstrar a base integrada. Joberth pediu que relatórios e baselines indiquem versões para evidenciar a evolução documental.	
21/05/2026	Representantes CAEP: Dynatest, Bureau Veritas, Alvarez & Marsal e Manesco	Reunião de Governança CAEP - pauta: Apresentação da reunião com a GOINFRA e proposta de procedimento; Alinhamento operacional, minuta do circular e ênfase em certificação; Reposicionamento da certificação e organização de players; Suspensão dos FUPs com o IFAG; Pendências operacionais e prestação de contas do 1º trimestre; Reprogramação, aditivo do produto 2.4 e fluxogramas da RACI; Posicionamento da certificadora sobre não conformidade.	

- Análise do processo de medição do mês anterior - maio/2026 - 10ª medição.

A medição foi estruturada sob a lógica formal de avaliação por produto, com base em critérios previamente definidos pela fiscalização, os quais consideram, de forma ponderada, a qualidade do atendimento e da equipe técnica, a qualidade da documentação e dos relatórios, bem como a conformidade com os prazos, convertendo o resultado avaliativo em parâmetro de pagamento dos serviços efetivamente comprovados. Tal sistemática reforça a robustez do processo de medição, assegura transparência, uniformidade de critérios e maior segurança institucional quanto à regularidade da despesa.

QUADRO FINANCEIRO CONSOLIDADO — 10ª MEDIÇÃO					
Contrato n.º 01/2025 Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos – CAEP					
Data de Assinatura do Contrato: 10/07/2025 Vigência: 36 meses			Referência: 10ª Medição – Maio/2026		
Valor Total do Contrato	Valor Acumulado Medido	Valor da 10ª Medição	Saldo Contratual	% Acumulado Executado	Valor Inicial do Contrato
R\$ 21.912.482,34	R\$ 7.993.824,17	R\$ 538.089,55	R\$ 13.918.658,18	36,48%	R\$ 36.179.265,65

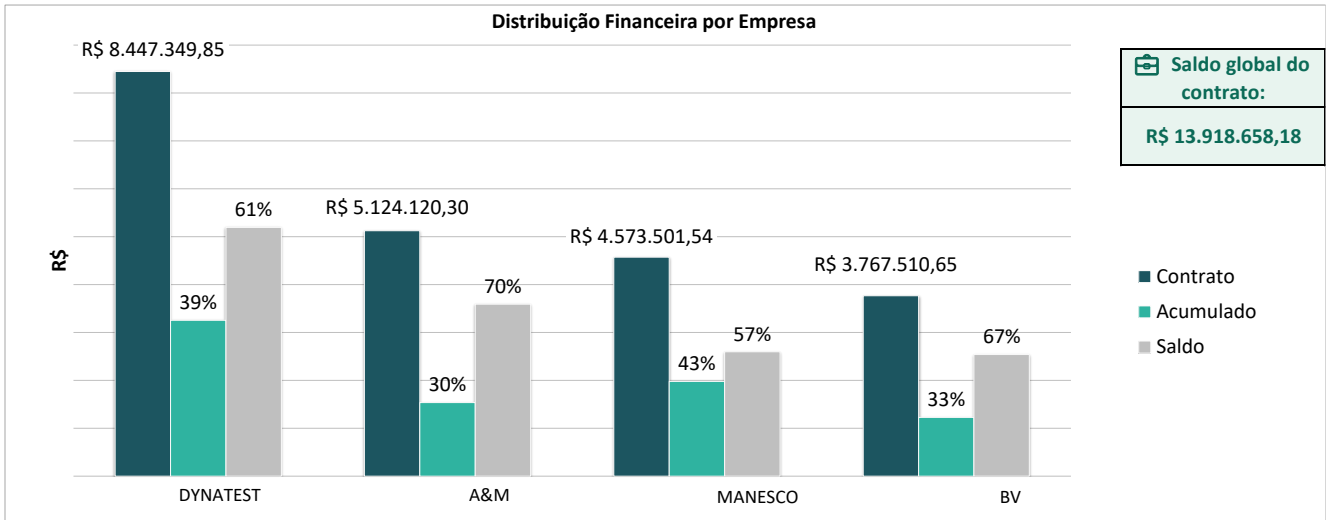

⚠ OBSERVAÇÃO SOBRE ADITIVO CONTRATUAL
Os valores apresentados a partir da 7ª medição consideram a readequação dos preços e quantitativos proposto na minuta do termo aditivo contratual.

• Pago	• Processado	• Em análise	• Não faturado
--------	--------------	--------------	----------------

RESUMO FINANCEIRO POR EMPRESA — 10ª MEDIÇÃO						
Empresa	Valor Mês	Valor Acumulado	Valor Contrato	% Executado	Saldo	Status
DYNA	R\$ 221.476,39	R\$ 3.253.213,50	R\$ 8.447.349,85	38,51%	R\$ 5.194.136,35	Processado
A&M	R\$ 112.199,28	R\$ 1.535.047,06	R\$ 5.124.120,30	29,96%	R\$ 3.589.073,24	Processado
MANESCO	R\$ 83.147,47	R\$ 1.978.281,31	R\$ 4.573.501,54	43,26%	R\$ 2.595.220,23	Processado
BV	R\$ 121.266,41	R\$ 1.227.282,30	R\$ 3.767.510,65	32,58%	R\$ 2.540.228,35	Processado
TOTAL	R\$ 538.089,55	R\$ 7.993.824,17	R\$ 21.912.482,34	36,48%	R\$ 13.918.658,18	

Sob a perspectiva físico-financeira, a 10ª medição totaliza R\$ 538.089,55, elevando o montante acumulado medido para R\$ 7.993.824,17, frente ao valor global contratual de R\$ 21.912.482,34, o que corresponde a 36,48% de execução acumulada do contrato.

RESUMO FINANCEIRO POR EMPRESA — 10ª MEDIÇÃO				
Contrato n.º 01/2025 CAEP Referência: Maio/2026				
Empresa	Valor Mês	Valor Acumulado	% Executado	Saldo Contratual
DYNA	R\$ 221.476,39	R\$ 3.253.213,50	38,51%	R\$ 5.194.136,35
A&M	R\$ 112.199,28	R\$ 1.535.047,06	29,96%	R\$ 3.589.073,24
MANESCO	R\$ 83.147,47	R\$ 1.978.281,31	43,26%	R\$ 2.595.220,23
BV	R\$ 121.266,41	R\$ 1.227.282,30	32,58%	R\$ 2.540.228,35
TOTAL	R\$ 538.089,55	R\$ 7.993.824,17	36,48%	R\$ 13.918.658,18

No que se refere ao desempenho técnico das entregas reconhecidas na competência, verifica-se que os produtos efetivamente medidos foram recebidos com **avaliação integral para fins de pagamento**, não havendo, no conjunto dos itens faturados na **10ª medição**, ocorrência de redutor financeiro aplicado por insuficiência técnica da entrega. Os produtos medidos no período foram expressamente registrados com **nota avaliativa de 100,00%**, a exemplo dos Produtos 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 5.1 e 5.3, evidenciando aderência ao escopo contratual, suficiência documental e regularidade para reconhecimento financeiro na competência. Registra-se, ainda, que o **Produto 1.3 - Comunicação Social** permaneceu sem medição, em consonância com a lógica de supressão já refletida na planilha financeira, ao passo que outros produtos sem fato gerador ou sem materialidade de medição no período também não repercutiram financeiramente. Do ponto de vista financeiro e de governança da medição, o conjunto dos itens reconhecidos demonstra conformidade satisfatória, sem indicativo de glosa técnica ou de necessidade de adoção de redutor sobre os valores medidos no período.

BASE TÉCNICA - PLANILHA DE MEDIÇÃO IFAG (10ª MEDIÇÃO)									
ID	Produto	Unidade	Valor Unit.	Valor Contrato	% Acum.	Qntd.	Valor Final	Valor Acum.	Empresa
1.1	COORDENAÇÃO GERAL	MENSAL	R\$ 59.212,49	R\$ 2.095.854,28	34,43%	1,00	R\$ 59.212,49	R\$ 674.754,55	DYNA
1.2	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	MENSAL	R\$ 8.503,60	R\$ 615.391,05	73,41%	1,00	R\$ 8.503,60	R\$ 411.304,65	DYNA
1.3	COMUNICAÇÃO SOCIAL	MENSAL	R\$ 28.778,99	R\$ 180.720,54	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 180.720,54	A&M
1.4	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	MENSAL	R\$ 23.940,25	R\$ 872.086,22	36,59%	1,00	R\$ 23.940,25	R\$ 297.520,22	A&M
2.1	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	MENSAL	R\$ 58.407,02	R\$ 2.001.747,91	31,93%	1,00	R\$ 58.407,02	R\$ 599.979,51	DYNA
2.2	ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	POR OBRA	R\$ 116.110,78	R\$ 851.091,98	36,15%		R\$ 0,00	R\$ 307.693,53	DYNA
2.3	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LIC	POR OBRA		R\$ 109.380,60	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 109.380,60	DYNA
2.4	GERENCIAMENTO TÉCNICO	OBRA x MÊS	R\$ 23.838,32	R\$ 2.288.478,72	32,99%	4,00	R\$ 95.353,28	R\$ 702.076,67	DYNA
2.5	RECEBIMENTO DE OBRA	POR OBRA	R\$ 9.345,33	R\$ 37.381,32	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	DYNA
2.6	LICENÇA AMBIENTAL	POR OBRA		R\$ 448.023,99	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 448.023,99	DYNA
3.1	RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	MENSAL	R\$ 47.233,29	R\$ 1.775.628,33	38,89%	1,00	R\$ 47.233,29	R\$ 642.029,26	BV
3.2	PLANOS DE INSPEÇÃO	POR OBRA		R\$ 159.562,60	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 159.562,60	BV
3.3	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	OBRA x MÊS	R\$ 18.508,28	R\$ 1.832.319,72	24,15%	4,00	R\$ 74.033,12	R\$ 425.690,44	BV
4.1	REPORTE DO PORTFÓLIO	MENSAL	R\$ 73.357,00	R\$ 2.630.004,74	35,40%	1,00	R\$ 73.357,00	R\$ 869.436,74	A&M
4.2	CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	OBRA x MÊS	R\$ 9.418,33	R\$ 866.486,36	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	A&M
4.3	GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	MENSAL	R\$ 14.902,03	R\$ 574.822,43	34,82%	1,00	R\$ 14.902,03	R\$ 187.369,55	A&M
5.1	ASSESSORIA JURÍDICA CONTÍNUA	MENSAL	R\$ 30.672,92	R\$ 1.141.600,88	38,17%	1,00	R\$ 30.672,92	R\$ 405.450,80	MANESCO
5.2	ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	POR OBRA		R\$ 557.270,70	100,00%		R\$ 0,00	R\$ 557.270,70	MANESCO
5.3	RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	MENSAL	R\$ 52.474,55	R\$ 1.953.025,63	38,17%	1,00	R\$ 52.474,55	R\$ 693.636,43	MANESCO
5.4	CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	MENSAL	R\$ 66.631,22	R\$ 921.604,33	37,70%		R\$ 0,00	R\$ 321.923,38	MANESCO

Nesse sentido, registra-se que, no universo dos produtos avaliados na **10ª medição**, tendo em vista as notas de avaliação obtidas, **não houve necessidade de apresentação de plano de ação corretivo**. Tal conclusão decorre do fato de que todos os produtos efetivamente avaliados na competência foram reconhecidos com desempenho integral para fins de medição, preservando-se, assim, a regularidade do fluxo contratual e a continuidade da execução nos ciclos subsequentes.

Por fim, apresenta-se o acompanhamento financeiro das medições do **CAEP** até o mês anterior:

LINHA DO TEMPO DE MEDIÇÕES — STATUS FINANCEIRO						
Contrato n.º 01/2025 CAEP Medições 1 a 10						
	● Pago	● Processado	● Em análise			
Empresa	MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO 2	MEDIÇÃO 3	MEDIÇÃO 4	MEDIÇÃO 5	
Empresa	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	
DYNA	R\$ 312.192,07	R\$ 389.743,01	R\$ 739.212,32	R\$ 270.833,58	R\$ 373.090,29	
A&M	R\$ 133.535,85	R\$ 200.293,76	R\$ 200.293,76	R\$ 122.760,04	R\$ 200.293,75	
MANESCO	R\$ 274.536,70	R\$ 285.876,79	R\$ 406.518,01	R\$ 114.510,63	R\$ 224.791,05	
BV	R\$ 58.320,94	R\$ 127.367,69	R\$ 118.619,99	R\$ 93.505,33	R\$ 182.892,53	
TOTAL	R\$ 778.585,56	R\$ 1.003.281,25	R\$ 1.464.644,08	R\$ 601.609,58	R\$ 981.067,62	

LINHA DO TEMPO DE MEDIÇÕES — STATUS FINANCEIRO					
Contrato n.º 01/2025 CAEP Medições 1 a 10					
● Pago ● Processado ● Em análise					
Empresa	MEDIÇÃO 6	MEDIÇÃO 7	MEDIÇÃO 8	MEDIÇÃO 9	MEDIÇÃO 10
Empresa	Pago	Pago	Pago	Pago	Processado
DYNA	R\$ 319.147,94	R\$ 184.565,14	R\$ 221.476,39	R\$ 221.476,39	R\$ 221.476,39
A&M	R\$ 200.293,76	R\$ 140.978,27	R\$ 112.199,28	R\$ 112.199,28	R\$ 112.199,28
MANESCO	R\$ 272.827,03	R\$ 83.147,47	R\$ 83.147,47	R\$ 149.778,69	R\$ 83.147,47
BV	R\$ 161.510,16	R\$ 121.266,41	R\$ 121.266,41	R\$ 121.266,41	R\$ 121.266,41
TOTAL	R\$ 953.778,89	R\$ 529.957,29	R\$ 538.089,55	R\$ 604.720,77	R\$ 538.089,55

2.2 Produto 1.2 – Relatório de Relações Institucionais

2.2.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.2, referente ao Relatório de Relações Institucionais, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório detalhado que descreve atividades realizadas no período em atendimento às diversas interrelações institucionais necessárias à boa execução do portfólio. Deverá contemplar no mínimo:

- *Relatório de Relacionamento Institucional: relatório que descreve a interação entre as diversas áreas do projeto, garantindo que o trabalho de cada setor (engenharia, certificação, contabilidade e jurídico) esteja alinhado e coordenado. Este relatório monitorará a integração dos processos e identificará oportunidades de integração entre as atividades.”*

2.2.2 Produtos desenvolvidos no período

- Integração Institucional e Consolidação de Processos executados em maio.

Durante o mês de maio, o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP) manteve agenda contínua de reuniões técnicas e de alinhamento operacional voltadas ao acompanhamento da execução das obras, à análise de projetos, medições e certificações, bem como à consolidação dos mecanismos de governança necessários ao monitoramento dos empreendimentos vinculados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA. As agendas envolveram representantes do próprio CAEP, das equipes técnicas da Dynatest, da Alvarez & Marsal, da Bureau Veritas, do Instituto para Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (IFAG), da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) e da assessoria jurídica da Manesco.

As pautas desenvolvidas ao longo do mês concentraram-se na estruturação dos fluxos de governança, na definição de responsabilidades institucionais e na consolidação de instrumentos de controle voltados ao acompanhamento das obras. Destacaram-se discussões relacionadas à elaboração de matrizes de responsabilidades, modelos de governança, fluxogramas operacionais, registros históricos dos empreendimentos e mecanismos de comunicação institucional, visando fortalecer a coordenação entre os diversos agentes envolvidos e aprimorar a rastreabilidade das decisões e dos processos.

As reuniões de alinhamento com a equipe da Dynatest concentraram-se na avaliação do andamento dos projetos e das obras, com destaque para os estudos geotécnicos, projetos geométricos, drenagem, desapropriações e licenciamento ambiental. Foram discutidas inconsistências em ensaios e documentos técnicos, impactos dessas restrições na certificação dos empreendimentos e riscos associados à execução de serviços sem aprovação definitiva dos projetos. Também foram abordadas questões relacionadas à rastreabilidade das informações de campo, controle tecnológico, documentação de medições e necessidade de reforço dos mecanismos de acompanhamento e fiscalização das obras.

No âmbito técnico e contratual, as agendas com a Bureau Veritas e a Manesco aprofundaram as discussões sobre conformidade normativa, responsabilidades das executoras, certificação de obras e interpretação dos instrumentos contratuais aplicáveis. Foram analisadas não conformidades identificadas em obras de drenagem e bueiros, riscos decorrentes da execução baseada em anteprojetos e a necessidade de alinhamento entre requisitos técnicos, jurídicos e financeiros para garantir maior segurança aos processos de medição, certificação e pagamento. Também foram debatidos procedimentos para emissão de notificações, tratamento de inconformidades e definição de responsabilidades em casos de descumprimento contratual.

As reuniões com a Alvarez & Marsal concentraram-se na estruturação dos processos de prestação de contas, na consolidação dos relatórios financeiros e na construção dos instrumentos de governança corporativa do consórcio. Também foram discutidas melhorias nos sistemas de acompanhamento gerencial, incluindo ferramentas visuais de controle, consolidação de bases de dados e preparação de materiais para atendimento aos órgãos de controle e demais stakeholders do programa.

Em paralelo, reuniões conjuntas entre CAEP, IFAG e GOINFRA trataram do status dos projetos executivos, das condicionantes para liberação de frentes de serviço e das pendências administrativas relacionadas à prestação de contas e à prorrogação contratual. As discussões evidenciaram a relevância dos estudos geotécnicos como principal fator condicionante para o avanço das disciplinas subsequentes e para a certificação das obras, bem como a necessidade de adequação documental para viabilizar medições, repasses financeiros e continuidade dos empreendimentos. Também foram debatidos mecanismos para utilização de aprovações com ressalvas, repactuação de cronogramas e mitigação dos impactos decorrentes de atrasos na entrega de projetos.

Em síntese, maio foi marcado pelo fortalecimento dos instrumentos de governança, pela intensificação do acompanhamento técnico dos projetos e pela consolidação dos processos de certificação, medição e prestação de contas. As atividades realizadas reforçaram a integração institucional entre os diversos agentes envolvidos, ampliaram a capacidade de monitoramento dos riscos associados aos empreendimentos e contribuíram para o aprimoramento dos mecanismos de controle, transparência e rastreabilidade adotados pelo CAEP no âmbito do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA.

Destaca-se, adicionalmente, que, embora tenha sido apontada, no âmbito da análise da 2ª prestação de contas, a necessidade de inclusão das atas completas das reuniões realizadas, optou-se, neste produto, pela apresentação consolidada das informações em formato de síntese técnica. Tal diretriz decorre da necessidade de assegurar maior confiabilidade na consolidação dos temas tratados, compatibilização entre os diversos stakeholders envolvidos e padronização das informações apresentadas. A apresentação estruturada em planilha, contendo datas, participantes e assuntos, permite adequada rastreabilidade das atividades executadas, bem como melhor visualização da evolução temporal das ações, garantindo transparência, objetividade e aderência às diretrizes de governança do programa.

Data	Participantes	Assuntos
05/05/2026	Dynatest: Guilherme Soares, Luiz Henrique Costa, Josiley Prado, Edson Shimizu, Victor Castro, Alvaro Laquis, Emine Lauara, Lara Cristina CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/Dynatest - resumo ata: A reunião teve como objetivo revisar o status técnico e operacional dos projetos e da obra Caiapó, tratar pendências de geotecnia, geométrico, drenagem, OAE, licenciamento ambiental e fechamento de medições, além de alinhar responsáveis e registros no BI. A equipe confirmou atualização do BI e relatou avanço de obra com cerca de 20 km atacados e aproximadamente 14 bueiros em execução. No âmbito ambiental houve pendência de licença travada na SEMA, orientação de contato com a consultora responsável pela licença anterior para retificação e determinação de que a executora registre boletim de ocorrência em casos de furto como documentação. Em medições e controles, a equipe avalia os eventogramas e medição da Coplan, foi indicada repactuação de prazos para a primeira semana de junho por restrições de geotecnia e desapropriação, e estabeleceu-se prazo para envio de documentos escaneados até dia 8, com transição para diários digitais e necessidade de correção de itens do anteprojeto.
06/05/2026	Representantes CAEP - Dynatest, Bureau Veritas, Alvarez & Marsal e Manesco	Reunião de Alinhamento CAEP - resumo ata: A reunião tratou da necessidade de estruturar governança, confeccionar relatórios formais sobre o histórico e riscos contratuais e decidir a estratégia de comunicação pública e institucional. Foi acordado produzir dois documentos básicos: um detalhando papéis e responsabilidades (até nível das construtoras) e outro narrando o histórico de execução contratual com riscos e justificativas. Sobre governança, o grupo propôs formalizar um PMO ou modelo de governança com definição de papéis, periodicidade de reuniões, um gerente de projetos responsável por acompanhamento e cobrança, além de painéis e reports gerenciais para as quatro obras em curso. Ficou definido que o escopo inicial do documento de papéis será restrito a quatro stakeholders (Goinfra, IFAG, CAEP e executoras), e que ajustes internos do consórcio serão tratados posteriormente.
06/05/2026	Manesco: Gabriel Schroeder e Antônio Gonçalves BV: Ciro Sampaio CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/Maesco/BV - resumo ata: A reunião examinou a medição do 1º trimestre focada em divergências na execução de 23 bueiros, com apenas dois itens lançados no trimestre e pressão por desbloqueio de pagamento frente a questionamentos de conformidade normativa. Técnica e juridicamente concluiu-se que a aferição da conformidade deve considerar o anteprojeto e as normas aplicáveis, não apenas o orçamento; por isso há entendimento predominante de que a execução ocorreu em desconformidade normativa. Foi relatado desgaste com a executora e disputa interpretativa sobre qual norma aplicar; existe anteprojeto sem detalhamento de armação e o orçamento não contemplou essa exigência, gerando debate sobre responsabilidade contratual e risco do executor.
11/05/2026	A&M: Walter Schneider e Igor Ferreira CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/A&M - resumo ata: A reunião tratou da revisão do book de governança e da estruturação de três documentos centrais para apresentação à Dra. Eliana e para organizar as quatro empresas do consórcio. Foi definido foco na priorização do documento de responsabilidades (RACI) e na integração de contribuições técnicas e contratuais antes da entrega final estimada até quinta-feira.
11/05/2026	Dynatest: Edson Shimizu e Victor Castro CAEP: Alex Pineli	Reunião de Alinhamento CAEP/Dynatest - resumo ata: A reunião tratou de inconsistências nos ensaios geotécnicos da CCL, riscos contratuais relacionados a pedreiras e da necessidade de criar macrofluxos para engenharia e financeiro. Foram discutidos problemas de qualidade de dados que comprometem projeto e execução e a interface entre projetos, certificação e prestação de contas. No âmbito contratual, a substituição de pedreira foi colocada como risco do contratado e deverá ser alinhada com Armando e Sérgio devido a possíveis pleitos. Também foram mencionadas evidências de autorização de exploração dos areais e necessidade eventual de acompanhamento técnico em campo para confirmar volumes e permissões.

Data	Participantes	Assuntos
12/05/2026	Dynatest: Guilherme Soares, Luiz Henrique Costa, Josiley Prado, Victor Castro, Alvaro Laquis, Emine Lauara, Lara Cristina CAEP: Edson Shimizu	Reunião de Alinhamento CAEP/Dynatest - resumo ata: A reunião tratou da aprovação técnica de bueiros, liberação de frentes e status de medições e pagamentos, com foco em documentação, conformidade e continuidade de obras. Sobre aprovação técnica, foi definido que os bueiros nas dimensões e locais aprovados podem ser liberados porém dependem de acompanhamento do IFAG porque faltam memória de cálculo, notas de serviço e quadro de quantidades; discutiu-se uso restrito de "aprovação com ressalvas". Decidiu-se registrar medições como provisórias quando houver alteração e exigir projeto executivo com justificativa assinada pelo projetista para quaisquer mudanças de armadura, sob risco de refazimento pela executora. Estado das frentes e produção: Caiapó com aproximadamente 17–20 km de terraplenagem em ataque, com faltas pontuais de um ou dois bueiros; retomada de serviços na CCL e outras frentes está lenta, execução limitada a complementos de bueiros e passagens de fauna, equipamentos parcialmente desmobilizados e risco de retrabalho em frentes já abertas.
13/05/2026	A&M: Walter Schneider e Igor Ferreira CAEP: Edson Shimizu	Reunião de Alinhamento CAEP/A&M - resumo ata: A reunião tratou da apresentação e revisão de dois documentos para a nova governança: uma matriz de responsabilidades (matriz RACI) e um histórico/excel de execução contratual e medições financeiras, com foco em consolidar internamente antes de encaminhar à Goinfra e IFAG.
14/05/2026	IFAG: Sérgio Fonseca, Joberth Junior e Eliseu Garcia GOINFRA: Alessandra Carvalho, Rafael Coutinho, Felipe Martins. CAEP: Edson Shimizu e Walter Schneider	Reunião de Alinhamento GOINFRA + IFAG + CAEP - resumo: A reunião tratou do estado de análise e aprovação de projetos executivos, condicionantes para liberação de frentes de serviço e pendências administrativas relativas à prestação de contas e prorrogação do termo contratual. Foi reiterado o fluxo de análise em dois níveis (documental e técnico) e identificado o estudo geotécnico como principal restrição que condiciona terraplenagem, hidrologia e pavimentação. Status por empreendimento: Caiapó tem 4 de 14 projetos entregues, com pendências geotécnicas e correções do geômetro; parte geométrica recebeu parecer extraoficial. A CCL/Trafecon possui 12 disciplinas, 8 já entregues e duas pré-aprovadas (geometria e drenagem); mesmo sem geotecnia totalmente aprovada, retomou drenagem e OACs em campo. Coplan/Engessur entregou 4 de 12 disciplinas e apresenta postura de cumprimento do rito. A CCB (Influência) apresenta projetos de baixa qualidade e atrasos, já notificada; iniciou turno noturno sem comunicar, motivando alocação de fiscalização noturna com apoio da Dynatest. Execução de obras: frentes de terraplenagem da Caiapó avançam em trechos com orientação de não executar camadas finais sem projeto aprovado; drenagem e OACs estão sendo executadas com base em anteprojeto, registradas em diário de obra e sujeitas a refazimento caso o executivo imponha alterações. Houve debate sobre interpretação do TAG: entendimento prévio permitia avanço até 50% com anteprojeto; coordenação e fiscalização enfatizam que avanço só deve ocorrer com alta aderência entre anteprojeto e projeto executivo para mitigar risco. Administrativo e financeiro: consignadas pendências na prestação de contas anual e trimestral, com envio de documentação e notas técnicas para justificar ressalvas. O consórcio pediu dilação de prazo para reprogramação (pedido de 10 dias úteis); a coordenação negociou prazo intermediário e pretende formalizar por ofício com evidências de notificação. A prorrogação do termo será feita por aditivo simples com justificativa técnica e jurídica.

Data	Participantes	Assuntos
19/05/2026	Dynatest: Guilherme Soares, Luiz Henrique Costa, Josiley Prado, Victor Castro, Alvaro Laquis, Emine Lauara, Lara Cristina CAEP: Edson Shimizu	Reunião de Alinhamento CAEP/Dynatest - resumo ata: A reunião tratou de problemas de rastreabilidade de informações geotécnicas, regras para medições e o papel da certificação nas obras. Foram discutidos inconsistências entre fotos de campo, boletins de sondagem e resultados laboratoriais, condicionando aprovação geotécnica à resolução desses problemas. Foi definida política rígida para não conformidades: tratar obras/entregas afetadas como evento único, exigir refazimento integral das partes não conformes e cronograma de execução, sem medições ou pagamentos parciais. A certificadora posicionada como agente contratual integrado, não burocrático; porém necessita de documentação detalhada de campo (cronograma executivo, histórico de materiais, programação semanal) porque trabalha por amostragem. Para alinhamento operacional será convocado um workshop geral com executoras, projetistas, controle tecnológico e certificação. Operação noturna e controle de turnos foram tema crítico: a certificadora não foi informada sobre trabalho em turno dobrado (contrato 147), gerando orientação para reorganização e coordenação intermediária de turnos para validar entregas noturnas.
25/05/2026	IFAG: Sérgio Fonseca, Joberth Junior e Eliseu Garcia GOINFRA: Alessandra Carvalho, Rafael Coutinho, Felipe Martins. CAEP: Edson Shimizu	Reunião de Alinhamento GOINFRA + IFAG + CAEP - resumo: A reunião tratou da proposta de supressão de escopo e do redesenho do gerenciamento técnico, da compatibilização jurídico-técnica para justificar aumentos de custo e das falhas documentais que travam repasses e medições. Foi apresentado que a supressão proposta implica redução proporcional de aproximadamente 48% entre empresas do CAEP e que a nova configuração técnica dimensiona equipe fixa por obra (engenheiro fiscal pleno + técnico), apoio adicional e engenheiro ambiental compartilhado. Debate sobre turno noturno: O Estado apoia turnos extras para cumprir cronograma, mas exigiu demonstração de vantagem frente ao custo e lembrou limite de 10% em obras e ausência de regra equivalente para a estruturadora. Optou-se por ampliar quantidades no produto 2.4 em vez de criar novo item. Foram relatadas insuficiência e discrepâncias na documentação de prestação de contas: registros de controle tecnológico ausentes, diários de obra incompletos, fotos faltantes, digitalizações inconsistentes e divergências entre medições, notas fiscais e relatórios. Essas pendências estão bloqueando repasses e provocando pedidos de adiantamento não atendidos. O CAEP afirma já ter enviado documentos pendentes e pretende corrigir deficiências. Foram confirmados repactuação de prazos de projetistas e executoras majoritariamente para a segunda quinzena de junho, uso de aprovações com ressalvas para não travar frentes e esforços intensivos na mitigação do crítico estudo geotécnico da CCL. Persistem riscos de perda de frentes por chuvas e questionamentos de fiscalização. A reunião terminou com confirmação de manter encontro subsequente na quinta e agradecimentos.

CAEP | Controle de Reuniões



Data	Participantes	Assuntos
28/05/2026	A&M: Walter Schneider, Gabrielle Rocha e Igor Ferreira Dynatest: Victor Castro CAEP: Edson Shimizu	Reunião de Alinhamento CAEP/Dyna/A&M - resumo ata: A reunião tratou da evolução do OnePage/BI de acompanhamento de ordens e contratos, da padronização de métricas físicas e financeiras e do desenho de governança do consórcio, com necessidade de respostas formais ao Ministério Público e preparação de workshop com executoras. Sobre o OnePage/BI, definiu-se apresentação inicial em PowerPoint com objetivo de automação futura; melhorias de visualização foram priorizadas (legenda, destaque de trechos não atacados, espessura do traçado GIS, compactação do cabeçalho para abrir espaço para status e gráficos). O mapa Plum Page deve incluir duas métricas de avanço físico: "concluído" e "concluído + atacado", além de blocos sintéticos (percentual, data programada, data reprogramada e comentário). Igor ficou responsável por compartilhar demonstrativo unifilar existente e ajustar integração com eventograma financeiro. Sobre métricas e cálculo de avanço, confirmou-se que o eventograma financeiro tem sido usado como base do peso para o avanço físico (percentual global exemplificado em 3,66), mas há necessidade de padronizar regras, granularidade e registrar fontes formais de dados. Foi discutida a limitação do indicador "concluído + atacado" em superestimar avanço quando atacado não está concluído nem ensaiado; destacou-se que ensaios de controle tecnológico são entrada para medição financeira e podem reduzir valores no fechamento trimestral. Optou-se por priorizar atualização mensal para prestação de contas e manter apresentações semanais/one-sheet separadas. Também ficou definido que Álvarez montará a narrativa unificada do workshop e cada consorciada apresentará dores e evidências para compor storytelling.

2.3 Produto 1.3 – Relatório de Comunicação Integrada

2.3.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.3, referente ao Relatório de Comunicação Integrada, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório com o objetivo de garantir que as informações sobre o andamento dos projetos e obras de infraestrutura sejam comunicadas de forma transparente e acessível às partes interessadas, incluindo as comunidades locais, órgãos governamentais, parceiros privados e o público em geral. Deverá contemplar no mínimo:

- *Este relatório abordará estratégias e atividades desenvolvidas, em andamento e planejadas, que tem como objetivo transparência do relacionamento proativo, minimizando o impacto da elaboração de projeto e execução da obra e assegurar a adesão das comunidades aos projetos de infraestrutura.”*

2.3.1.1 Suspensão dos Serviços de Comunicação Integrada

Em virtude da supressão do Produto 1.3 (Comunicação Social) no âmbito do Contrato nº 01/2025 (CAEP–IFAG), devidamente formalizada mediante aditivo contratual, os serviços vinculados a este item foram encerrados de forma regular e definitiva. O IFAG adotou as medidas cabíveis para garantir a regularidade do processo, preservando o erário e assegurando a conformidade contratual. O e-mail de registro do tema, segue abaixo para fins de comprovação.




Figura 2 – Evidência da supressão do Produto 1.3.

2.3.1.2 Retomada do produto 1.3 a partir da Reprogramação do Contrato nº 01/2025

Na proposta encaminhada pelo CAEP em 23/12/2025, após solicitação de redução do valor contratual no patamar de 47,8% em razão da supressão das três obras, ficou definida a exclusão do Produto 1.3, dado que a atividade ficaria insustentável com a aplicação do referido desconto.

Entretanto, após solicitação da GOINFRA em reunião realizada em 25/05/2026, decidiu-se pela reintrodução do Produto 1.3 no escopo do consórcio a partir de julho de 2026, com a aplicação do valor original previsto no Contrato nº 01/2025.

2.4 Produto 1.4 – Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC)

2.4.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.4, referente ao Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC), é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório de todas as atividades de manutenção e desenvolvimento de plataforma integrada de gestão no âmbito do programa de gestão dos produtos, que consolida as atividades prestadas e apuração dos indicadores de apuração e desempenho.”

2.4.1.1 Publicação Rotineira do Pannel de Sala de Situação no Site do IFAG

No período de referência, as publicações do Pannel de Acompanhamento Visual foram realizadas de forma quinzenal, em conformidade com a estratégia estabelecida pelo IFAG e pelo CAEP, tendo sua divulgação oficial no site ocorrida nos dias 04/05/2026 e 25/05/2026.

Adicionalmente, foram realizadas publicações preliminares no dia 22/05/2026 e outras duas no próprio dia 25/05/2026. Em cada ciclo de atualização, o BI é inicialmente publicado em ambiente preliminar para avaliação e aprovação do IFAG. Um e-mail é encaminhado ao IFAG solicitando a aprovação formal e, após a manifestação favorável do órgão — formalizada via e-mail —, o pannel é publicado no site do IFAG. Segue abaixo evidências das aprovações do IFAG:



Ferreira, Igor

To: Adriano Silva de Faria <adriano.faria@ifag.org.br>

Cc: Eliseu Silva Garcia <eliseu.garcia@ifag.org.br>; +6 others

Adriano, boa tarde!

Obrigado pelo retorno! BI Publicado no site.

[Microsoft Power BI](#)

Quaisquer dúvidas ou considerações, me encontro à disposição.

Atenciosamente,

Igor Ferreira

Infra & Capital Projects

Alvarez & Marsal Brasil

Rua Surubim, 373 – 3º andar - Brooklin Novo


São Paulo, SP, Brasil, 04571-050

Mobile: +55 11 91087-0097

AlvarezandMarsal.com


Follow and connect with A&M:

[LinkedIn](#) | [Twitter](#) | [Facebook](#)



Mon 5/4/2026 1:04 PM

Figura 3 – Formalização da publicação da atualização da Sala de Situação/Plataforma Integrada.

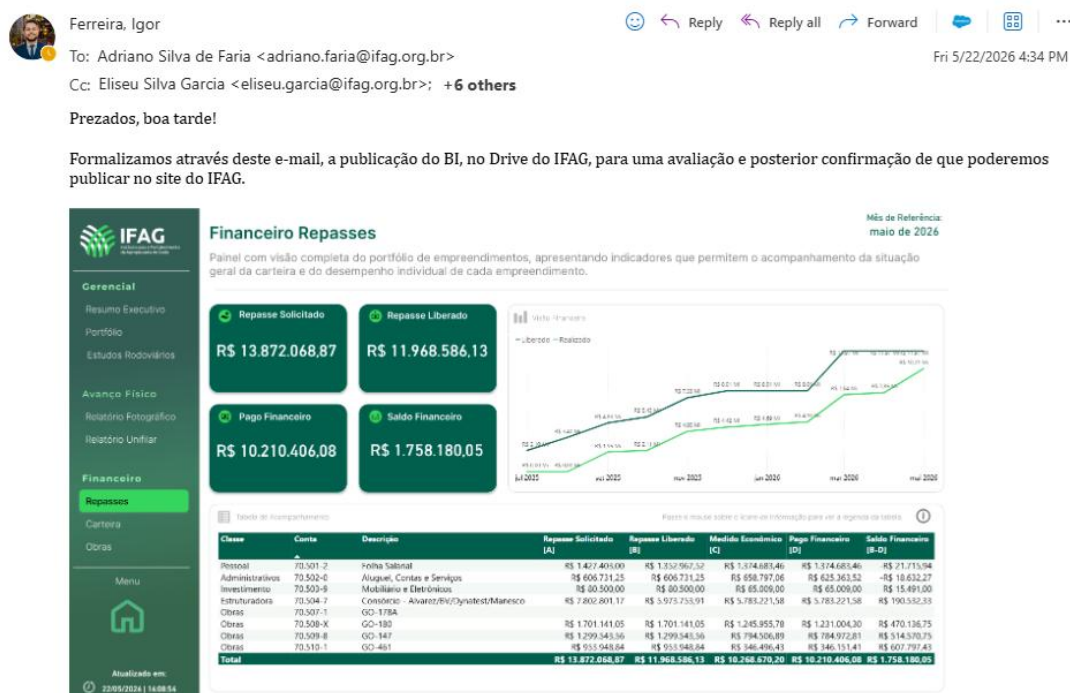

Link de acesso ao Drive com o link acessível ao BI para avaliação:

https://drive.google.com/drive/folders/1ubaSI14HB1gT1fPpFNqAf97VmmSXs-NC?usp=drive_link

Aguardamos confirmação formal de que podemos publicar no site do IFAG.

Quaisquer dúvidas ou considerações, me encontro à disposição.

Figura 4 – Formalização da publicação da atualização da Sala de Situação/Plataforma Integrada.




Figura 5 – Formalização da publicação da atualização da Sala de Situação/Plataforma Integrada.

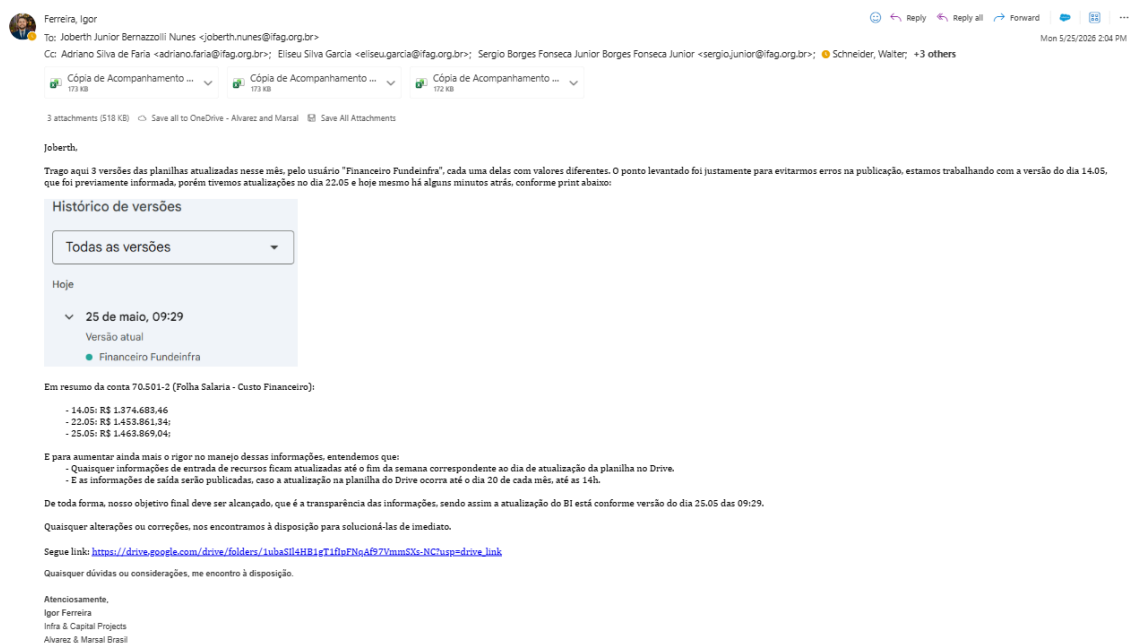


Figura 6 – Formalização da publicação da atualização da Sala de Situação/Plataforma Integrada.




Figura 7 – Formalização da publicação da atualização da Sala de Situação/Plataforma Integrada.

2.4.1.2 Painel de Avanço Físico e Unifilar

As publicações contemplam as principais rotinas de atualização do Portfólio e do Painel de Acompanhamento Visual, bem como dos painéis de Resumo Executivo e Unifilar.

- **Indicador de Avanço Físico da Obra:** Como estruturação de processos, e vinculado ao Produto 4.1 Gestão de Portfólio de Projetos, foram realizadas reuniões com o consórcio (CAEP) para definição dos pesos de ponderação do indicador de avanço físico global de cada obra. Com a aprovação dos eventogramas e a consolidação dessa metodologia, tornou-se possível estruturar um cálculo padronizado e consistente do avanço global por empreendimento, que vem sendo acompanhado mensalmente, através do monitoramento das atualizações dos unifilares e aprovações das medições.

Como resultado direto desse trabalho, e no âmbito do Produto 1.4, foi disponibilizado o painel de acompanhamento unifilar publicado no BI, atualizado mensalmente, que traduz de forma visual a evolução semanal das obras e a porcentagem de evolução global mensal, conforme representado no painel abaixo.

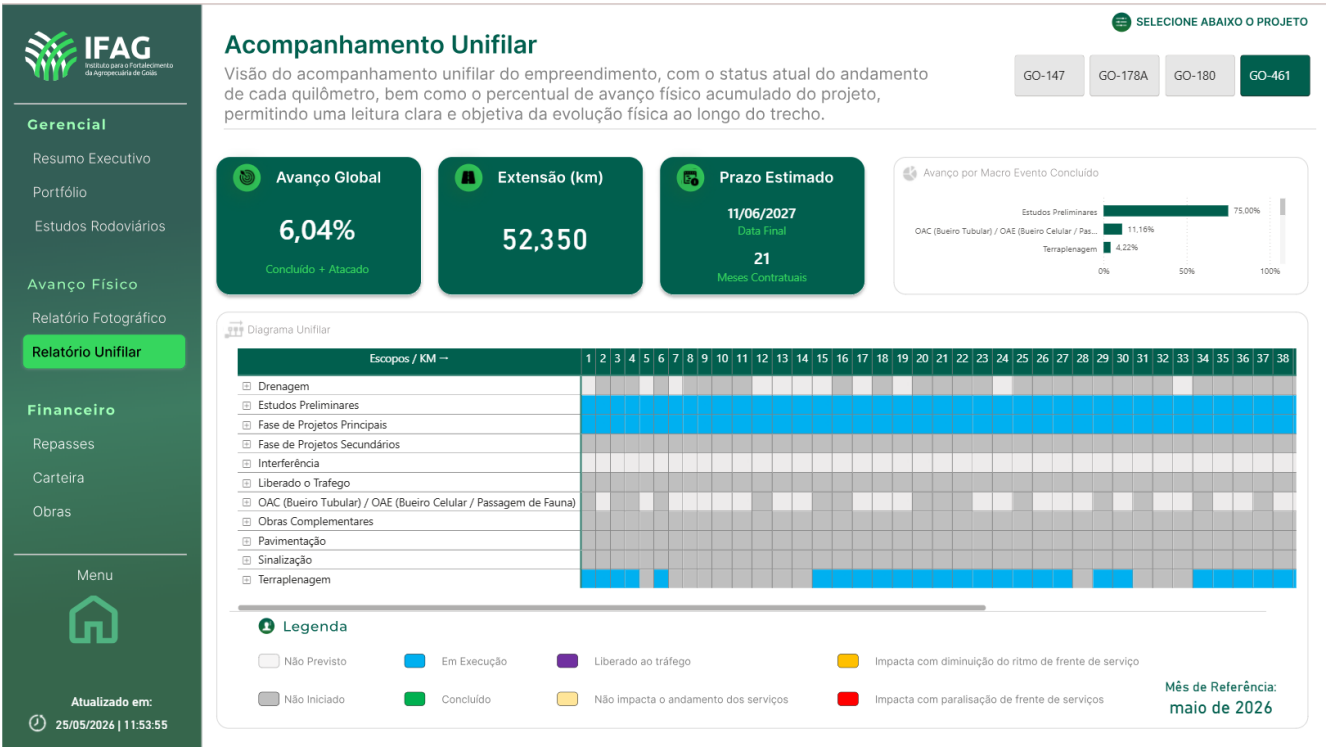


Figura 8 – Imagem ilustrativa da página de avanço físico e unifilar.

2.4.1.3 Atualização do Painel Resumo Executivo

Após a aprovação dos eventogramas pelo CAEP, o Painel Executivo passou por atualização rotineira dos dados já consolidados. A principal atualização foi a inclusão do mês de referência nos painéis de Resumo Executivo e Unifilar, com o objetivo de conferir maior clareza temporal às informações apresentadas. As demais atualizações realizadas correspondem à manutenção regular do painel, sem alterações estruturais ou inclusão de novos indicadores. Com a aprovação das medições e seus faturamentos, será incluída a visão financeira realizada por obra.

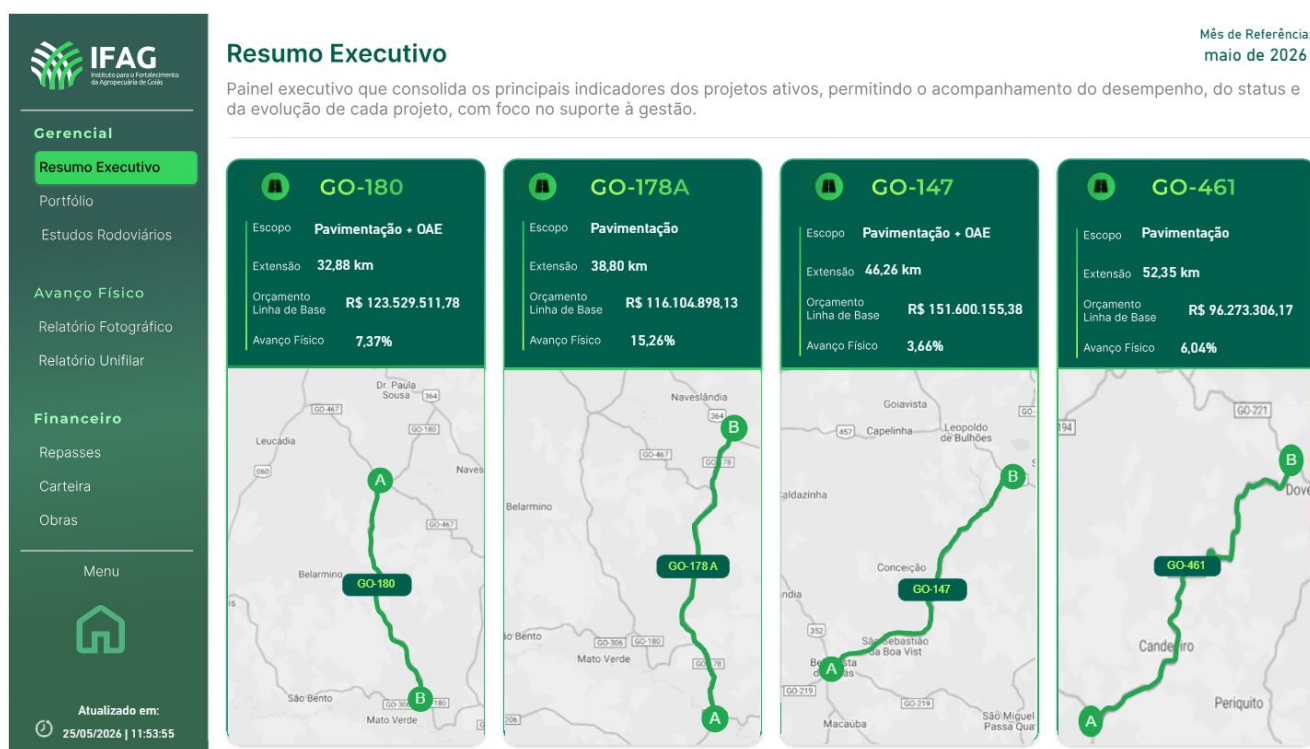


Figura 9 – Imagem ilustrativa da página de Resumo Executivo.

2.4.1.4 Atualização dos Painéis Financeiros

- **Painéis Financeiros:** No período em análise, foram realizadas atualizações nos painéis financeiros contemplando: (i) as solicitações de repasse à Estruturadora, formalizadas por meio do Ofício nº 170/2026, e à GO-178A, formalizadas por meio do Ofício nº 171/2026; (ii) as medições aprovadas e seus respectivos pagamentos referentes às obras GO-180, GO-147 e GO-461; e (iii) a atualização das informações de valores previstos em eventograma, após a aprovação do eventograma pelo CAEP. Essas atualizações visam refletir de forma mais fiel a evolução temporal das solicitações de repasse e do avanço fisco-financeiro das obras, contribuindo para a manutenção da base de dados atualizada e alinhada aos registros administrativos e técnicos do período. Ressalta-se que as alterações efetuadas tiveram caráter pontual e informativo, não implicando mudanças na estrutura, metodologia ou critérios de análise dos painéis financeiros, os quais permanecem consistentes com o padrão previamente estabelecido para o acompanhamento gerencial e institucional dos empreendimentos.



IFAG
Instituto para o Fortalecimento da Administração Pública

Gerencial

Resumo Executivo

Portfólio

Estudos Rodoviários

Avanço Físico

Relatório Fotográfico

Relatório Unifilar

Financeiro

Repasses

Carteira

Obras

Menu



Atualizado em:
25/05/2026 | 11:53:55

Financeiro Repasses

Mês de Referência:
maio de 2026

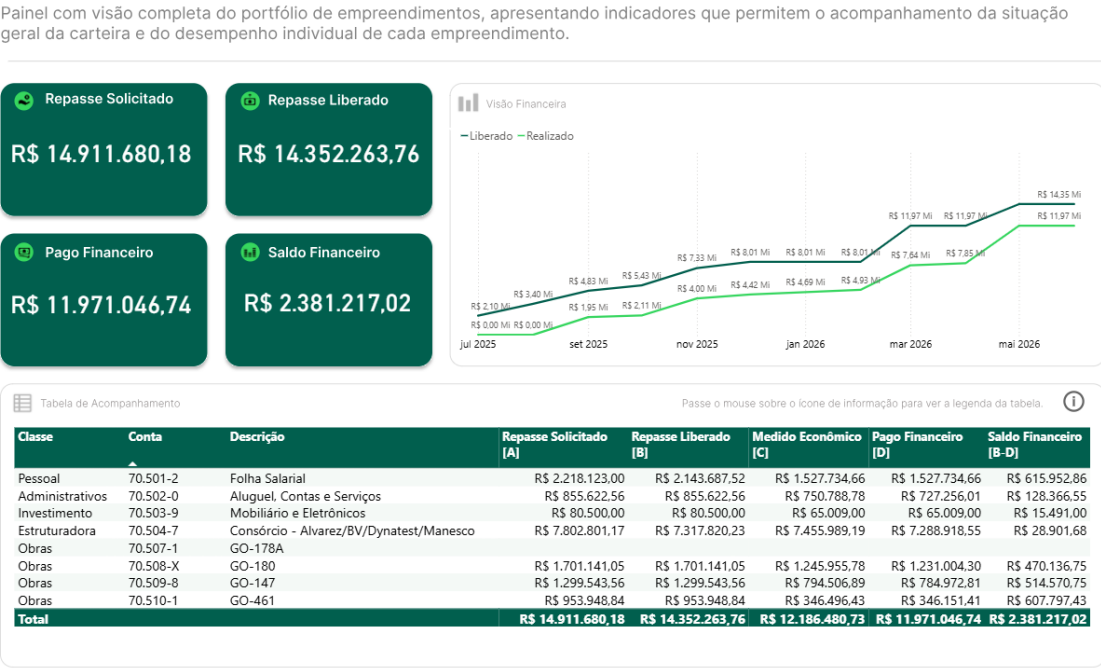


Figura 10 – Imagem ilustrativa da página Financeiro Repasses.



IFAG
Instituto para o Fortalecimento da Administração Pública

Gerencial

Resumo Executivo

Portfólio

Estudos Rodoviários

Avanço Físico

Relatório Fotográfico

Relatório Unifilar

Financeiro

Carteira

Obras

Menu



Atualizado em:
25/05/2026 | 11:53:55

Financeiro Carteira

Mês de Referência:
maio de 2026

UTILIZE OS FILTROS PARA EXPLORAR OS DADOS

LIMPAR FILTROS

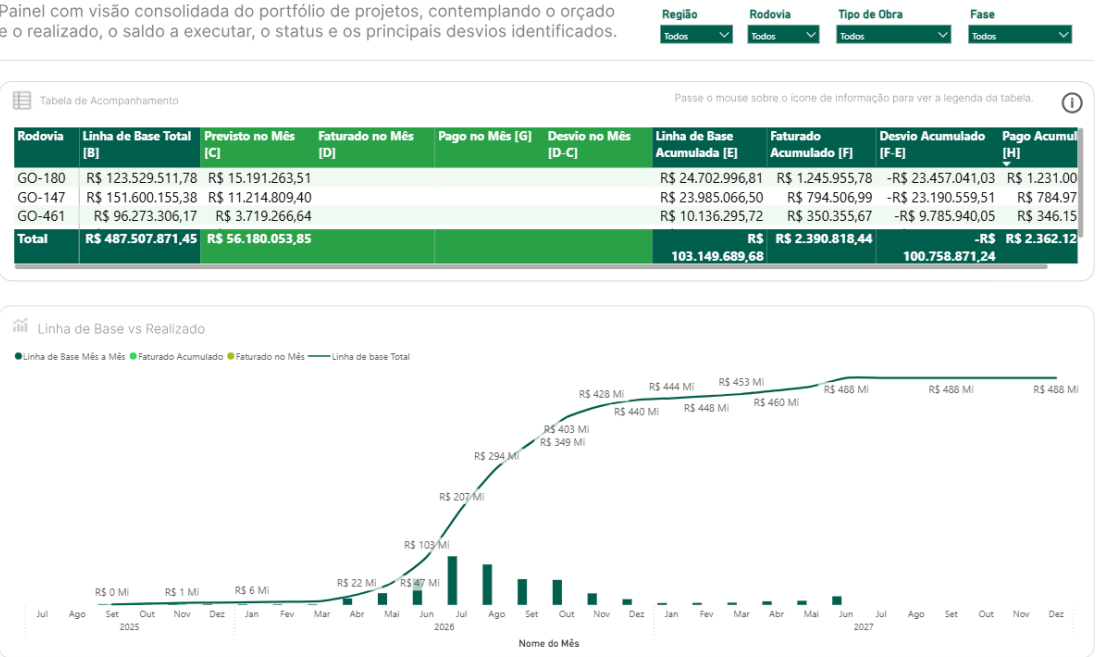


Figura 11 – Imagem ilustrativa da página Financeiro Carteira.



Figura 12 – Imagem ilustrativa da página Financeiro Obras.

- **Acompanhamento Visual:** No período de referência, o Painel de Acompanhamento Fotográfico passou por atualizações em diferentes momentos ao longo de maio, seguindo a dinâmica de publicações quinzenais. A divulgação oficial no site ocorreu nos dias 04/05/2026 e 25/05/2026.

Adicionalmente, foram realizadas atualizações em caráter preliminar no dia 22/05/2026 e outras duas no próprio dia 25/05/2026, destinadas à revisão, ajuste e validação das informações antes de sua consolidação final no painel. As imagens foram incorporadas de forma estruturada ao painel, possibilitando evidenciar a evolução das frentes de serviço e o progresso físico dos empreendimentos ao longo dos períodos analisados. As informações utilizadas têm como base os relatórios semanais de acompanhamento de obras, sendo consolidadas e disponibilizadas pelo CAEP, com atualização quinzenal e validação realizada pelo IFAG, assegurando a consistência, a confiabilidade e a rastreabilidade dos registros apresentados no painel.

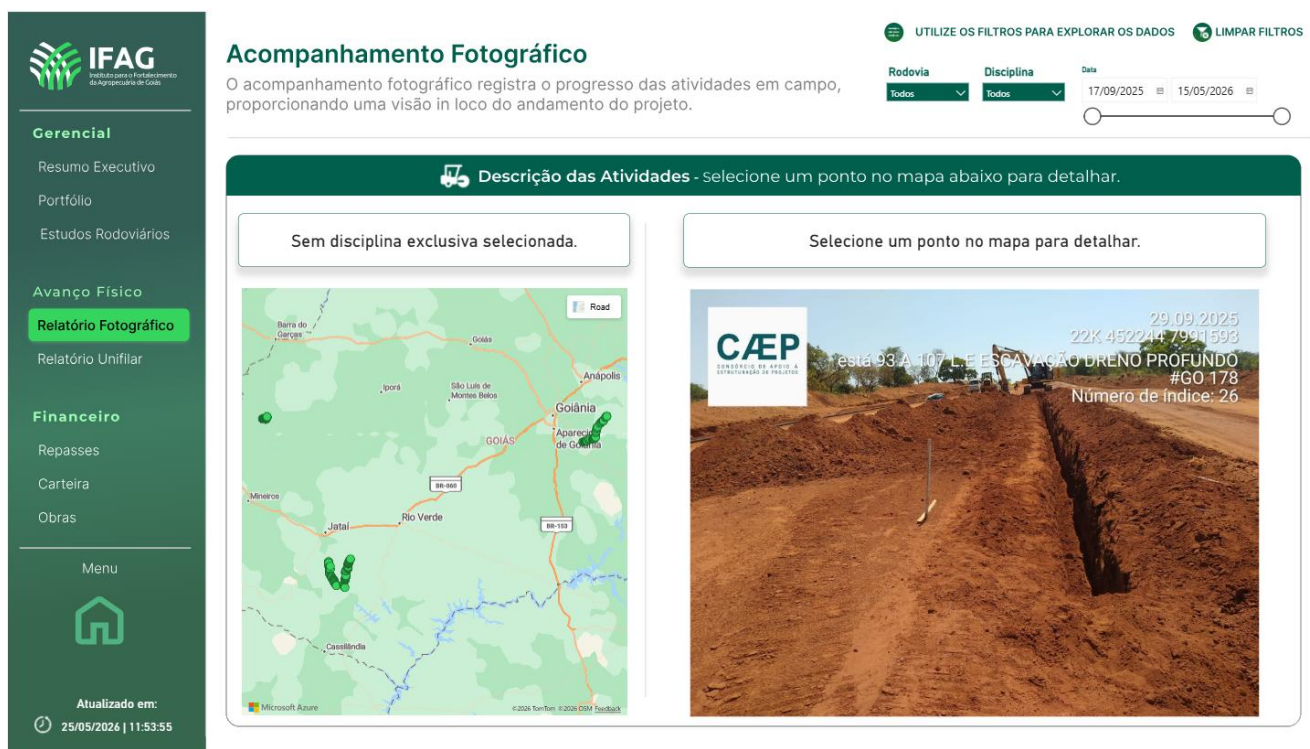


Figura 13 – Imagem ilustrativa da página Acompanhamento Fotográfico.

- **Portfólio:** No âmbito do Produto 4.1 — Gestão de Portfólio de Projetos (PMO) —, foram realizadas reuniões de PMO com o CAEP e com o IFAG para acompanhamento, revisão e consolidação das informações relacionadas às etapas e fases dos projetos que compõem o portfólio de empreendimentos monitorados. As atualizações realizadas permitiram refletir o status atual de cada iniciativa, em conformidade com as práticas e nomenclaturas adotadas na gestão de projetos, proporcionando uma visão consolidada do andamento do portfólio. No período em questão, houve as seguintes atualizações:

- Evolução do tópico de Projeto Executivo Viário Secundário das GO-461 e GO-147, de “A iniciar” para “Em curso”.

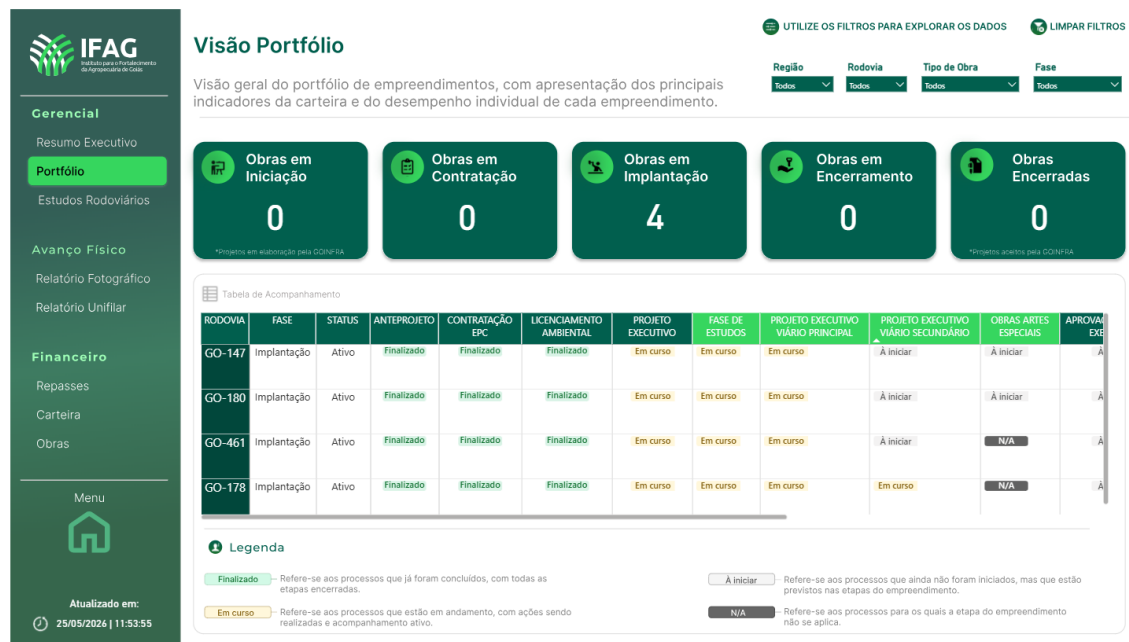


Figura 14 – Imagem ilustrativa da página Portfólio.

2.4.2 Produtos desenvolvidos no período

CAEP Controle de Produtos									
CAEP CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS									
ID	Produto	Empresa Responsável	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data de Início	Data da entrega	Status Entrega
1	1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	NA	Relatório Técnico	Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3	Geral	01/05/2026	31/05/2026	Entregue
2	1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	NA	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	Geral	01/05/2026	31/05/2026	Entregue
3	1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	NA	Relatório Mensal	[TIC] Sala de Situação - Manual Descritivo do Portal de Acompanhamento	Geral	01/05/2026	31/05/2026	Entregue

ENCERRAMENTO


O **Relatório Mensal Nº 11**, referente à consolidação e à apresentação das atividades desenvolvidas durante o mês de referente ao período **01 de Maio/2026 até 31 de Maio/2026**, em conformidade ao Contrato Nº 01/2025-IFAG.

Goiânia, 09 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente
 **ALEX DE VASCONCELOS PINELI ALVES**
Data: 18/06/2026 14:29:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alex de V. Pineli Alves

CAEP – Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos
Produto P1.1 e P1.2 – Relatório mensal – Grupo 1



Minicius Daher

CAEP – Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos
Produto P1.3 e P1.4 – Relatório mensal – Grupo 1

ANEXOS**LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS**

REF.	DESCRIÇÃO
Anexo I	P1.1 - Controle de Entrega de Produtos de maio.xlsx
Anexo II	P1.1 - Dashboard da Análise de Entrega de Produtos - maio.pdf
Anexo III	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de maio.xlsx
Anexo IV	P1.1 - Timeline de Acompanhamento Macro até maio 2026.pdf
Anexo V	P1.2 - Controle de Reuniões do mês de maio.xlsx
Anexo VI	1.3. Anexos.zip
Anexo VII	1.4. Anexos.zip
